

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019

14.07.2023, 09:30

630007, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 18,  
министерство здравоохранения  
Новосибирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», разделом 8 Соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019 (далее — Соглашение) и статьей 7 Приложения № 6 к Соглашению Публичным партнером был проведен контроль за исполнением Соглашения во 2 квартале 2023 года

Публичный партнер<sup>1</sup> — министерство здравоохранения Новосибирской области, ИНН 5406635579.

Частный партнер — ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986.

Проверка проводилась в следующем составе:

– В.В. Моор — начальник отдела материально-технического обеспечения и развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области;

– А.И. Коваленко — консультант министерства здравоохранения Новосибирской области;

– К.В. Помогайбо — главный эксперт министерства здравоохранения Новосибирской области;

– А.И. Кнауб — главный эксперт отдела по работе с проблемными объектами министерства строительства Новосибирской области.

Статус проверки: документарная, выездная, плановая.

Проверка была проведена с 17.07.2023 по 14.07.2023 по месту нахождения Публичного партнера и по месту нахождения Элементов объекта соглашения:

---

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту термины и определения с заглавной буквы приведены в значении, определенном в Соглашении, если не установлено иное.

- Элемента объекта соглашения № 1 (г. Новосибирск, ул. Ереванская, кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:671);
- Элемента объекта соглашения № 2 (г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, кадастровый номер земельного участка 54:35:072255:50);
- Элемента объекта соглашения № 3 (г. Новосибирск, ул. Пролетарская, (259), кадастровый номер земельного участка 54:35:071935:602);
- Элемента объекта соглашения № 4 (г. Новосибирск, ул. Краснодарская, 6/5, кадастровый номер земельного участка 54:35:053645:214);
- Элемента объекта соглашения № 5 (г. Новосибирск, ул. Степная, 266, кадастровый номер земельного участка 54:35:062555:134);
- Элемента объекта соглашения № 6 (г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, 2/1, кадастровый номер земельного участка 54:35:051165:114);
- Элемента объекта соглашения № 7 (г. Новосибирск, пл. Райсовета, кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:207).

Период проведения контрольных мероприятий составил 12 дней.

Предметом проверки явилось: статус готовности Объекта соглашения, действие разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию Элементов объекта соглашения № 2, № 3, соблюдение графиков производства работ, контроль за исполнением иных условий по Соглашению.

За 2 квартал 2023 года была рассмотрена информация об исполнении обязательств Частного партнера по Соглашению (Соглашение, письма Частного партнера, письма Публичного партнера, результаты совместных межведомственных совещаний, пр.).

### 1. Статус исполнения Частным партнером условий Соглашения

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
1	<b>Разработка Проектной документации и получение Частным партнером положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации:</b>			
	В отношении Элемента объекта соглашения № 1	до 30.06.2021	15.04.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 2	до 30.06.2021	12.04.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 3	до 30.06.2021	16.04.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 4	до 01.09.2021	12.11.2021	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 5	до 01.09.2021	07.10.2021	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 6	до 30.06.2021	16.04.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 7	до 01.09.2021	11.11.2021	срок не соблюден
2	<b>Направление Проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы, на согласование Публичному партнеру:</b>			
	В отношении Элемента объекта соглашения № 1	до 07.07.2021	28.04.2021	срок соблюден

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
	В отношении Элемента объекта соглашения № 2	до 07.07.2021	28.04.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 3	до 07.07.2021	28.04.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 4	до 08.09.2021	18.11.2021	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 5	до 08.09.2021	07.10.2021	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 6	до 07.07.2021	28.04.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 7	до 08.09.2021	19.11.2021	срок не соблюден
3	<b>Рассмотрение и согласование Проектной документации Публичным партнером:</b>			
	В отношении всех Элементов объекта соглашения	до 22.09.2021	21.04.2022	срок не соблюден по причине несвоевременного представления Проектной документации в отношении всех семи Элементов объекта соглашения
4	<b>Получение Частным партнером разрешений на строительство:</b>			
	В отношении Элемента объекта соглашения № 1	до 30.07.2021	09.06.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 2	до 30.07.2021	09.06.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 3	до 30.07.2021	09.06.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 4	до 01.10.2021	01.12.2021	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 5	до 01.10.2021	22.11.2021	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 6	до 30.07.2021	16.07.2021	срок соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 7	до 01.10.2021	02.12.2021	срок не соблюден
5	<b>Получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении Элементов объекта соглашения:</b>			
	В отношении Элемента объекта соглашения № 1	до 31.12.2023	не наступил	—
	В отношении Элемента объекта соглашения № 2	до 30.06.2023	не исполнен	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 3	до 30.06.2023	не исполнен	срок не соблюден
	В отношении Элемента объекта соглашения № 4	до 31.03.2024	не наступил	—
	В отношении Элемента объекта соглашения № 5	до 30.06.2024	не наступил	—

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
	В отношении Элемента объекта соглашения № 6	до 30.06.2024	не наступил	–
	В отношении Элемента объекта соглашения № 7	до 30.06.2024	не наступил	–
6	Дата приемки объекта	до 29.08.2024	не наступил	–

Проектная документация разработана Частным партнером в полном объеме, достаточном для строительства всех Элементов объекта соглашения (исх. № 154/СМК/2021 от 28.04.2021, исх. № 394/СМК/2021 от 07.10.2021, исх. № 425/СМК/2021 от 18.11.2021, исх. № 427/СМК/2021 от 19.11.2021).

По всем Элементом объекта соглашения в отношении каждой Проектной документации Частным партнером получено соответствующее положительное заключение Государственной экспертизы (№ 54-1-1-3-034703-2021 от 30.06.2021, № 54-1-1-3-034749-2021 от 30.06.2021, № 54-1-1-3-045794-2021 от 13.08.2021, № 54-1-1-3-066801-2021 от 12.11.2021, № 54-1-1-3-057808-2021 от 07.10.2021, № 54-1-1-3-037067-2021 от 07.07.2021, № 54-1-1-3-066285-2021 от 11.11.2021).

По состоянию на 30.06.2023 Частным партнером получены разрешения на строительство в отношении всех Элементов объекта соглашения (№ 54-Ru54303000-98-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-96-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-97-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-242-2021 от 01.12.2021, № 54-Ru54303000-230-2021 от 22.11.2021, № 54-Ru54303000-141-2021 от 16.07.2021, № 54-Ru54303000-244-2021 от 02.12.2021).

Срок действия разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 2 (Городская клиническая поликлиника № 2) в связи с истечением 09.06.2023 был продлен Частным партнером 19.05.2023.

Срок действия разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 3 (Городская клиническая поликлиника № 7) в связи с истечением 25.01.2023 был продлен Частным партнером 20.01.2023.

Сроки, согласно Приложению 3 (График реализации инвестиционного этапа) к Соглашению, Частным партнером не соблюдены:

– в отношении Элементов объекта соглашения №№ 4, 5, 7 — в части разработки Проектной документации и получения Частным партнером положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации;

– в отношении Элементов объекта соглашения № 4, 5, 7 — в части получения Частным партнером разрешений на строительство;

– в отношении Элементов объекта соглашения № 2, 3 — в части получения Частным партнером разрешений на ввод в эксплуатацию.

В отношении невыполнения Частным партнером сроков Проектирования и получения разрешений на строительство Публичным партнером 08.08.2022 министерством здравоохранения Новосибирской области в Арбитражный суд Новосибирской области был подан иск о взыскании неустойки. Указанное исковое заявление было принято к производству Арбитражного суда Новосибирской области (дело № А45-21788/2022). 02.06.2023 по результатам рассмотрения дела № А45-21788/2022 Арбитражным судом Новосибирской области принято решение об удовлетворении иска Публичного партнера и взыскании с Частного партнера

неустойки (в просрочке обязательств в отношении Элементов объекта соглашения № 4, 5, 7). Не согласившись с размером начисленной судом неустойки, Публичный партнер 03.07.2023 направил апелляционную жалобу, рассмотрение которой ведется Седьмым арбитражным апелляционным судом.

В отчетном квартале в связи с недостижением согласия между сторонами об определении ключевых этапов строительства и установления ответственности Частного партнера за их несоблюдение Публичным партнером 30.04.2023 подан иск в Арбитражный суд Новосибирской области. Указанное исковое заявление было принято к производству Арбитражного суда Новосибирской области (дело № А45-10227/2023), ведется рассмотрение при участии прокуратуры Новосибирской области.

В связи с нарушением Частным партнером обязательств, предусмотренных пунктом 5 Приложения 3 (График реализации инвестиционного этапа) к Соглашению, в части получения разрешений на ввод в эксплуатацию в отношении Элементов объекта соглашения №№ 2, 3 Публичным партнером 05.07.2023 вынесено Предписание Частному партнеру.<sup>2</sup>

Создание Объекта соглашения осуществляется в соответствии с технико-экономическими показателями Элементов объекта соглашения, определенными Заданиями на проектирование и Проектными документацией (получившими положительные заключения Государственной экспертизы), утвержденных и разработанных в целях реализации Соглашения.

## **2. Реализация иных мероприятий по Соглашению**

В ходе контрольных мероприятий был проведен анализ статуса исполнения Частным партнером обязательств по Строительству Объекта соглашения.

В отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, 3 по согласованию с ФБУ «РосСтройКонтроль» 25.04.2023 были актуализированы графики производства работ (графики строительства).

В соответствии с утвержденными графиками производства работ (графиками строительства) по состоянию на июнь 2023 года строительная готовность<sup>3</sup> должна составлять в отношении:

- Элемента объекта соглашения № 1 — 85,1%;
- Элемента объекта соглашения № 2 — 100,0%;
- Элемента объекта соглашения № 3 — 100,0%;
- Элемента объекта соглашения № 4 — 57,0%;
- Элемента объекта соглашения № 5 — 49,9%;
- Элемента объекта соглашения № 6 — 49,9%;
- Элемента объекта соглашения № 7 — 49,9%.

Согласно сведениям Частного партнера (исх. № 477/СМК/2023 от 28.06.2023), по состоянию на 28.06.2023 для Строительства Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 задействован 651 рабочий и специалист, 33 единицы строительной техники и механизмов. По сравнению с 1 кварталом 2023

<sup>2</sup> Письмом министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.07.2023 № 01-09/16109/24.

<sup>3</sup> В отношении Элементов объекта соглашения №№ 1 – 3 актуализированные Графики строительства утверждены ФБУ «РосСтройКонтроль» и согласованы письмом Публичного партнера от 02.05.2023 № 01-09/10020/24. В отношении Элементов объекта соглашения №№ 4 – 7 согласованы письмом Публичного партнера от 22.08.2022 № 01-09/19126/24.

года задействовано на 129 рабочих и специалистов меньше, строительной техники и механизмов — на 22 единицы больше.

Степень строительной готовности Элементов объекта соглашения оценивается следующим образом:

- в отношении Элемента объекта соглашения № 1 — 69,2%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 2 — 73,2%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 3 — 81,3%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 4 — 28,6%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 5 — 15,2%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 6 — 12,7%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 7 — 2,6%;

Таким образом, имеет место быть отставание от плановой строительной готовности в отношении Элемента объекта соглашения № 1 — 15,9%, Элемента объекта соглашения № 2 — 26,8%, Элемента объекта соглашения № 3 — 18,7%, Элемента объекта соглашения № 4 — 28,4%, Элемента объекта соглашения № 5 — 34,7%, Элемента объекта соглашения № 6 — 37,2%, Элемента объекта соглашения № 7 — 47,3%.

03.07.2023 представителями Публичного партнера был осуществлен выездной информационный осмотр Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, 3.

04.07.2023 представителями Публичного партнера был осуществлен выездной информационный осмотр Элементов объекта соглашения №№ 4, 5, 6, 7.

В ходе выездного осмотра зафиксировано осуществление Частным партнером и Лицами, относящимся к частному партнеру строительно-монтажных работ в отношении Элементов объекта соглашения №№ 2,3, а также сохраняется отставание от утвержденных графиков строительства по Элементам объекта соглашения. По пояснениям Частного партнера, отставание в отношении Элементов объекта соглашения №№ 2, 3, 7 связано с действием Особых обстоятельств, заявленных Частным партнером, а в отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 4, 5, 6 — недостаточностью рабочей силы и низкой производительностью труда субподрядчиков. Значительное сокращение отставания от утвержденных графиков строительства по Элементам объекта соглашения № 1, 2, 3 ожидается в до сентября 2023 года в связи с мобилизацией трудовых ресурсов, сменой субподрядчиков по отдельным видам работ.

В отчетном периоде сведений о фактах нецелевого использования Частным партнером Земельных участков не поступало. Визуальный осмотр Земельных участков фактов неправомерного использования Частным партнером Земельных участков не выявил. Договоры аренды земельных участков в отношении всех Земельных участков действительны. По сведениям департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, арендная плата за Земельные участки вносится своевременно, задолженность по арендной плате у Частного партнера отсутствует.

Выплаты Капитального гранта Публичным партнером в отчетном периоде не осуществлялись.

Расходование средств Капитального гранта осуществлялось Частным партнером в отчетном периоде следующим образом (в тыс. рублях):

Наименование Элемента объекта соглашения	Проектные работы	Строительно-монтажные работы	Дополнительное оборудование	Прочее	ВСЕГО
Элемент объекта соглашения № 1	0,00	211 703,32	0,00	3 873,74	215 577,07
Элемент объекта соглашения № 2	0,00	274 574,54	0,00	6 492,30	281 066,84
Элемент объекта соглашения № 3	639,48	272 076,38	0,00	9 531,52	282 247,38
Элемент объекта соглашения № 4	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10
Элемент объекта соглашения № 5	0,00	0,00	0,00	16,71	16,71
Элемент объекта соглашения № 6	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85
Элемент объекта соглашения № 7	0,00	0,00	0,00	10,31	10,31
<b>ВСЕГО</b>	<b>639,48</b>	<b>758 354,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19 947,53</b>	<b>778 941,26</b>

Согласно сведениям, предоставленным Частным партнером, по итогам 2 квартала 2023 года приняты к учету работы на общую сумму 556 388,17 тыс. рублей с НДС:

- по Элементу объекта соглашения № 1 на сумму 32 419,37 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 2 на сумму 125 743,61 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 3 на сумму 151 524,47 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 4 на сумму 64 538,14 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 5 на сумму 61 536,05 рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 6 на сумму 61 638,68 рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 7 на сумму 58 987,84 рублей с НДС.

Источником финансирования являются средства Капитального гранта, средства Старшего долга.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» объем средств, предусмотренный для реализации Соглашения, является достаточным для исполнения обязательств Публичного партнера по Соглашению в 2023 году.

Значения критериев эффективности проекта и показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа сохраняют свою неотрицательность.

Особые обстоятельства:

В отчетном периоде Частным партнером заявлены Особые обстоятельства по Соглашению:


Положение Соглашение	Суть Особого обстоятельства	Реквизиты сообщения, уведомления Частного партнера	Результат рассмотрения Публичным партнером
Подпункт (ы) пункта 38.2	Несвоевременное осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Элемента объекта соглашения № 2	Сообщение: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 319/СМК/2023 от 28.04.2023 Уведомление: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 388/СМК/2023 от 26.05.2023	Частному партнеру направлен мотивированный отказ в признании наступления Особого обстоятельства (письмо министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.06.2023 № 01-09/15563/24)

Положение Соглашение	Суть Особого обстоятельства	Реквизиты сообщения, уведомления Частного партнера	Результат рассмотрения Публичным партнером
Подпункт (ы) пункта 38.2	Несвоевременное осуществление технологического присоединения к централизованным сетям водоотведения (ливневой канализации) Элемента объекта соглашения № 3	Сообщение: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 474/СМК/2023 от 28.06.2023  Уведомление: еще не поступало	Ведется рассмотрение
Подпункт (е) пункта 38.2	Невозможность выноса тепловой сети с территории строительства Элемента объекта соглашения № 7	Сообщение: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 405/СМК/2023 от 07.06.2023  Уведомление: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 506/СМК/2023 от 06.07.2023	Ведется рассмотрение

### Заключение:

Частным партнером выполняются обязательства по исполнению Соглашения, в части строительно-монтажных работ в отношении всех Элементов объекта соглашения. Разрешения на строительство, полученные Частным партнером, действительны в отношении всех Элементов объекта соглашения. Имеются отставания от графика производства работ, которые требуется ликвидировать для своевременного ввода Элементов объекта соглашения № 1, 4, 5, 6, 7 в эксплуатацию, а в отношении Элементов объекта соглашения № 2, 3 Частному партнеру требуется обеспечить исполнение Предписания от Публичного партнера по вводу указанных объектов здравоохранения в эксплуатацию.

### От Публичного партнера:

  
\_\_\_\_\_/В.В. Моор/

  
\_\_\_\_\_/К.В. Помогайбо/

  
\_\_\_\_\_/А.И. Коваленко/

  
\_\_\_\_\_/А.И. Кнауб/

### От Частного партнера:


\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата ознакомления: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2023




Приложение к акту  
о результатах контроля






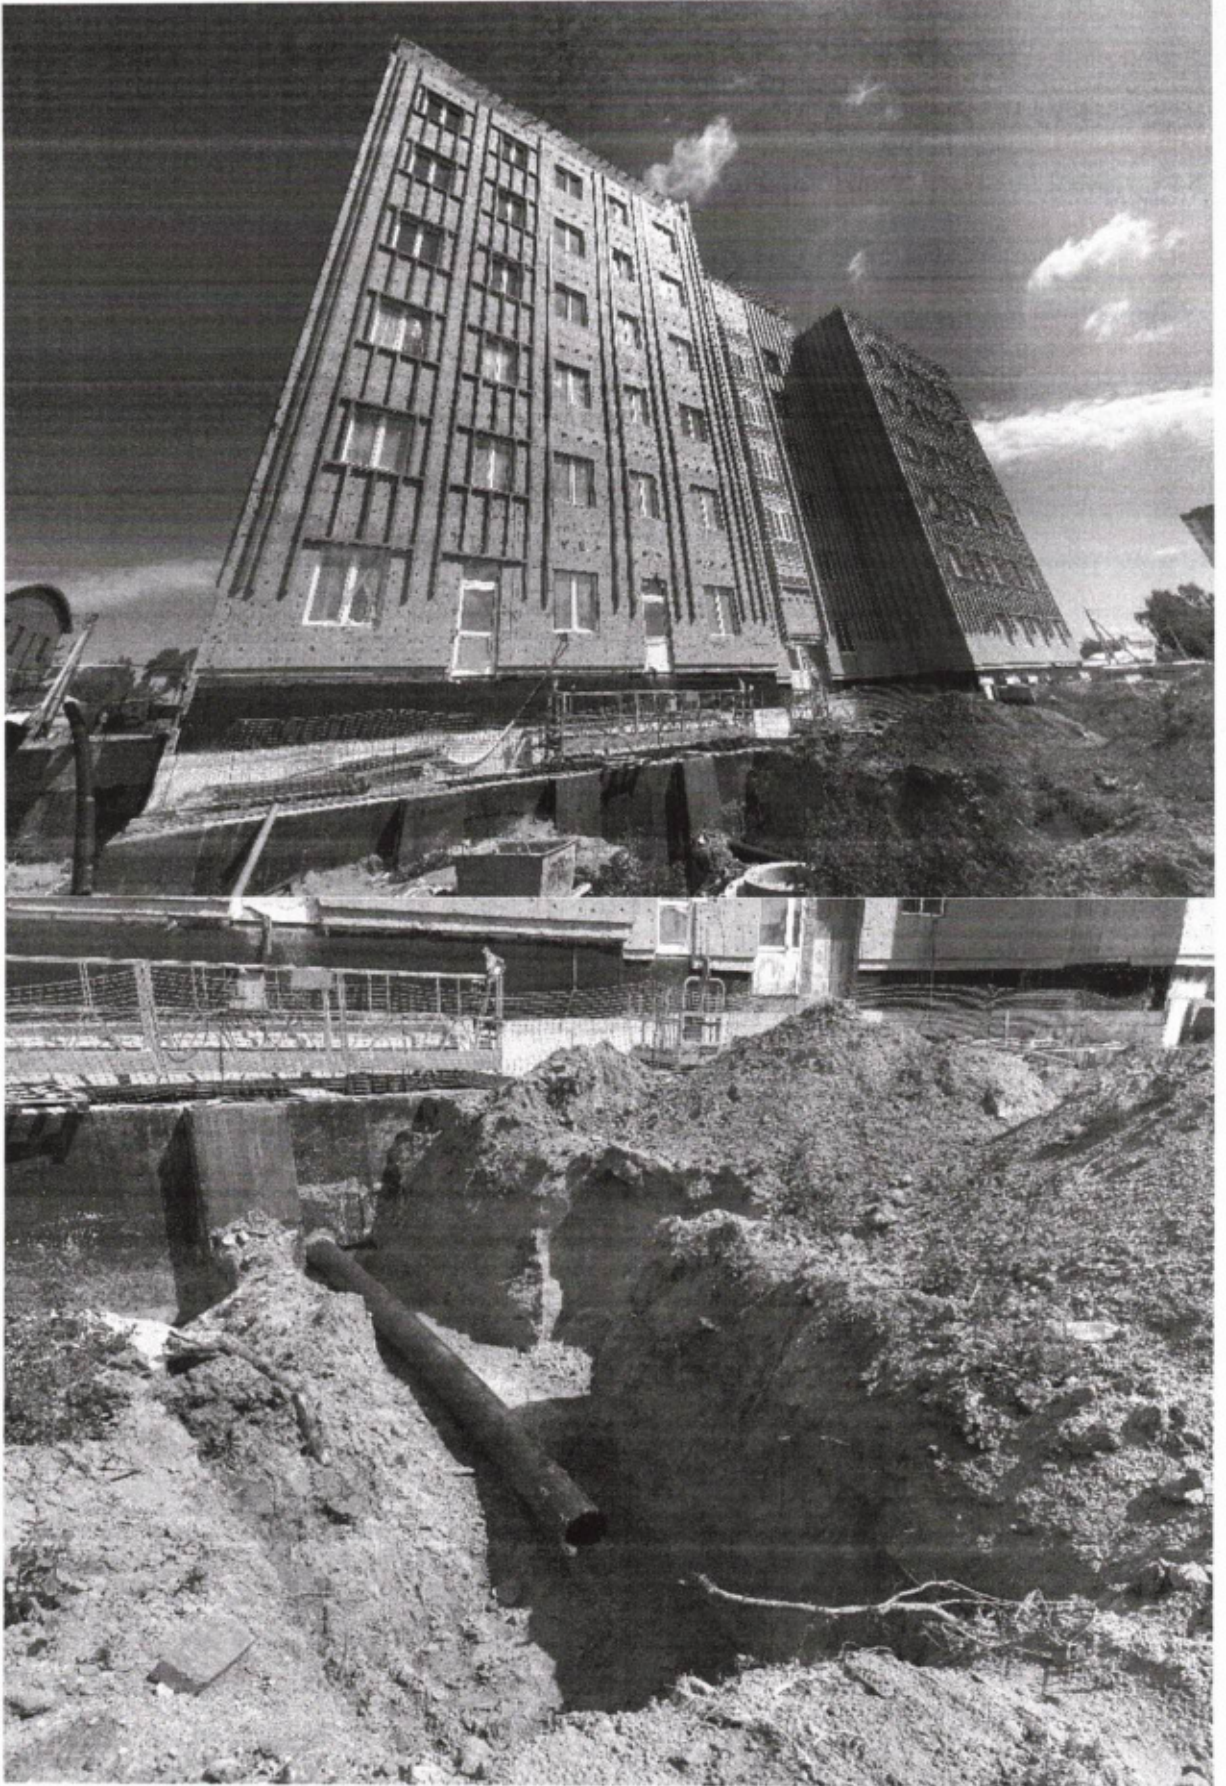







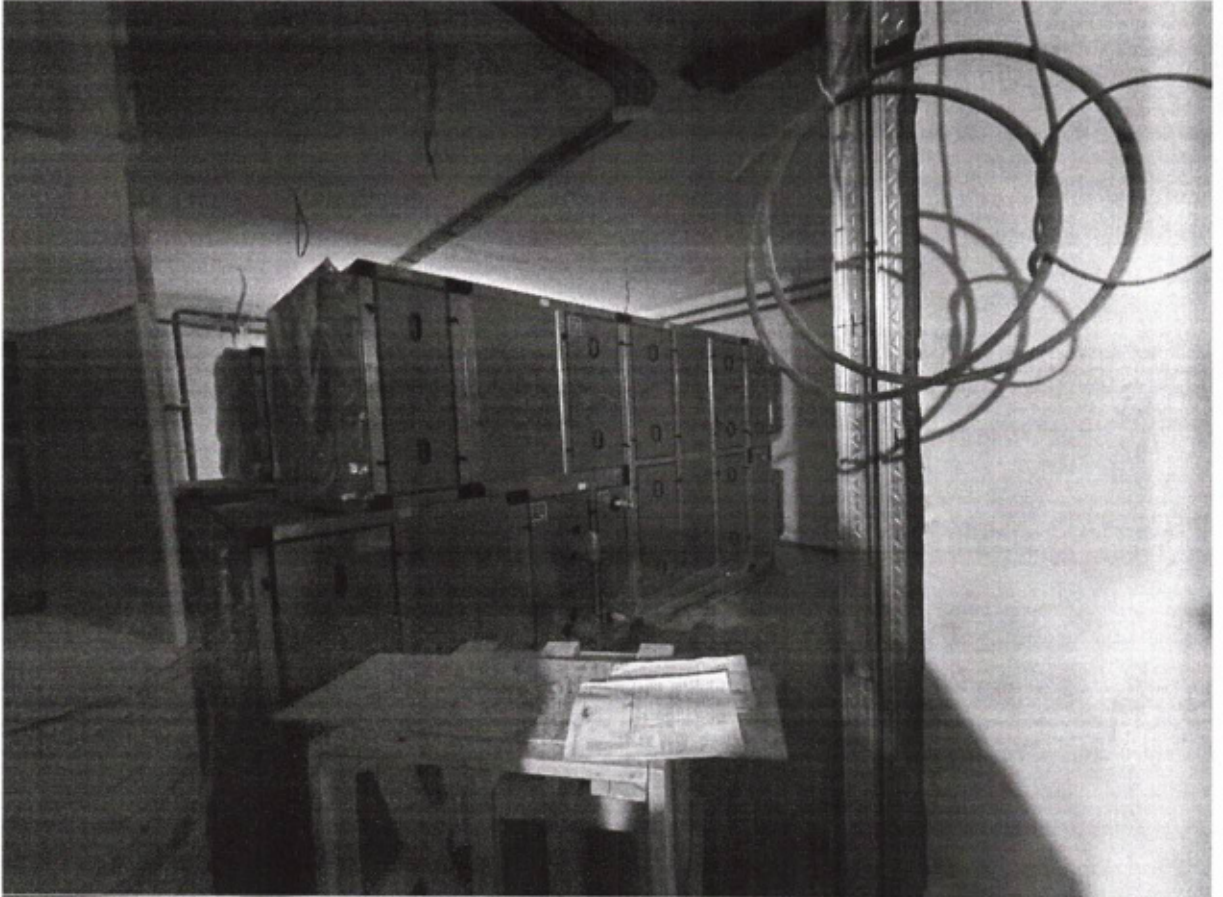


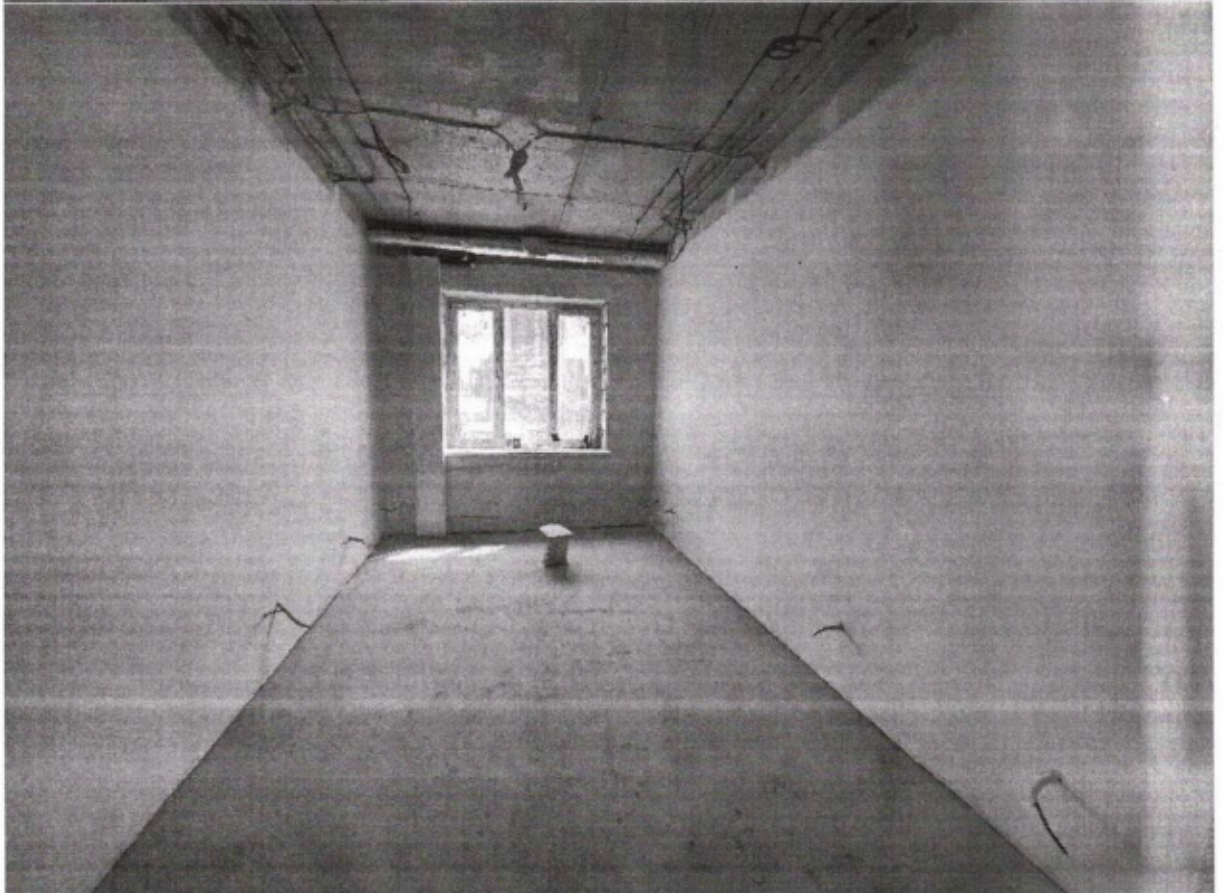
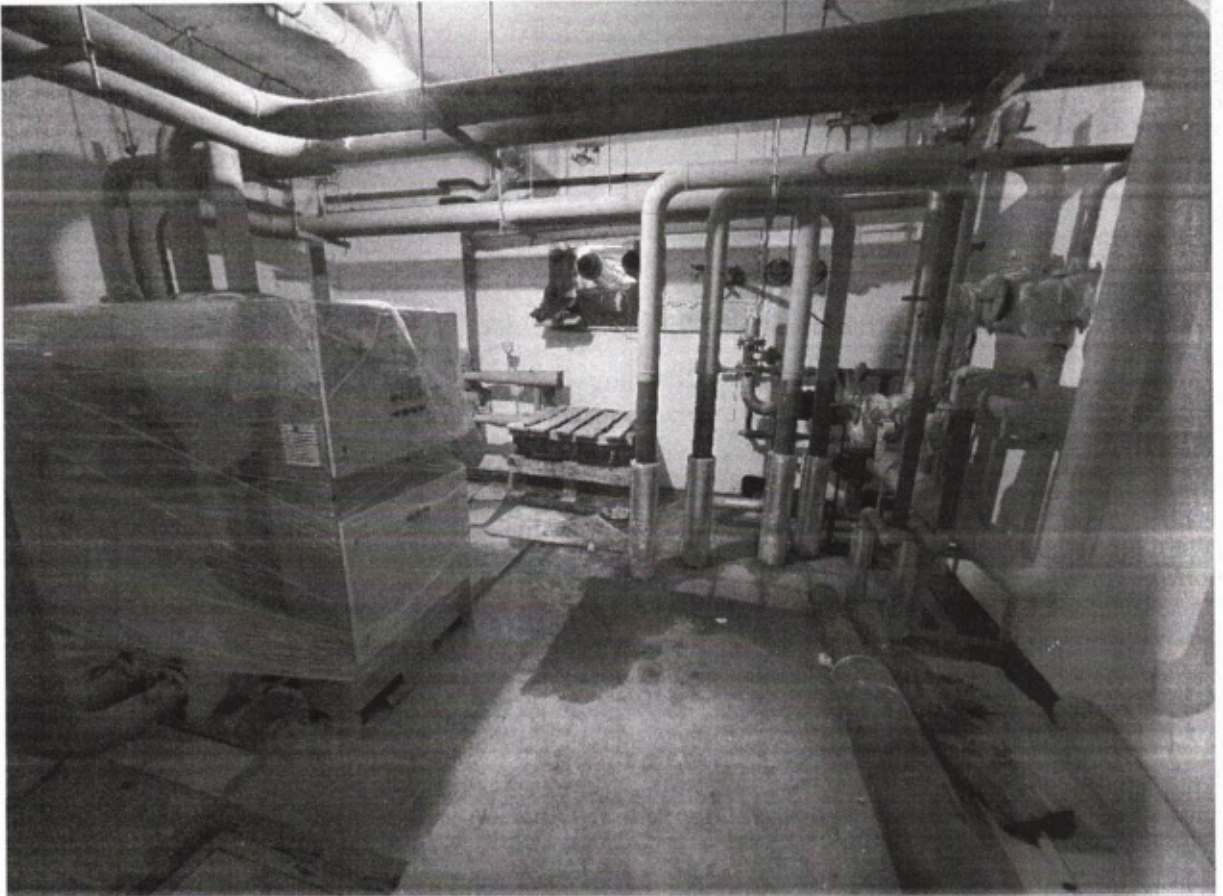


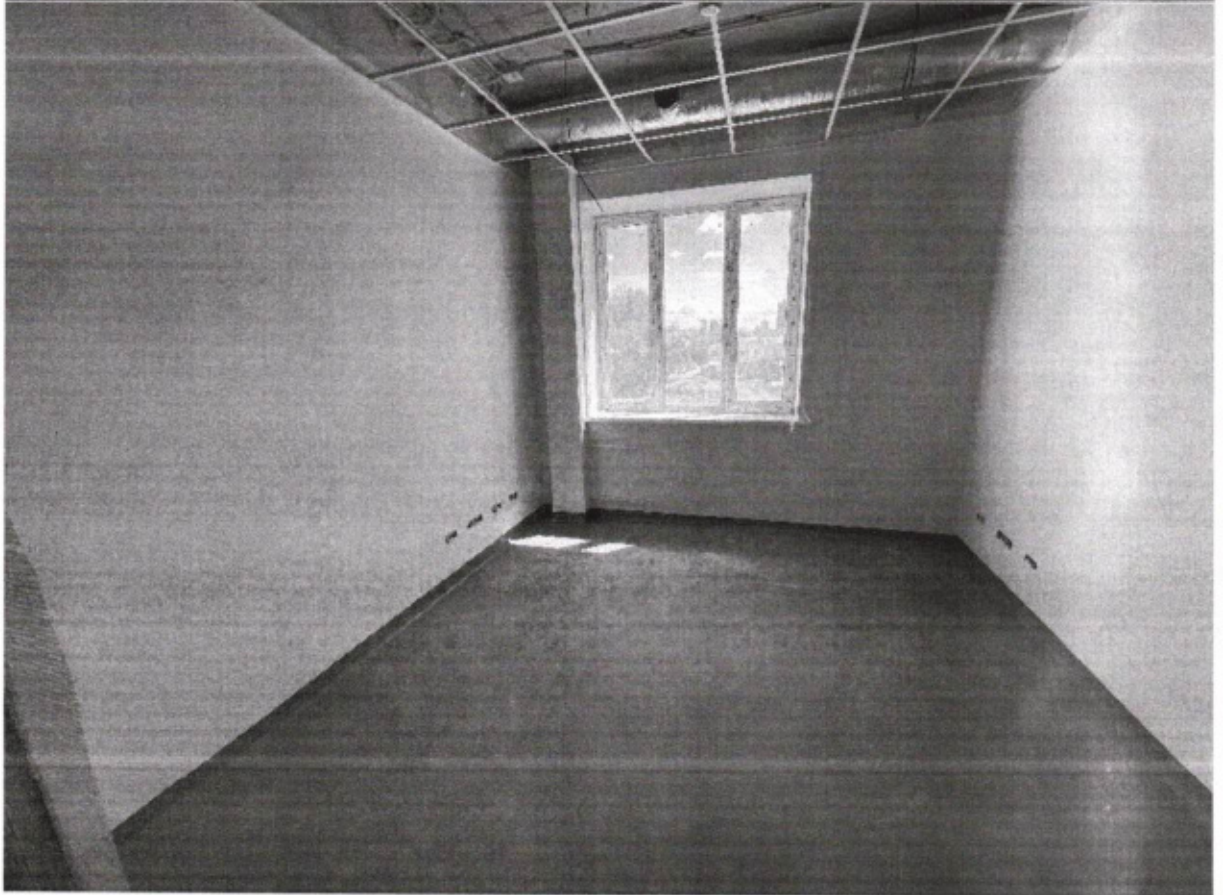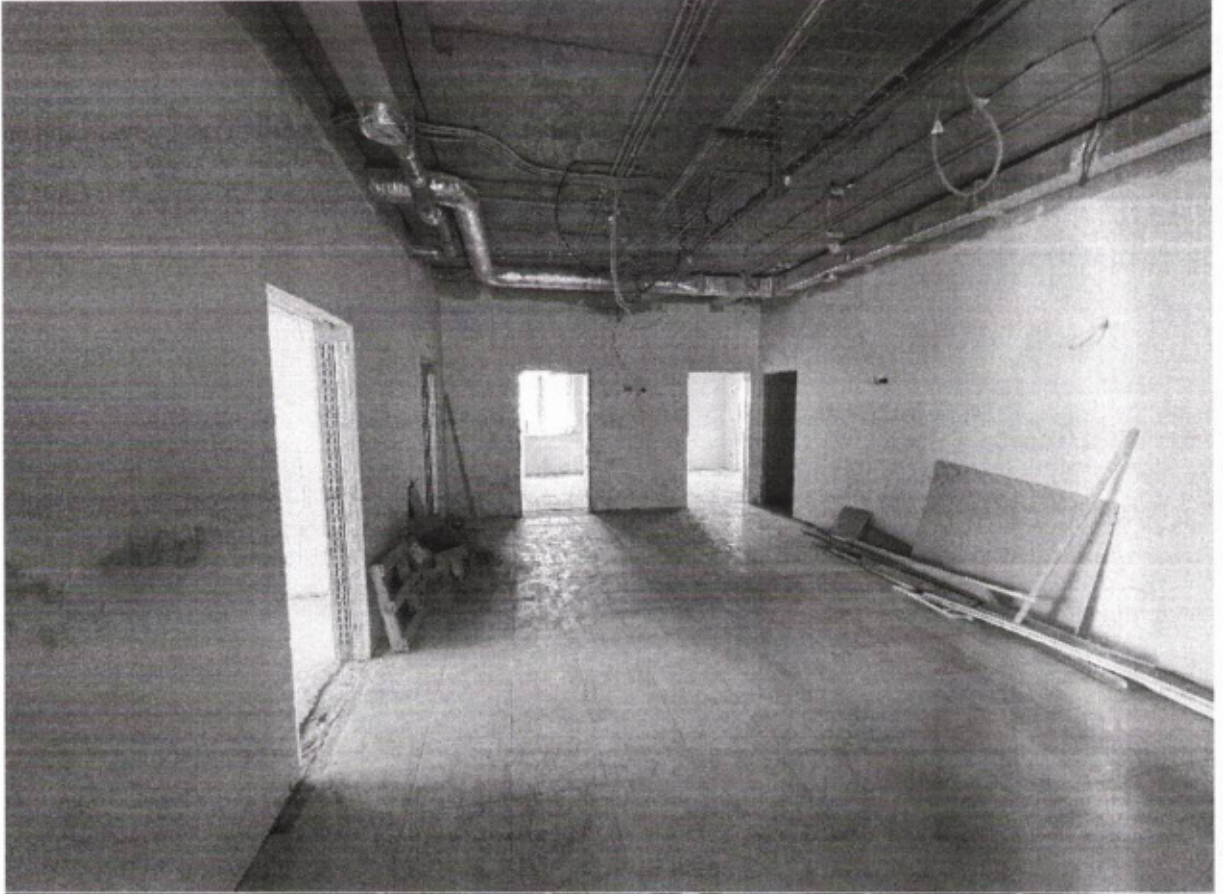







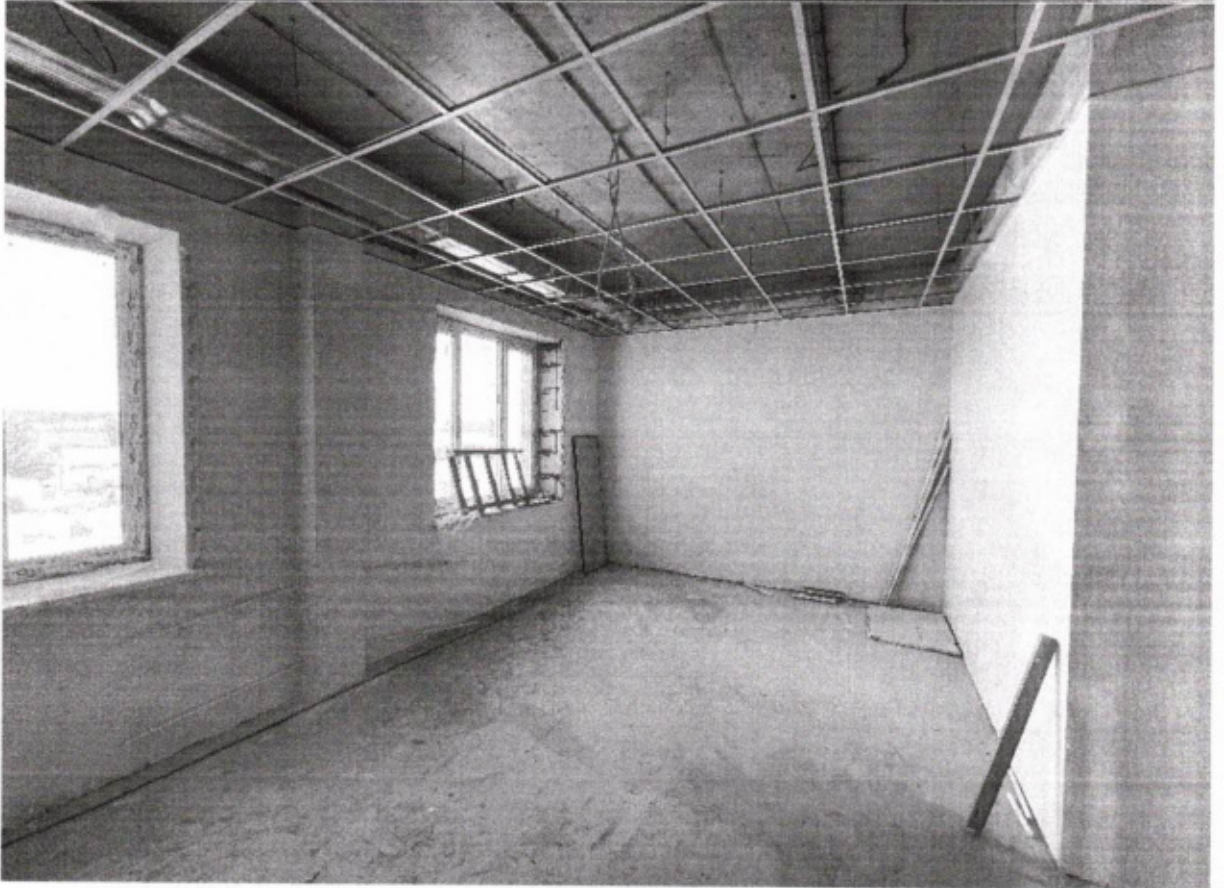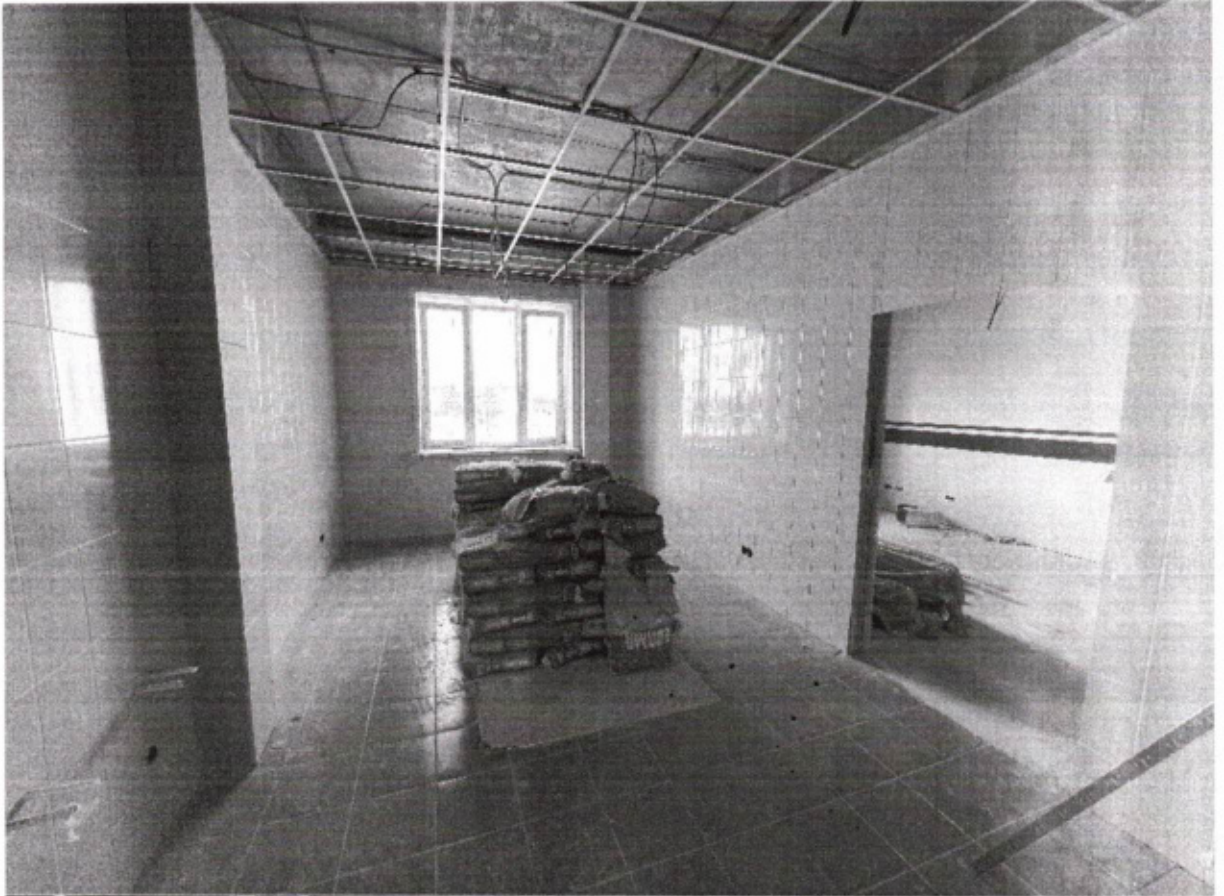

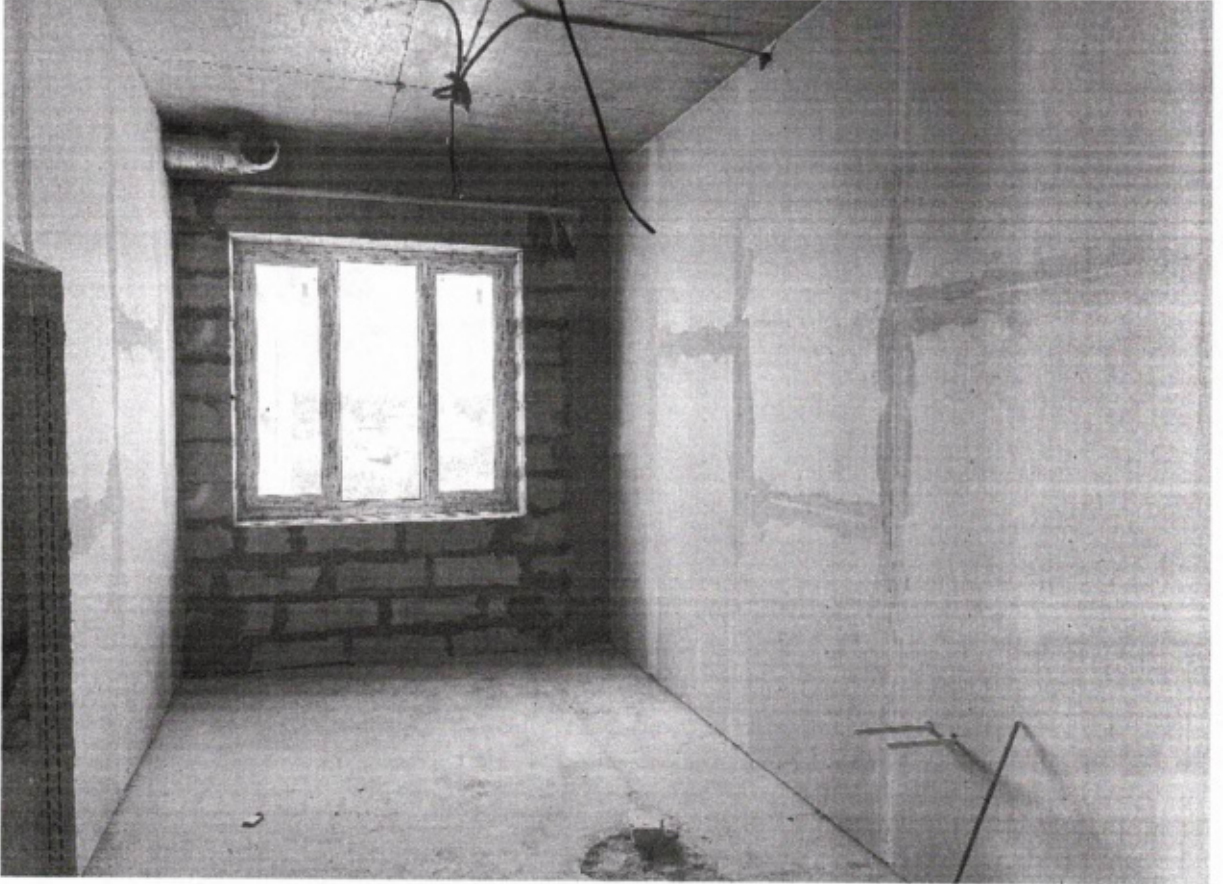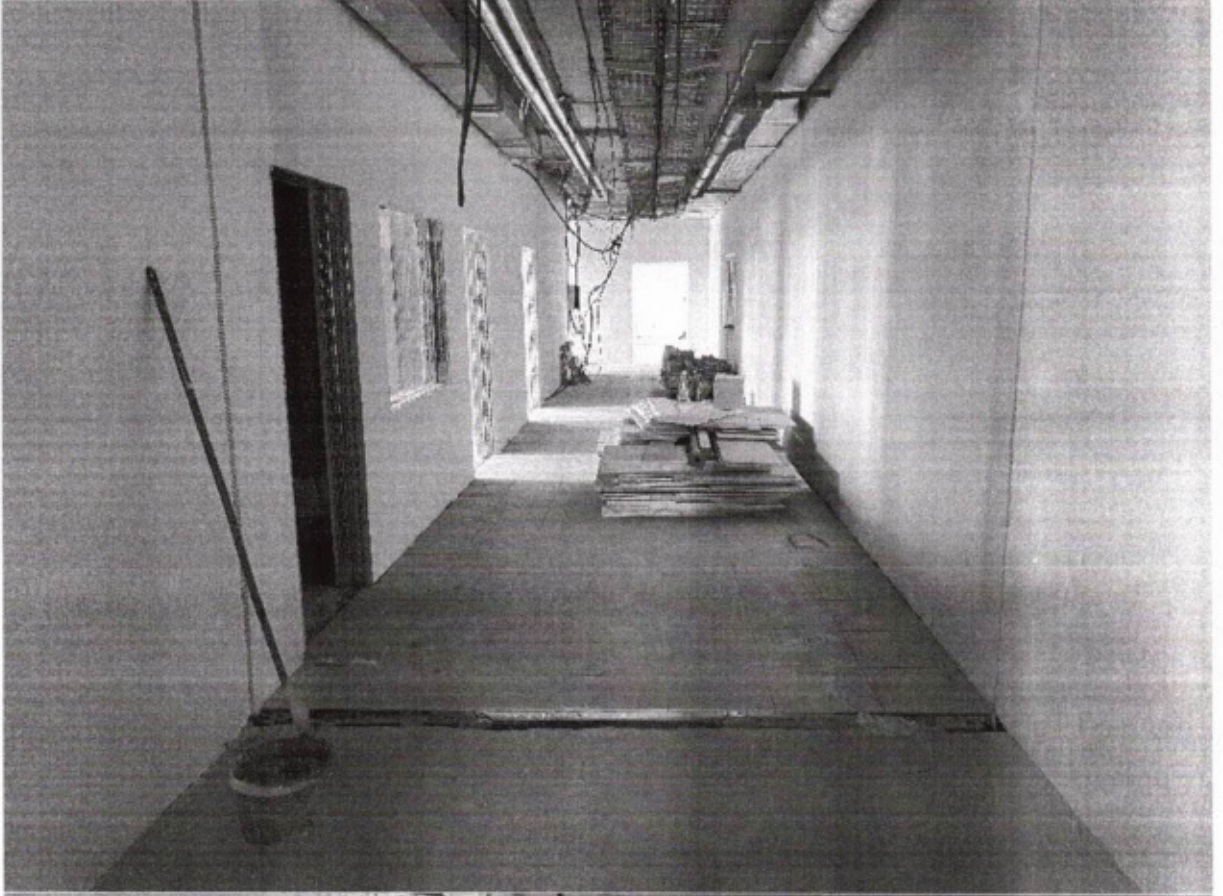


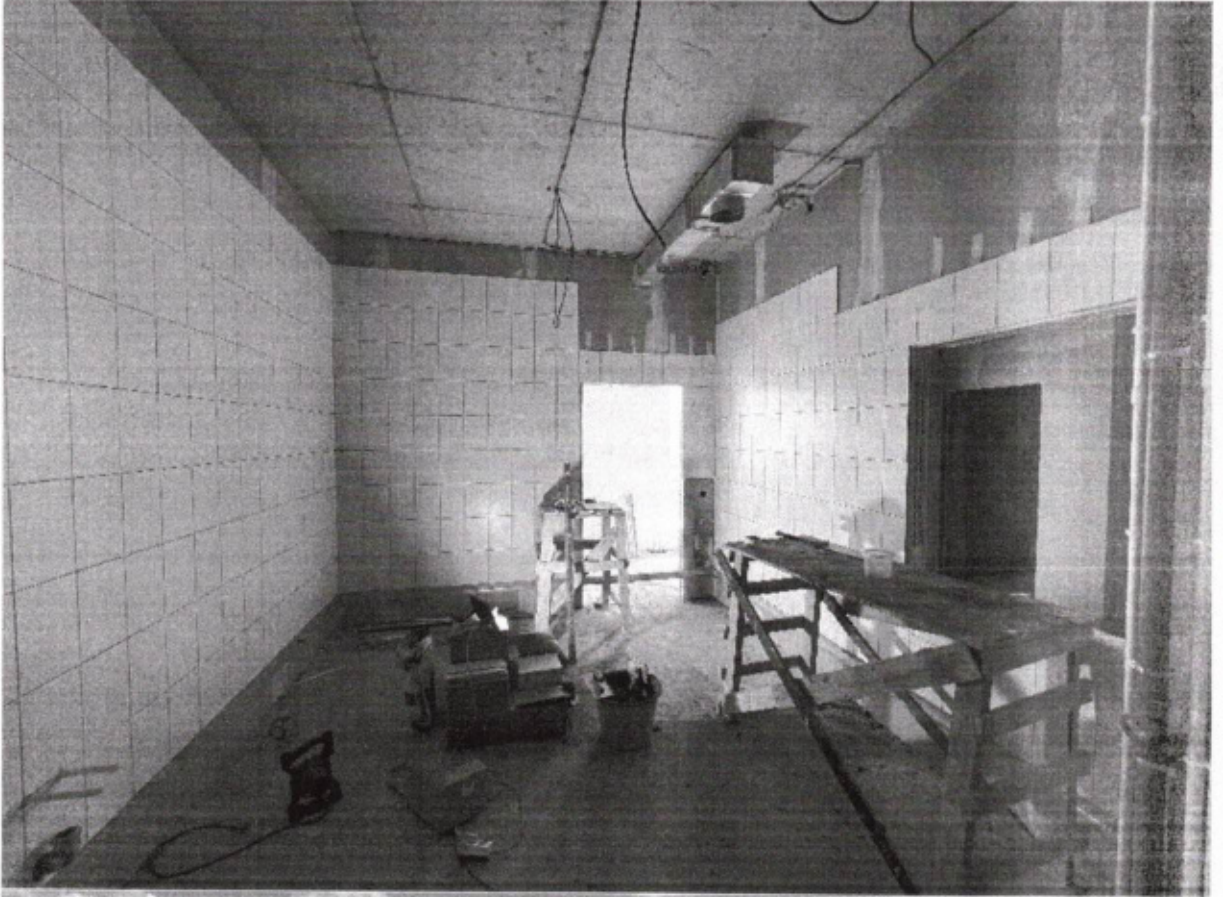


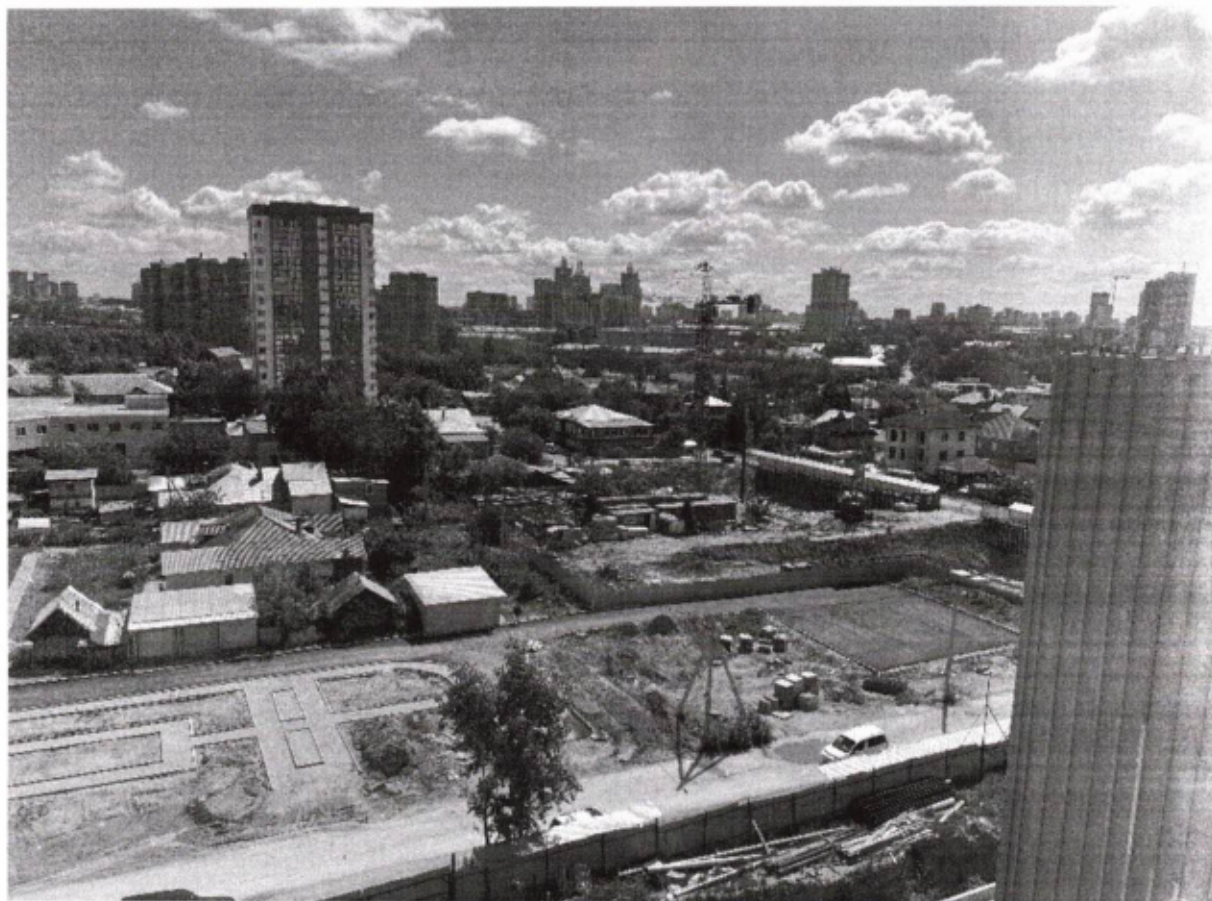


Элемент объекта соглашения № 1



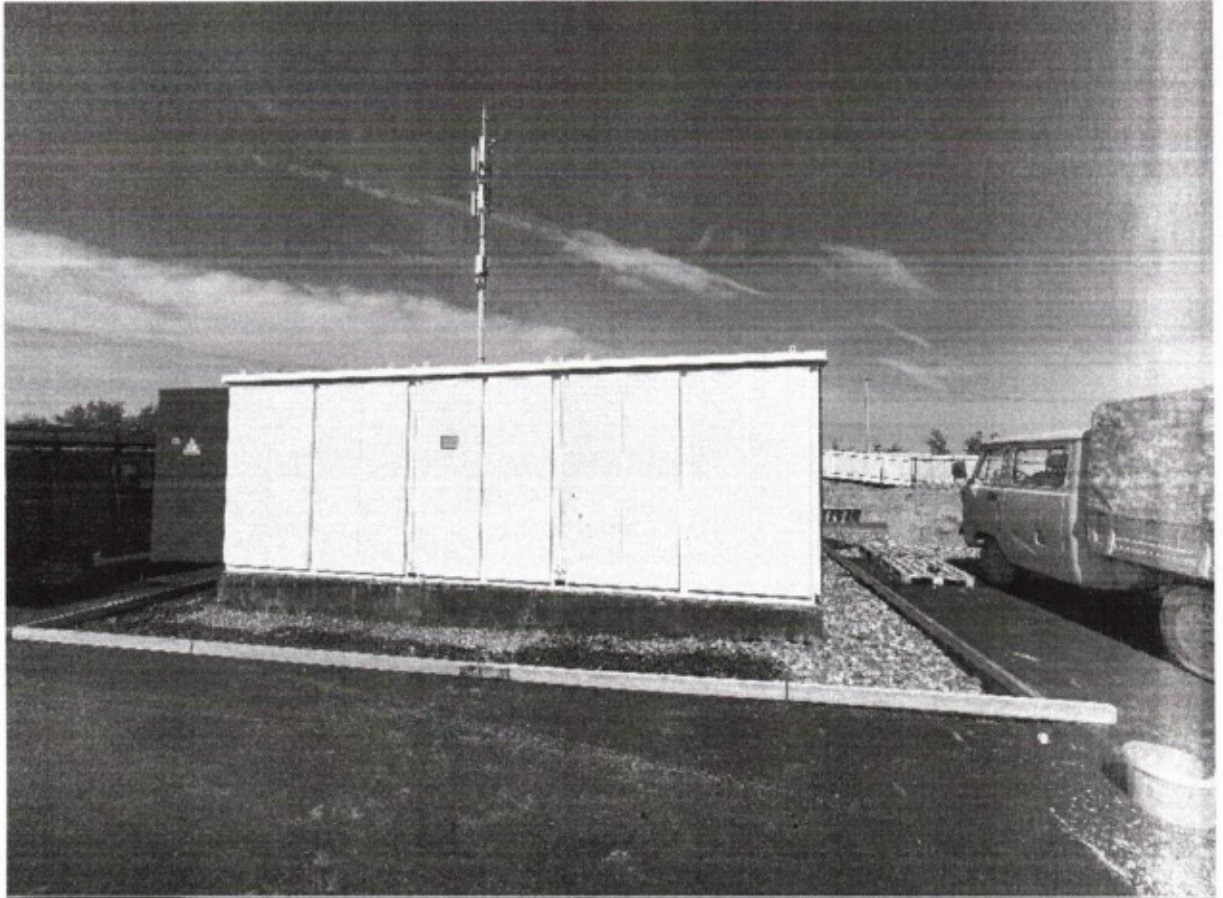


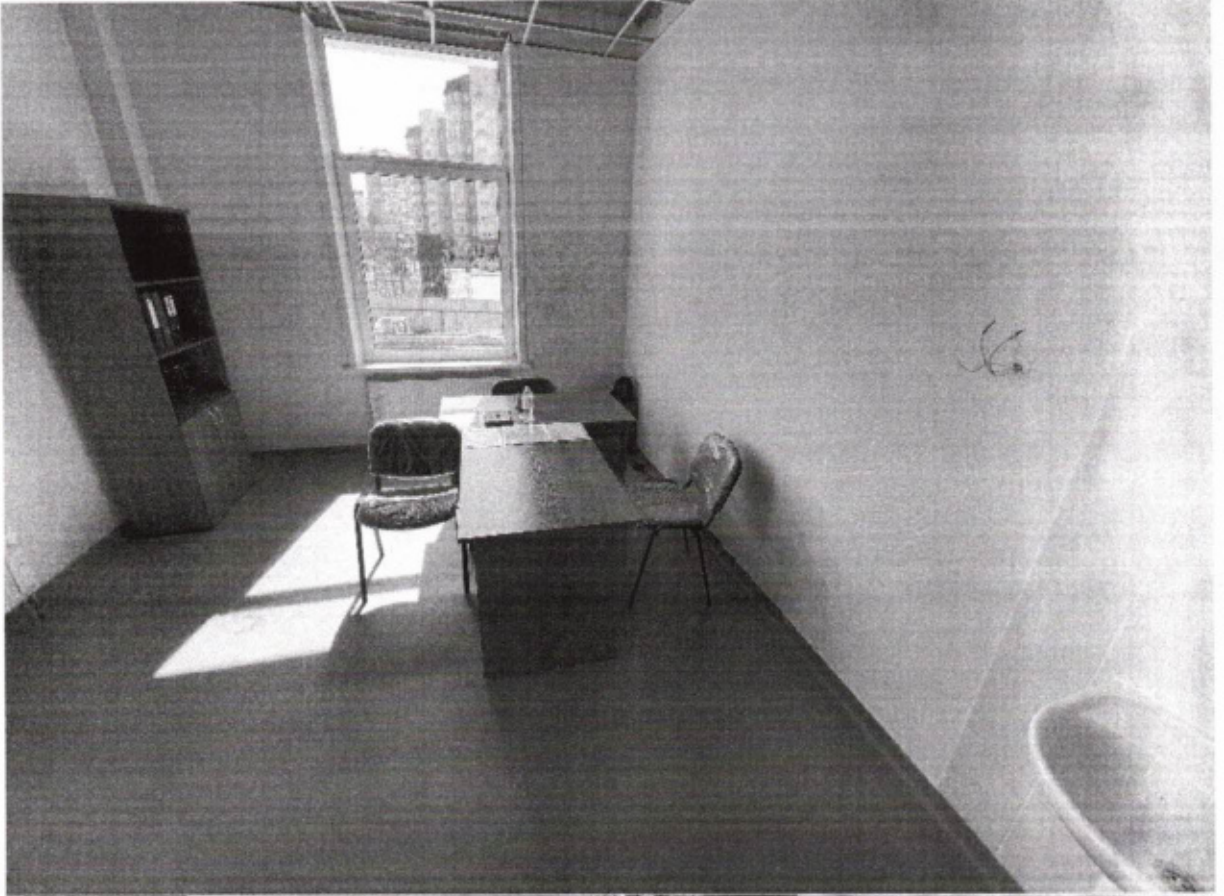


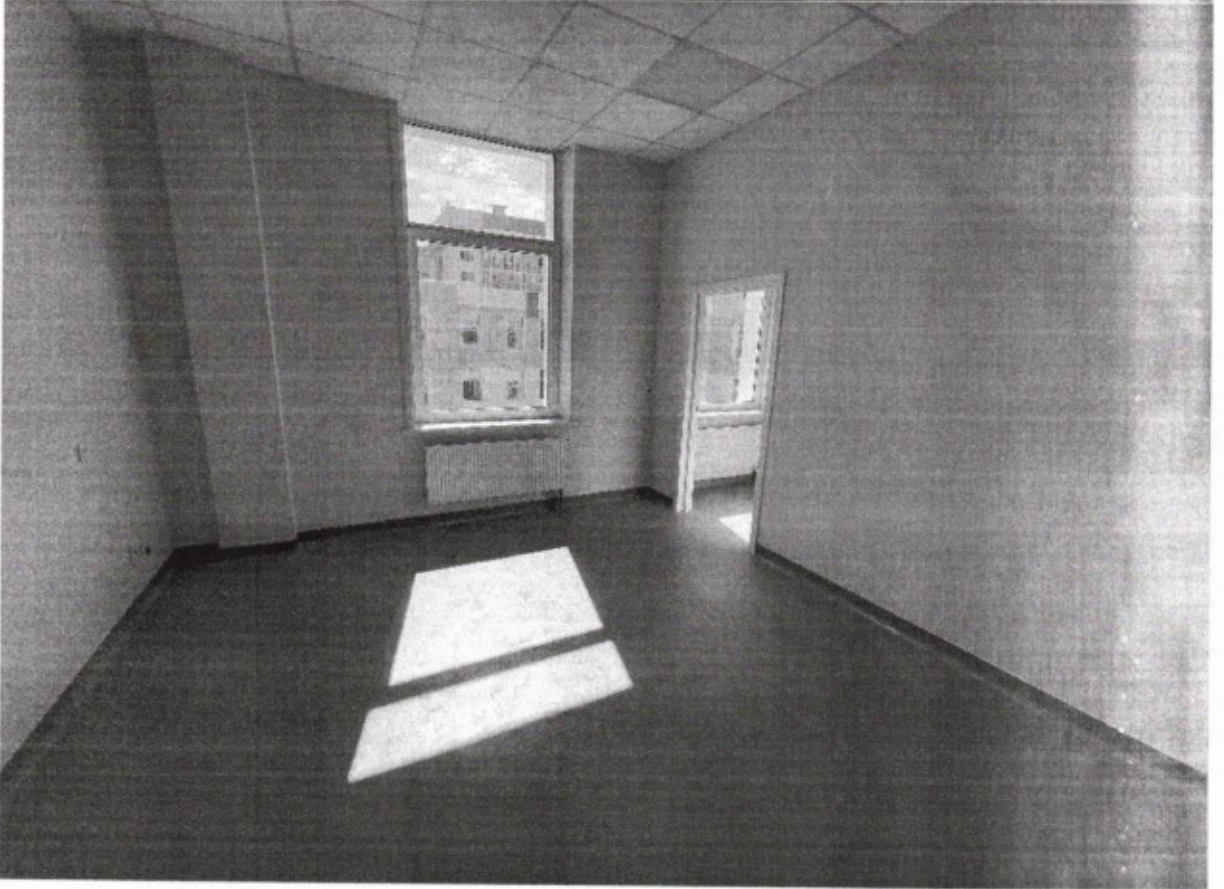







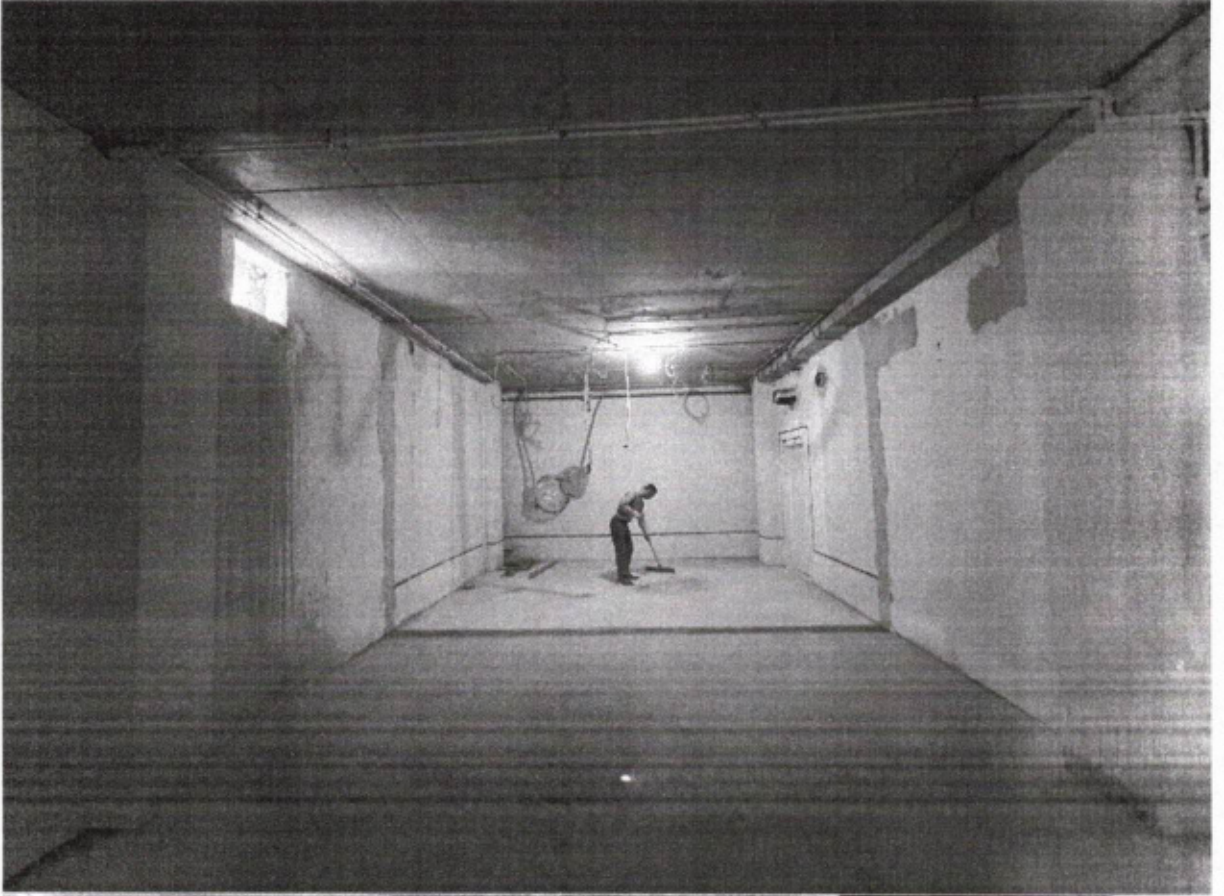

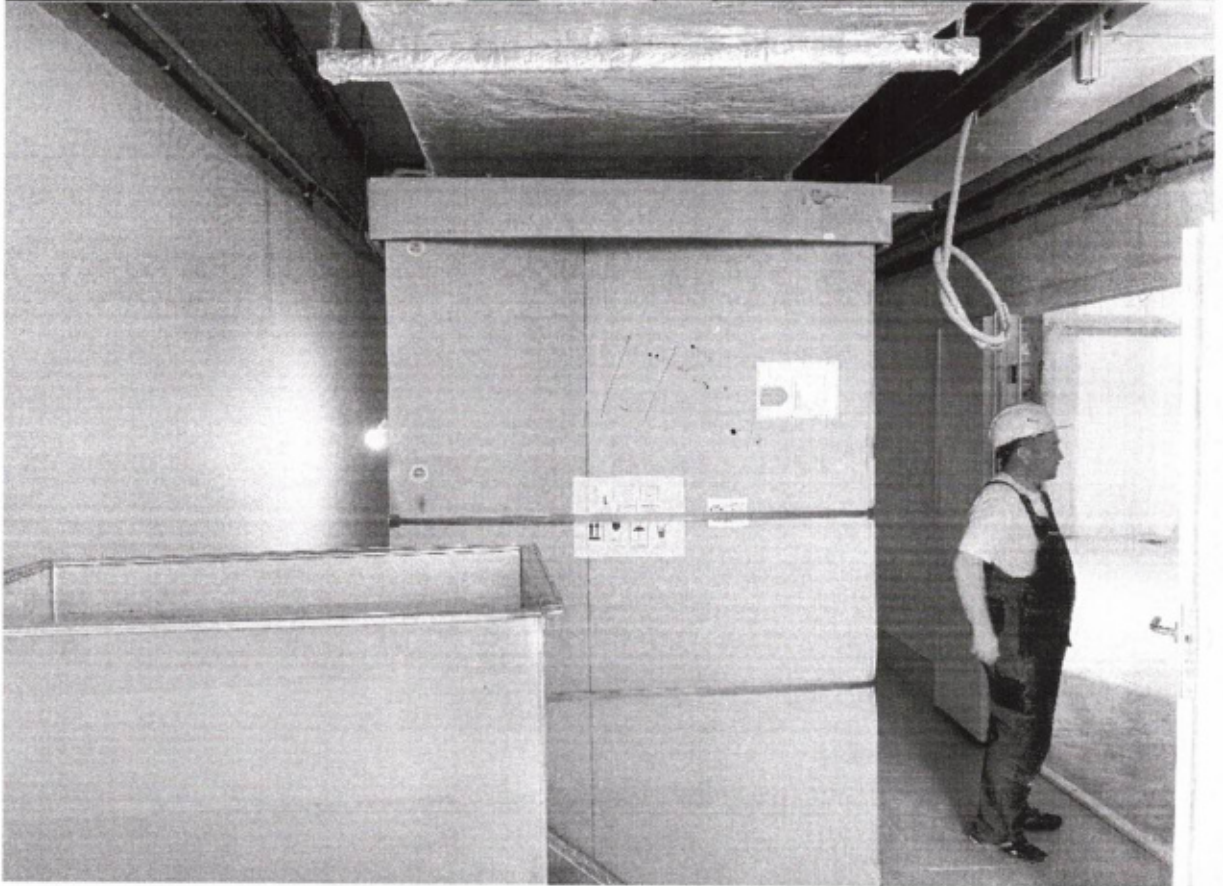



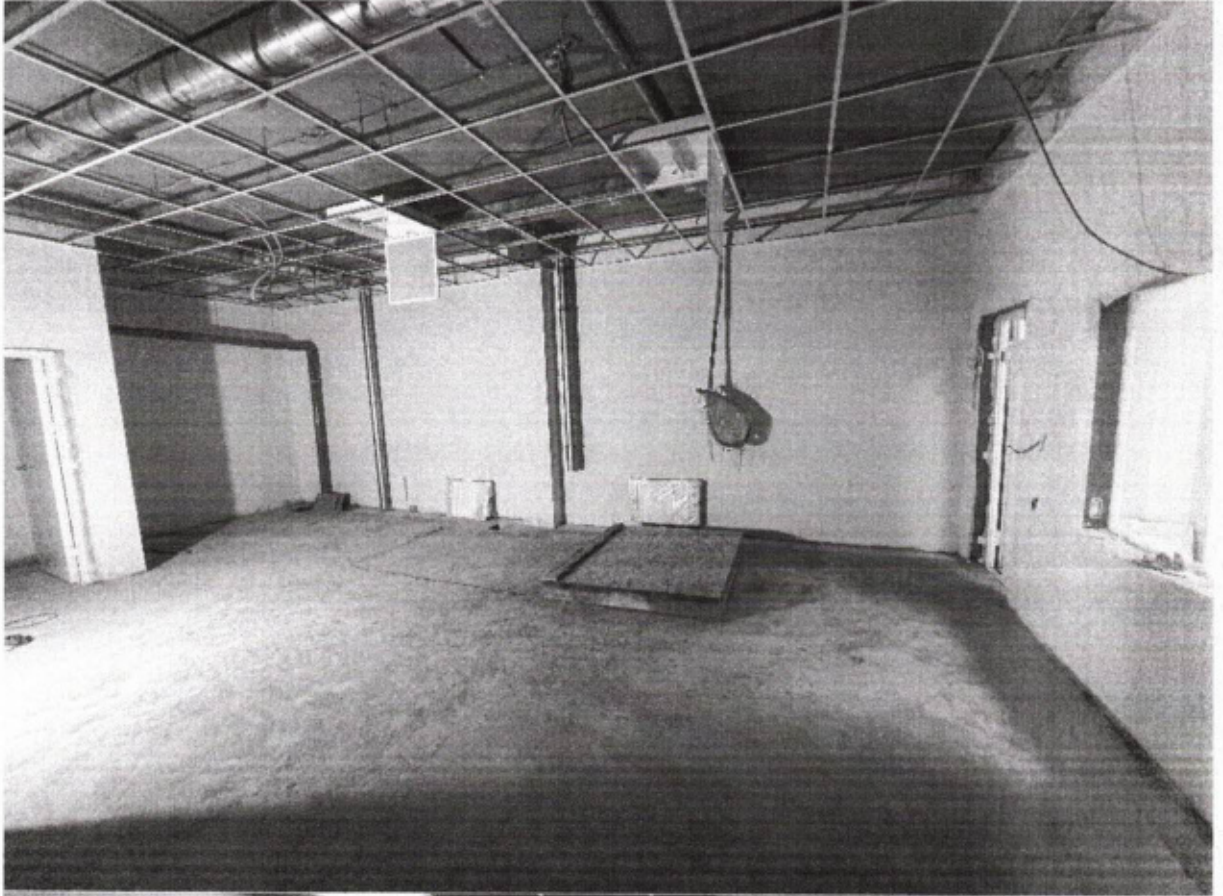


Элемент объекта соглашения № 2

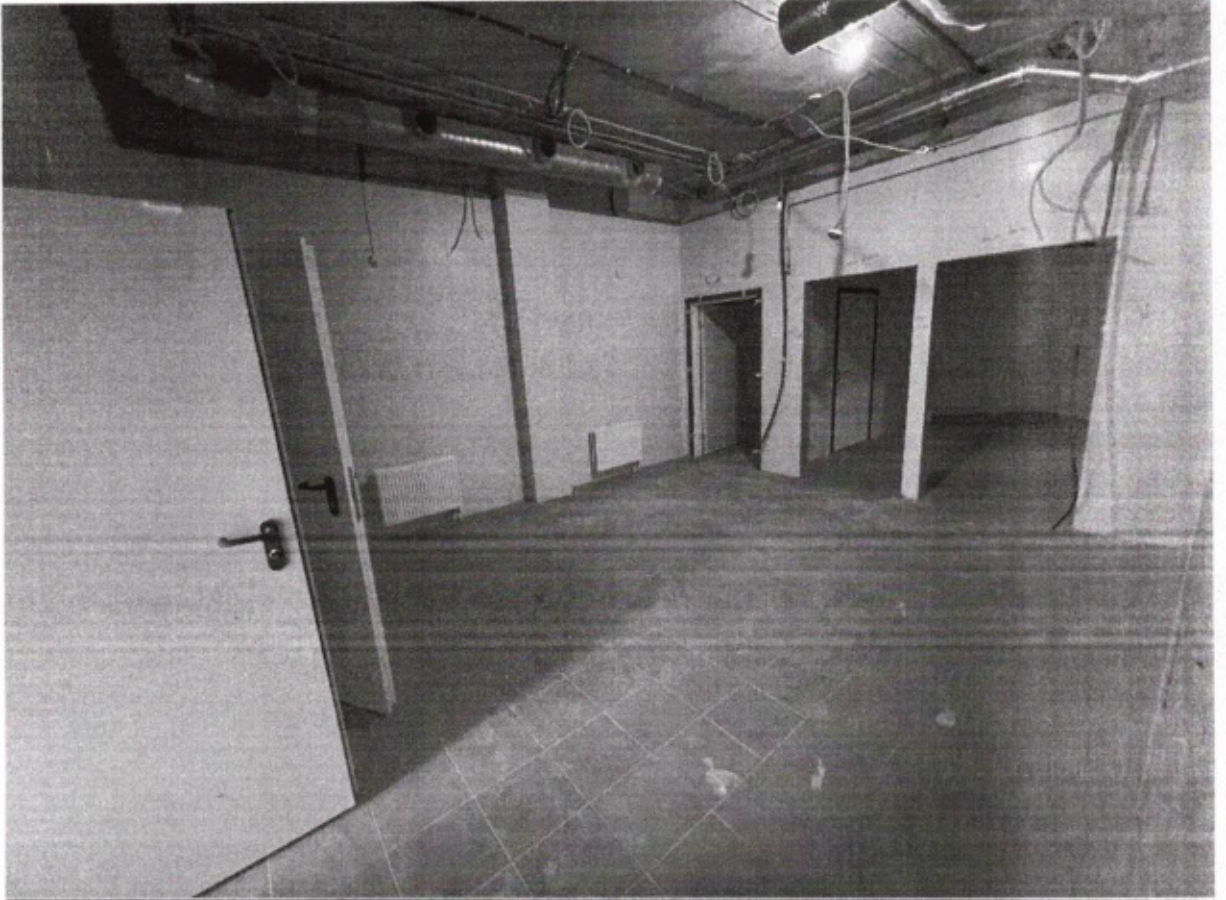




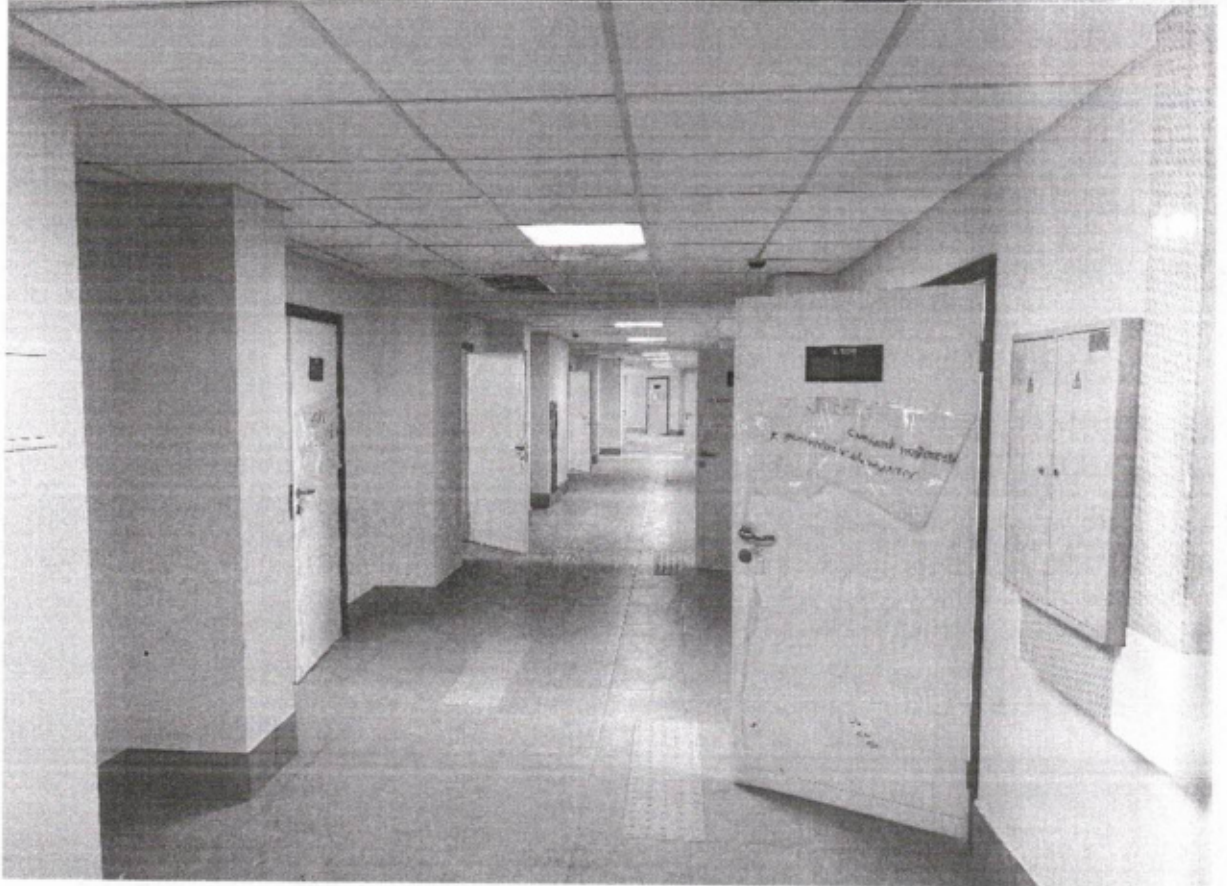

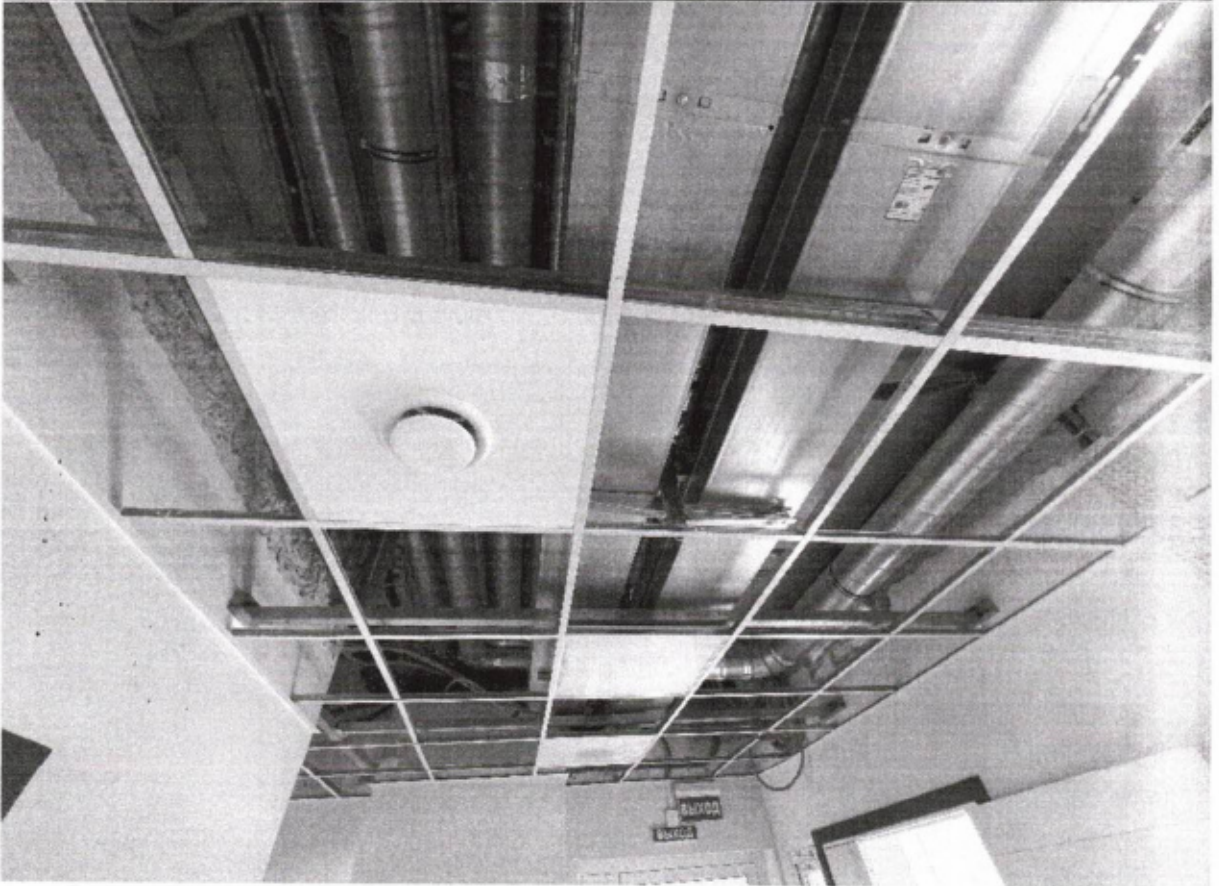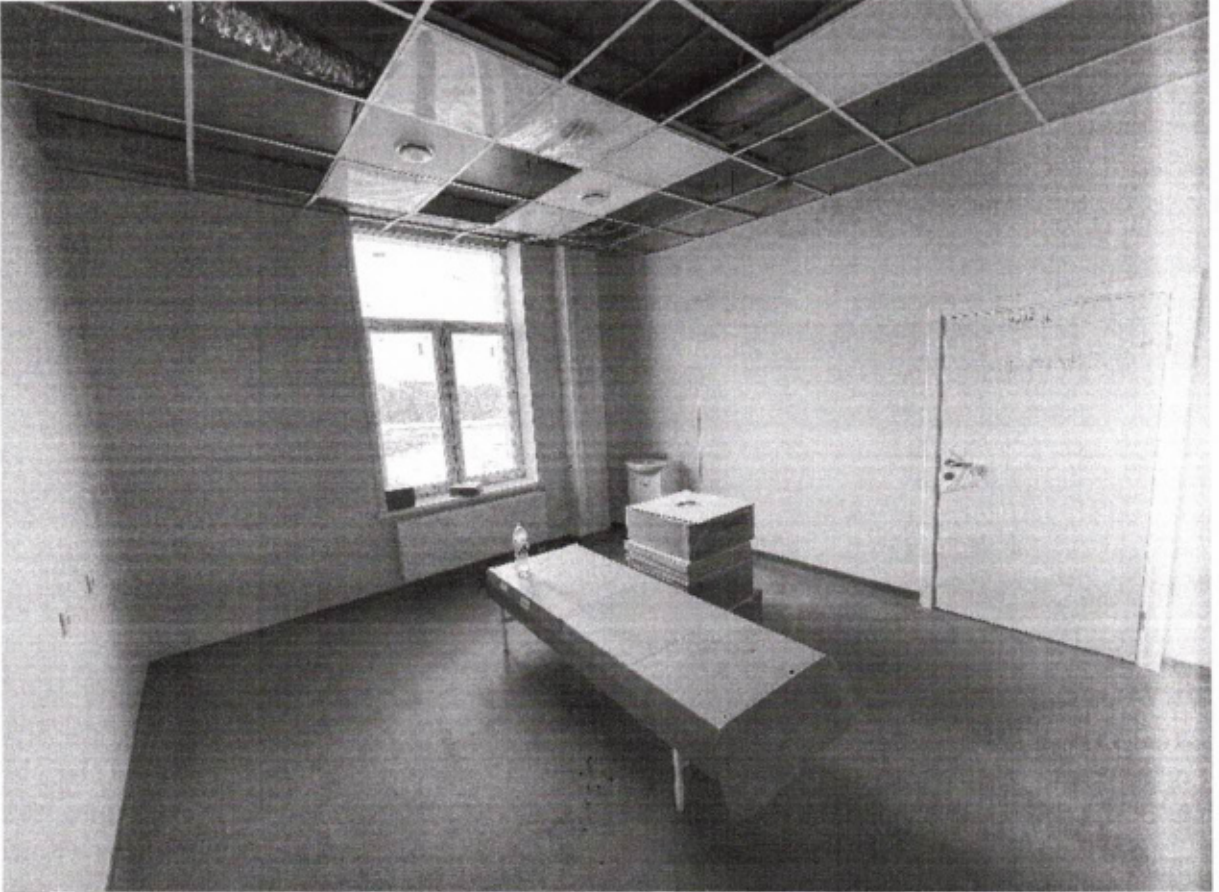



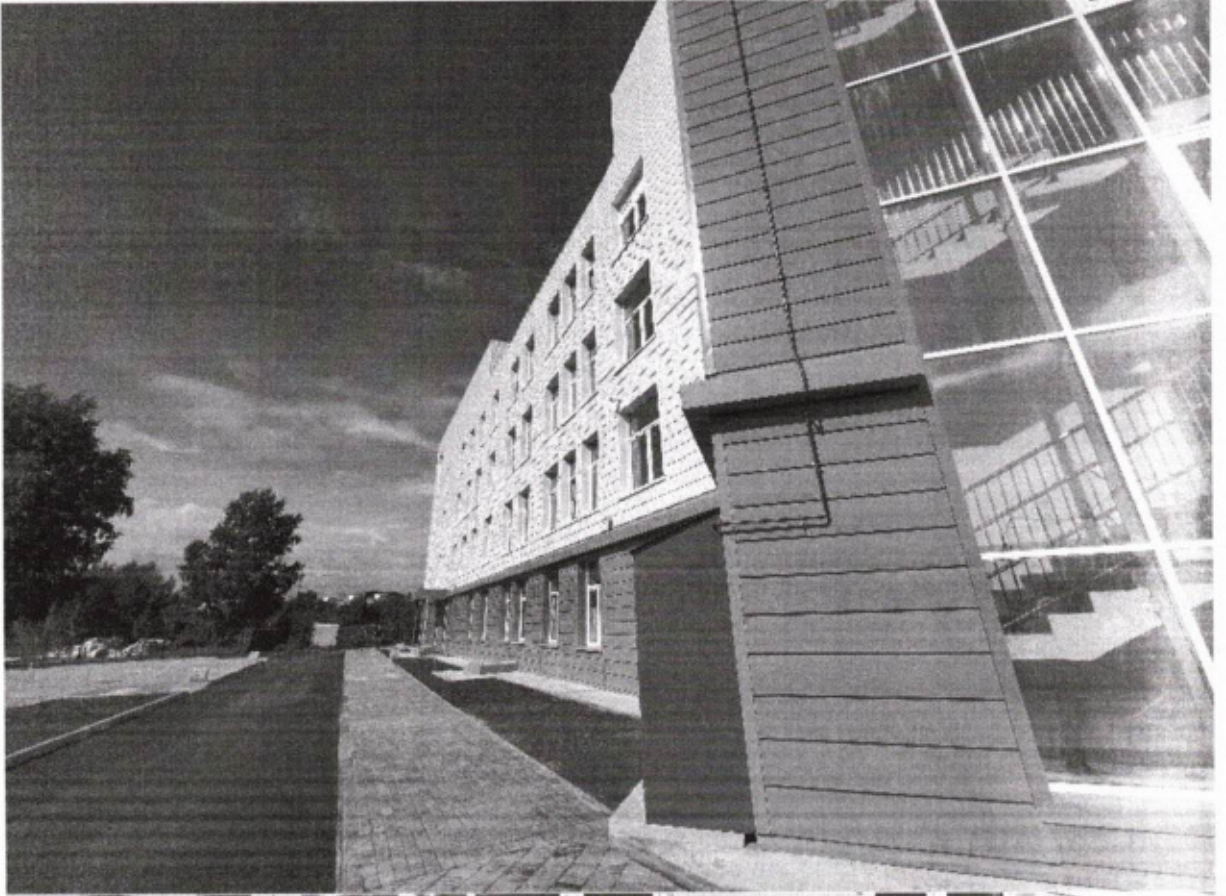




Элемент объекта соглашения № 3






Элемент объекта соглашения № 4

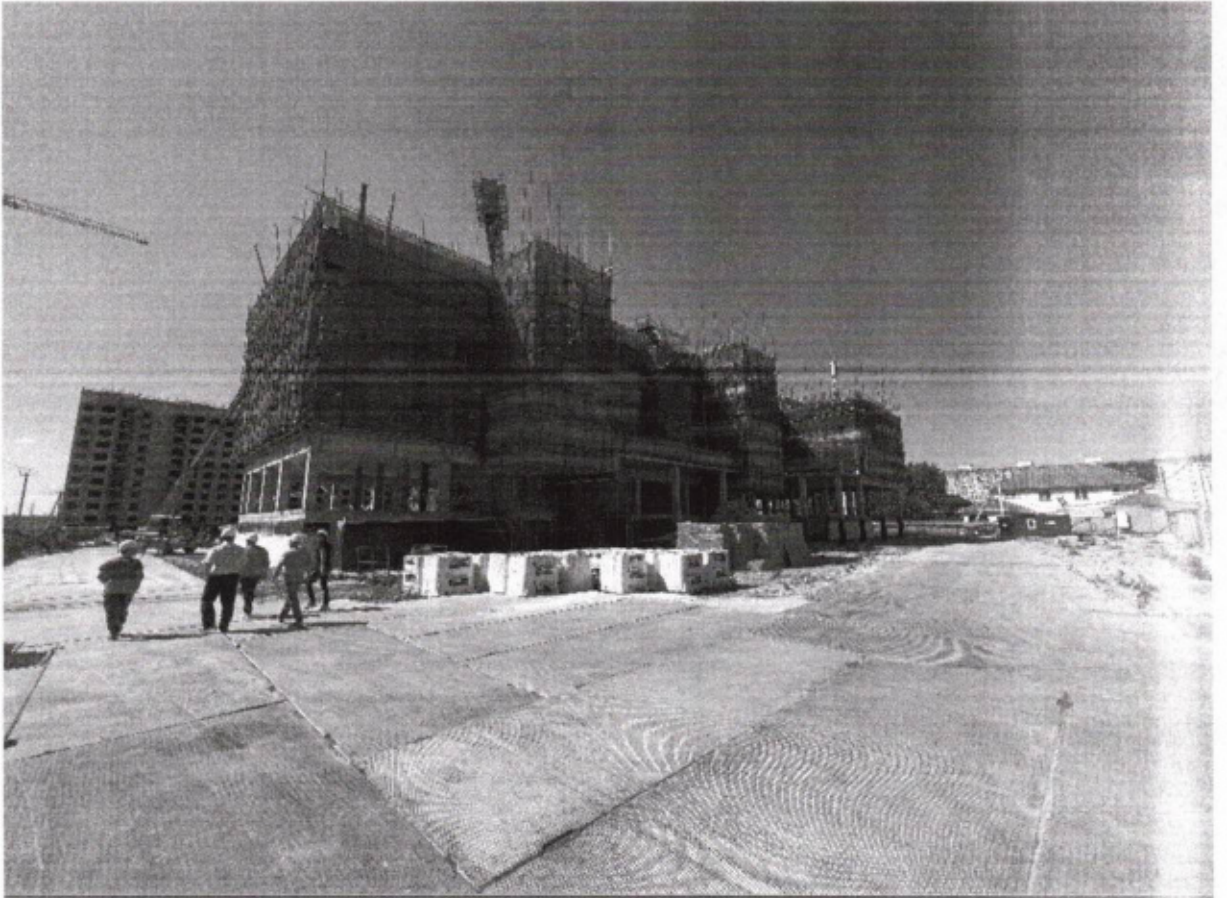





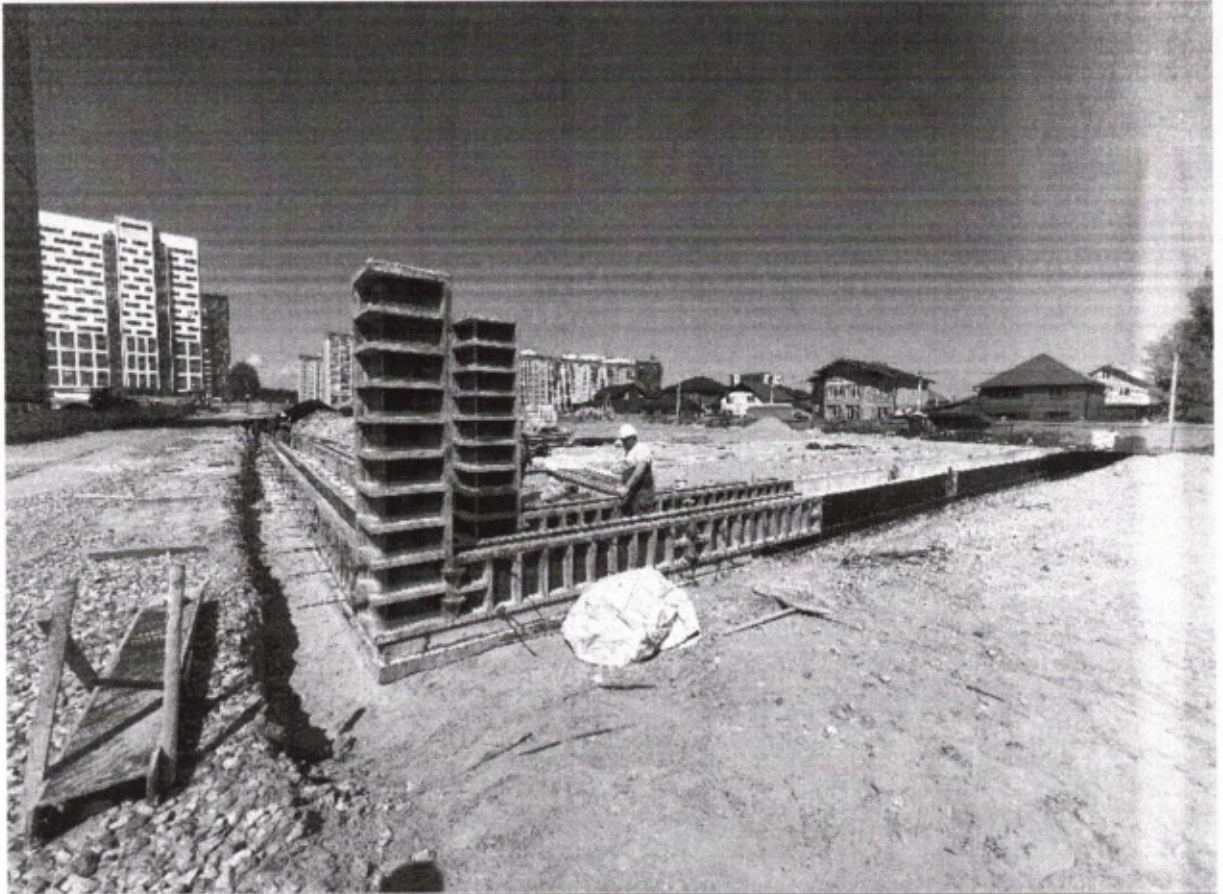


Элемент объекта соглашения № 5






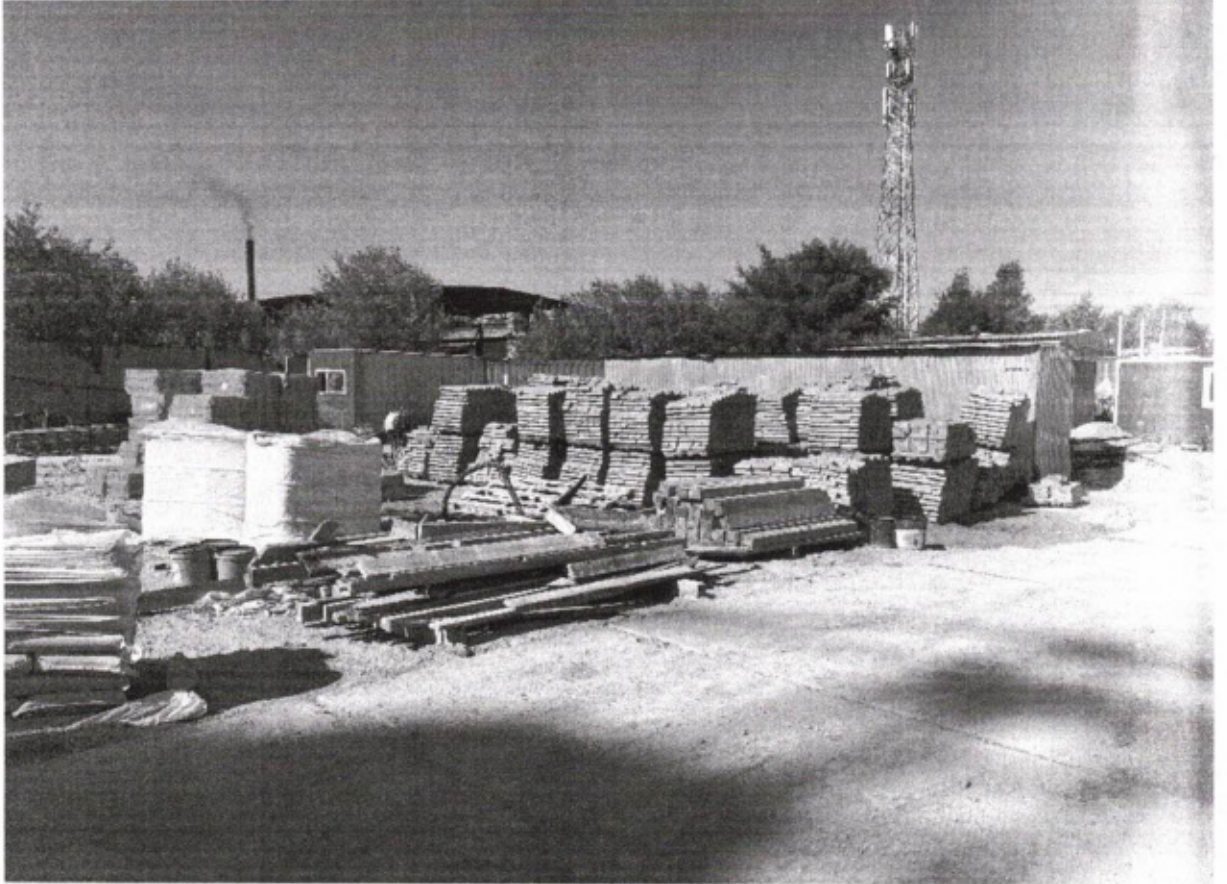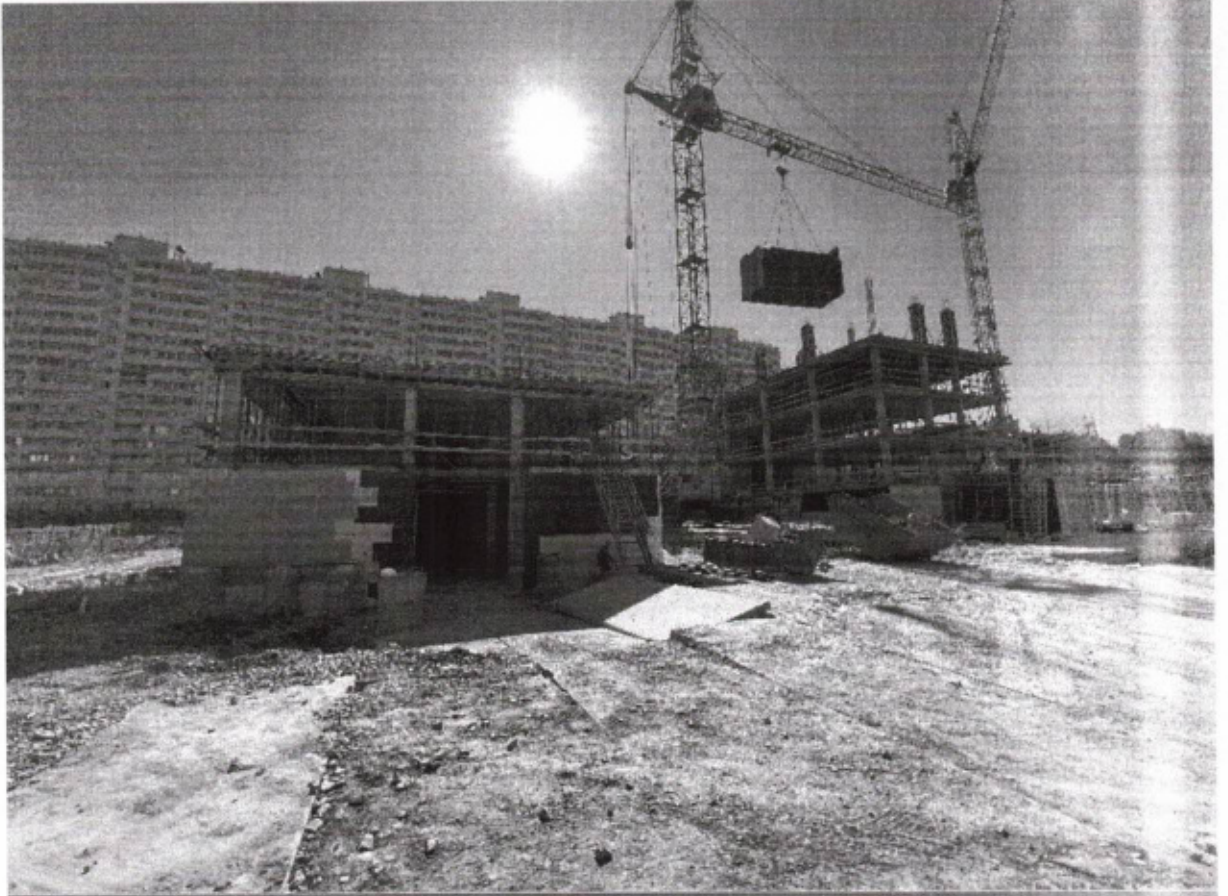

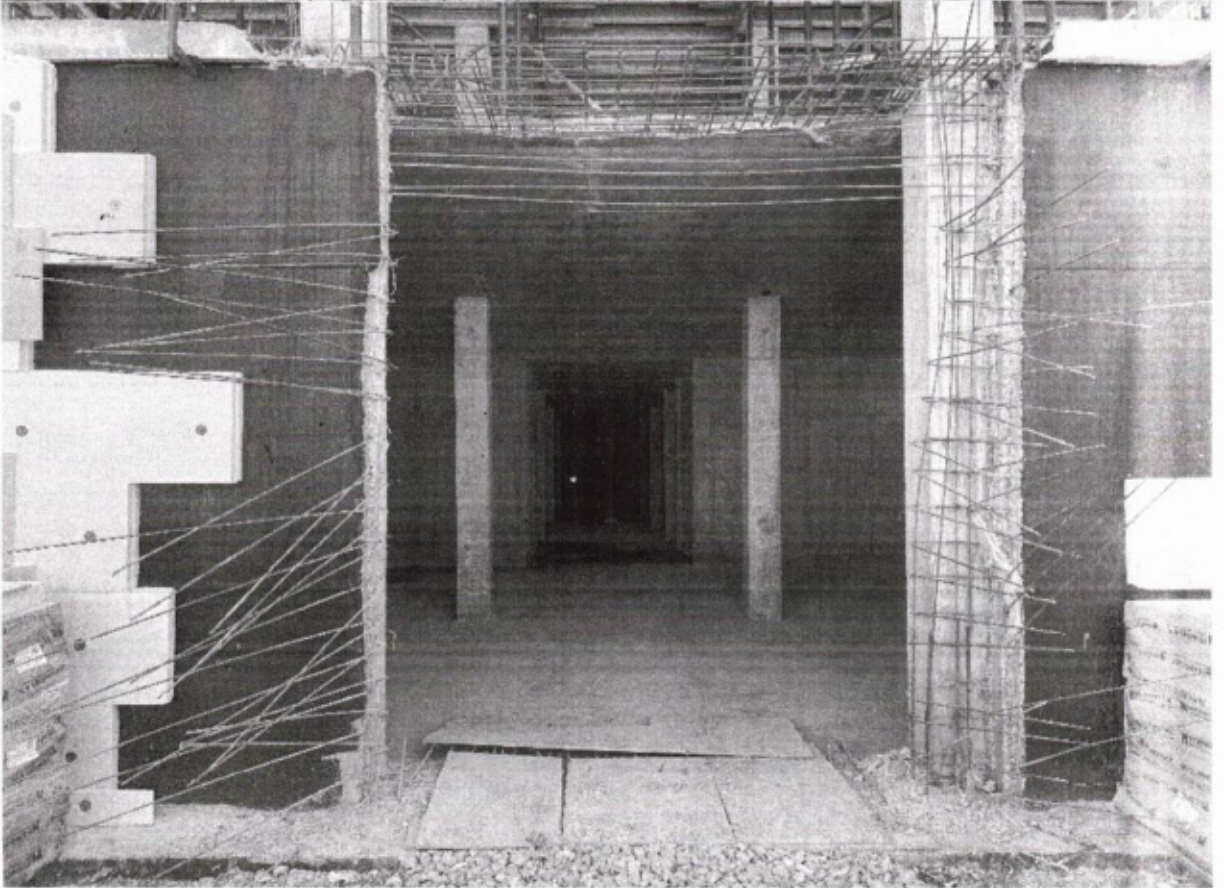



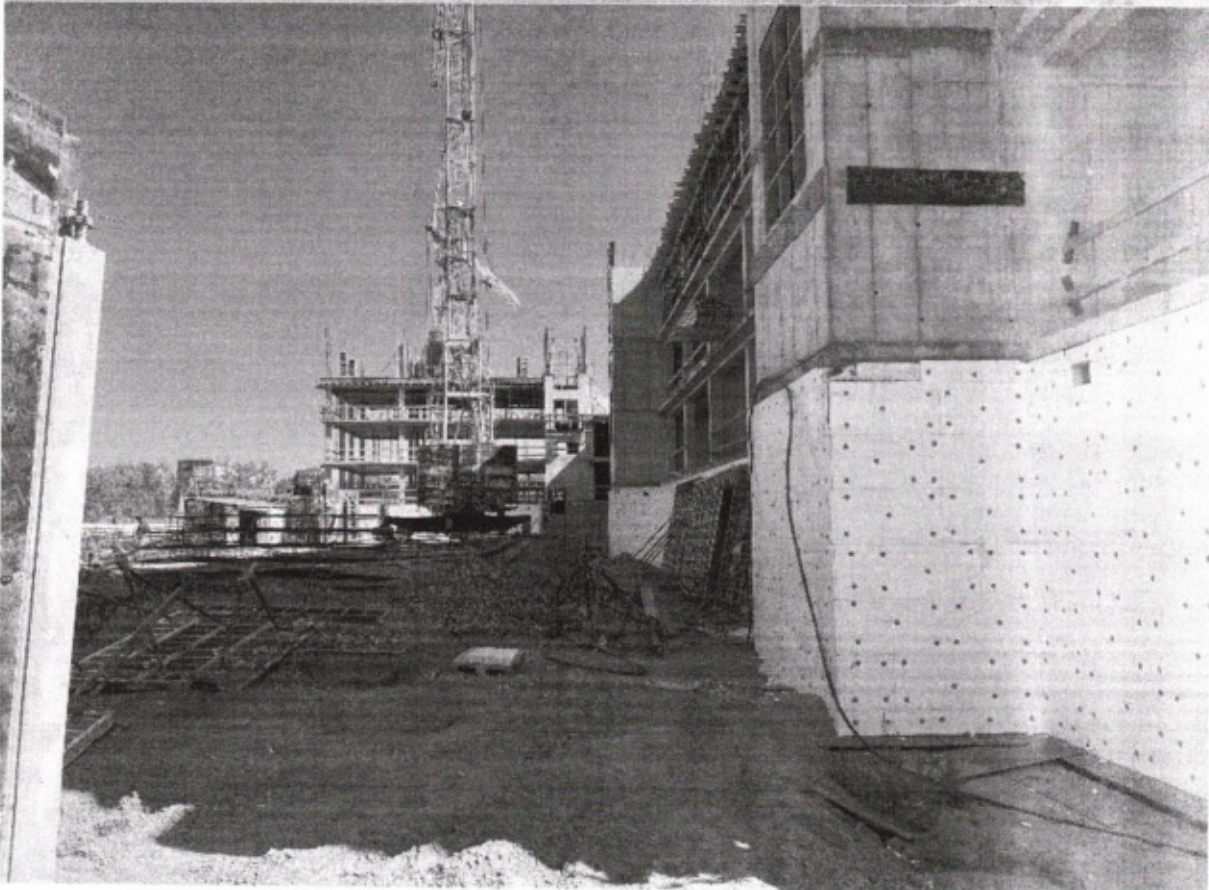

Элемент объекта соглашения № 6













Элемент объекта соглашения № 7



**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минздрав НСО)

Красный проспект, д.18,  
г. Новосибирск, 630007

Тел.: (383) 238-63-68, факс: (383) 238-66-39

e-mail: Zdrav@nso.ru

<http://www.zdrav.nso.ru>

14 ИЮЛ 2023

№ 01-09/16828/24

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

О направлении акта  
о результатах контроля

Генеральному директору  
ООО «Национальный медицинский  
холдинг» — управляющей организации  
ООО «Седьмая концессионная  
компания»

С.А. Парсаданяну

121096, г. Москва,  
ул. В. Кожинной, д. 1, к. 1

Уважаемый Сергей Ашотович!

Между Новосибирской областью в лице министерства здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» заключено соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019 (далее — соглашение), во исполнение которого сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 24 Правил осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490, направляем экземпляр акта о результатах за исполнением соглашения во 2 квартале 2023 года.

Приложение: на 49 л. в 1 экз.

Министр

К.В. Хальзов

А.И. Коваленко  
(383) 238-63-28

**СПИСОК № 99 (Партия 801)  
внутренних почтовых отправлений  
от 14.07.2023  
(дата)**

Вид РПО: Бандероль  
 Разряд: Без разряда  
 Способ оплаты: - основной услуги  марки  безналичный расчет  300  
 - уведомления о вручении  марки  безналичный расчет  
 Способ пересылки: Наземный  
 Отправитель: Министерство здравоохранения Новосибирской области e-mail: etg@nso.ru  
 ИНН/КПП: 5406635579 / 540601001 Договор №: 51/23-МР54

С услугой «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя РПО 9 5 1 3 6 6 6 8 0 2

«SMS-уведомление о вручении РПО»  «SMS-уведомление о поступлении РПО в адресное ОПС»

Наименование и индекс места приема: ЦОЮЛ 630007

Всего отправлений: 1 Всего листов: 3 лист № 1

№ № п/п	Обозначение многоместного отправления Адресат (Ф.И.О.) Почтовый адрес Номер почтомата, наименование населенного пункта, индекс ОПС, обслуживающий почтомат Номер мобильного телефона адресата	ШПИ (штриховой почтовый идентификатор) Внутренний номер клиента	Категория РПО	Фактический вес, (кг.) Объемный вес, (кг.) Линейные размеры (ДхШхВ), (см)	Доп. услуги: Тип уведомления Проверка соответствия вложения описи Ф.107 Надбавка за отметку 'Осторожно'	Сумма объявленной ценности, (руб.)	Сумма наложенного платежа, (руб.)	Сумма платы за пересылку (без доп. услуг), без НДС (руб.)	Сумма платы за пересылку (без доп. услуг), с НДС, (руб.)	Сумма платы за доп. услуги, без НДС, (руб.)	Сумма платы за доп. услуги, с НДС, (руб.)	Примечание
1	Генеральному директору ООО "Национальный медицинский холдинг" управляющей организации ООО "Седьмая концессионная компания" С.А. Парсаданяну 121096, ул. Василисы Кожиной, д. 1 к. 1, г. Москва	80083386981268 01-09/16828/ 24	Заказное	0.282		-	-	116.00	139.20	-	-	
Итого:						0.00	0.00	116.00	139.20	0.00	0.00	

Общее количество отправлений 1 (один)  
(сумма цифрами и прописью)

Из них количество отправлений по категориям, а также сумма их платы за пересылку с учетом платы за объявленную ценность:  
Заказное 1  
(категория РПО) (количество РПО цифрами)

Сумма платы за пересылку с НДС 139.20 (Сто тридцать девять рублей 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Сумма платы за пересылку без НДС 116.00 (Сто шестнадцать рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Отправитель: Министерство здравоохранения Новосибирской области

В т.ч. НДС 23.20 (Двадцать три рубля 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

**Плата за пересылку:**

Общая сумма платы за пересылку с НДС 139.20 (Сто тридцать девять рублей 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку без НДС 116.00 (Сто шестнадцать рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 23.20 (Двадцать три рубля 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма объявленной ценности всех РПО 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за объявленную ценность с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)  
(сумма цифрами и прописью)

Итого за пересылку, с НДС 139.20 (Сто тридцать девять рублей 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Итого за пересылку без НДС 116.00 (Сто шестнадцать рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 23.20 (Двадцать три рубля 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

**Дополнительные услуги:**

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя с НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя без НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги без НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список без НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)  
(сумма цифрами и прописью)

**Всего к оплате:**

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) с НДС 139.20 (Сто тридцать девять рублей 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) без НДС 116.00 (Сто шестнадцать рублей 00 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 23.20 (Двадцать три рубля 20 копеек)  
(сумма цифрами и прописью)

СПИСОК № 99 (Партия 801) Дата 14.07.2023 Лист № 3

Отправитель: Министерство здравоохранения Новосибирской области

Сдал: директор  
(должность)

Меркурьев  
(подпись)

Меркурьев  
(Ф.И.О.)



Принял:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)



(оттиск КППШ ОПС  
места приема)

Отрывной талон

К СПИСКУ № 99 (Партия 801) Дата 14.07.2023

Отправитель: Министерство здравоохранения Новосибирской области

из один  
(кол-во цифрами и прописью)

РПО, включенных в список, получено счетом в исправной упаковке

\_\_\_\_\_  
(кол-во цифрами и прописью)

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Получил: \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)



(оттиск КППШ)
