

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019

02.08.2024, 10:00

630007, г. Новосибирск,
Красный проспект, 18,
министерство здравоохранения
Новосибирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», разделом 8 Соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019 (далее — Соглашение) и статьей 7 Приложения № 6 к Соглашению Публичным партнером был проведен контроль за исполнением Соглашения во 2 квартале 2024 года.

Публичный партнер¹ — министерство здравоохранения Новосибирской области, ИНН 5406635579.

Частный партнер — ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986.

Проверка проводилась в следующем составе:

– В.В. Моор — начальник отдела материально-технического обеспечения и развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области;

А.С. Татаров — начальник отдела контроля за строительством объектов капитального строительства управления сопровождения строительства министерства строительства Новосибирской области;²

– А.И. Коваленко — консультант министерства здравоохранения Новосибирской области;

– К.В. Помогайбо — главный эксперт министерства здравоохранения Новосибирской области.

Статус проверки: документарная, выездная, плановая.

Проверка была проведена с 15.07.2024 по 26.07.2024 по месту нахождения

¹ Здесь и далее по тексту термины и определения с заглавной буквы приведены в значении, определенном в Соглашении, если не установлено иное.

² Участие представителя министерства строительства осуществлялось только в рамках выездного мероприятия.

Публичного партнера и по месту нахождения Элементов объекта соглашения:

- Элемента объекта соглашения № 1 (г. Новосибирск, ул. Ереванская, кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:671);
- Элемента объекта соглашения № 2 (г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, кадастровый номер земельного участка 54:35:072255:50);
- Элемента объекта соглашения № 3 (г. Новосибирск, ул. Пролетарская, (259), кадастровый номер земельного участка 54:35:071935:602);
- Элемента объекта соглашения № 4 (г. Новосибирск, ул. Краснодарская, 6/5, кадастровый номер земельного участка 54:35:053645:214);
- Элемента объекта соглашения № 5 (г. Новосибирск, ул. Степная, 266, кадастровый номер земельного участка 54:35:062555:134);
- Элемента объекта соглашения № 6 (г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, 2/1, кадастровый номер земельного участка 54:35:051165:114);
- Элемента объекта соглашения № 7 (г. Новосибирск, пл. Райсовета, кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:207).

Период проведения контрольных мероприятий составил 12 дней.

Предметом проверки явилось: определение статуса готовности Объекта соглашения, действие разрешений на строительство, соблюдение графиков производства работ, ввод в эксплуатацию Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, осуществление Частным партнером технического обслуживания Элемента объекта соглашения № 3, контроль за исполнением иных условий по Соглашению.

За 2 квартал 2024 года была рассмотрена информация об исполнении обязательств Частного партнера по Соглашению (Соглашение, письма Частного партнера, письма Сторон Соглашения, отчет Частного партнера на инвестиционном этапе за 2 квартал 2024 года³ (далее — Квартальный отчет Частного партнера на Инвестиционном этапе), отчет Частного партнера на эксплуатационном этапе за 2 квартал 2024 года⁴ (далее — Квартальный отчет Частного партнера на Эксплуатационном этапе), результаты совместных межведомственных совещаний, пр.).

1. Статус исполнения Частным партнером условий Соглашения

Основные мероприятия	Предполагаемые сроки ⁵	Фактические сроки	Статус
Получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении Элементов объекта соглашения:			
В отношении Элемента объекта соглашения № 1	до 31.12.2023 (31.07.2024) ⁶	не наступил	–
В отношении Элемента объекта соглашения № 2	до 30.06.2023	не исполнен	ведется Спор
В отношении Элемента объекта соглашения № 3	до 30.06.2023 (30.01.2024) ⁶	14.03.2024	срок не соблюден, ведется Спор

³ Представлен письмом ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 527/СМК/2024 от 25.07.2024.

⁴ Представлен письмом ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 526/СМК/2024 от 25.07.2024.

⁵ В соответствии с дополнительным соглашением № 10 от 21.05.2024 к Соглашению.

⁶ Подробнее см. Особые обстоятельства.

Основные мероприятия	Предполагаемые сроки ⁵	Фактические сроки	Статус
В отношении Элемента объекта соглашения № 4	до 31.12.2024	не наступил	–
В отношении Элемента объекта соглашения № 5	до 31.03.2025	не наступил	–
В отношении Элемента объекта соглашения № 6	до 31.12.2025	не наступил	–
В отношении Элемента объекта соглашения № 7	до 31.12.2025	не наступил	–
Дата приемки объекта	до 28.02.2026	не наступил	–

Строительство Объекта соглашения в соответствии с Проектной документацией, разработанной Частным партнером в полном объеме (исх. № 154/СМК/2021 от 28.04.2021, исх. № 394/СМК/2021 от 07.10.2021, исх. № 425/СМК/2021 от 18.11.2021, исх. № 427/СМК/2021 от 19.11.2021), получившей положительное заключение Государственной экспертизы (№ 54-1-1-3-034703-2021 от 30.06.2021, № 54-1-1-3-034749-2021 от 30.06.2021, № 54-1-1-3-045794-2021 от 13.08.2021, № 54-1-1-3-066801-2021 от 12.11.2021, № 54-1-1-3-057808-2021 от 07.10.2021, № 54-1-1-3-037067-2021 от 07.07.2021, № 54-1-1-3-066285-2021 от 11.11.2021).

В отчетном периоде действуют все разрешения на строительство в отношении всех Элементов объекта соглашения (№ 54-Ru54303000-98-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-96-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-97-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-242-2021 от 01.12.2021, № 54-Ru54303000-230-2021 от 22.11.2021, № 54-Ru54303000-141-2021 от 16.07.2021, № 54-Ru54303000-244-2021 от 02.12.2021).

В отчетном квартале срок действия:

– разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 1 (Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27) в связи с истечением было продлено Частным партнером 22.04.2024;

– разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 2 (Городская клиническая поликлиника № 2) в связи с истечением было продлено 23.04.2024 и 13.06.2024;

– разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 4 (Городская клиническая поликлиника № 13) в связи с истечением было продлено 11.06.2024;

– разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 5 (Городская поликлиника № 18) в связи с истечением было продлено 19.06.2024;

– разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 7 (Городская клиническая поликлиника № 16) в связи с истечением было продлено 19.06.2024.

Рабочая документация в соответствии с требованиями пункта 15.4 Соглашения представлена Публичному партнеру не в полном объеме.

В отчетном периоде сроки получения Частным партнером Разрешений на ввод в эксплуатацию были смещены в соответствии с дополнительным соглашением № 10 от 21.05.2024 к Соглашению в отношении Элементов объекта соглашения №№ 4 – 7.

В отчетном периоде в отношении задержки получения Частным партнером Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 2 Публичным партнером направлено исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием о взыскании Неустойки. Рассмотрение ведется в рамках дела № А45-17152/2024.

В отчетном периоде в отношении задержки получения Частным партнером Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 3 Публичным партнером направлено исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием о взыскании Неустойки. Рассмотрение ведется в рамках дела № А45-19627/2024.

В ходе контрольных мероприятий был проведен анализ статуса исполнения Частным партнером обязательств по Строительству Объекта соглашения.

16.07.2024 представителями Публичного партнера был осуществлен выездной информационный осмотр Элемента объекта соглашения № 1 – 3.

17.07.2024 представителями Публичного партнера был осуществлен выездной информационный осмотр Элемента объекта соглашения № 4 – 7.

В отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, 3 по согласованию с ФБУ «РосСтройКонтроль» 25.04.2023 Частным партнером были актуализированы графики производства работ (графики строительства).

Частным партнером были актуализированы графики производства работ (графики строительства) в отношении Элементов объекта соглашения №№ 4 – 7.

В соответствии с графиками производства работ (графиками строительства) по состоянию на 30.06.2024 строительная готовность⁷ должна составлять в отношении:

- Элемента объекта соглашения № 1 — 100%;
- Элемента объекта соглашения № 2 — 100%;
- Элемента объекта соглашения № 4 — 53%;
- Элемента объекта соглашения № 5 — 35%;
- Элемента объекта соглашения № 6 — 31%;
- Элемента объекта соглашения № 7 — 11%.

Согласно сведениям Частного партнера (исх. № 429/СМК/2024 от 27.06.2024), по состоянию на 26.06.2024 для Строительства Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 задействовано 38 рабочих и специалистов, 0 единиц строительной техники и механизмов. По сравнению с 1 кварталом 2024 года задействовано на 70 рабочих и специалистов меньше (связано, в первую очередь, с завершающей стадией основных строительно-монтажных работ в отношении Элементов объекта соглашения №№ 2, 3 и приостановкой Заемных инвестиций Финансирующей организацией⁸ с 30.10.2023, связанного со значительным увеличением размера ключевой ставки Банка России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России на Дату заключения соглашения), что является, по мнению Частного партнера, Особым обстоятельством (с указанным мнением

⁷ В отношении Элементов объекта соглашения №№ 1 – 3 актуализированные Графики строительства утверждены ФБУ «РосСтройКонтроль» и согласованы письмом Публичного партнера от 02.05.2023 № 01-09/10020/24. В отношении Элементов объекта соглашения №№ 4 – 7 актуализированы в соответствии с письмом ООО «Седьмая концессионная компания» исх. 346/СМК/2024 от 31.05.2024.

⁸ В отчетном периоде Финансирующей организацией было одобрено выделение транша Частному партнеру в размере до 1 500 000 тыс. рублей.

не согласился Публичный партнер, в связи с чем вопрос рассматривается в порядке Спора).

Степень строительной готовности Элементов объекта соглашения оценивается Частным партнером следующим образом:⁹

- в отношении Элемента объекта соглашения № 1 — 88,9%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 2 — 100,0%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 4 — 53,2%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 5 — 35,1%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 6 — 30,9%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 7 — 10,7%.

По мнению Публичного партнера, общая строительная готовность в отношении Элемента объекта соглашения № 2 составляет не более 95%, Элемента объекта соглашения № 4 составляет не более 50%, Элемента объекта соглашения № 6 составляет не более 25%, в отношении Элемента объекта соглашения № 7 — не более 5%.

В ходе выездного осмотра зафиксировано отсутствие у Частного партнера Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 2, в отношении Элемента объекта соглашения № 5, Элемента объекта соглашения № 6 и Элемента объекта соглашения № 7 строительно-монтажные работы не осуществлялись, актуальные графики производства работ (графики строительства) на строительных площадках Элементов объекта соглашения отсутствуют, количество рабочих на Элементах объекта соглашения №№ 1, 4, по мнению Публичного партнера, является недостаточным и влечет риск задержки ввода в эксплуатацию указанных Элементов объекта соглашения.

В соответствии с пунктом 15.4 соглашения частным партнером с 24.07.2023 не предоставлялся комплект Рабочей документации в отношении какого-либо Элемента объекта соглашения.

Вместе с тем, в отношении Элемента объекта соглашения № 1, Элемента объекта соглашения № 4, Элемента объекта соглашения № 5, Элемента объекта соглашения № 6 МП «Метро МиР» не выполнены мероприятия по осуществлению технологического присоединения к централизованным сетям водоотведения (ливневой канализации), что может препятствовать исполнению Частным партнером пункта 17.3 Соглашения.

Стоит также отметить, что внутриплощадочные сети водоотведения (ливневой канализации) Частным партнером в отношении Элемента объекта соглашения № 4, Элемента объекта соглашения № 5, Элемента объекта соглашения № 6 не выполнены.

По пояснениям Частного партнера, отставание от графиков строительства Элементов объекта соглашения связано с действием Особых обстоятельств, заявленных Частным партнером (но не оспоренных Публичным партнером только в отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 3), недостаточностью рабочей силы, низкой производительностью труда субподрядчиков, дефицитом заемного финансирования.

В отчетном периоде Частным партнером осуществлялись устранение

⁹ На основании письма ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 429/СМК/2024 от 27.06.2024.

Недостатков в отношении Элемента объекта соглашения № 3.¹⁰

Кроме этого, в отчетном периоде в отношении Элемента объекта соглашения № 2 осуществлен осмотр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» помещений поликлиники на предмет наличия (отсутствия) Недостатков, препятствующих получению Оператором по эксплуатации медицинской лицензии.

На Эксплуатационном этапе в отношении Элемента объекта соглашения № 3: в отчетном периоде мероприятия по Техническому обслуживанию не выполнялись ввиду отсутствия заключенного Договора аренды элемента с Оператором по эксплуатации, Государственными органами в эксплуатационной части (за исключением контрольного мероприятия Публичного партнера) проверок не проводилось, Предписания, представления, штрафы и т.п. отсутствуют, фактов действия или бездействия любых лиц, которые могут нанести ущерб Элементу объекта соглашения № 3 или иным образом препятствовать исполнению Соглашения не зафиксировано.¹¹ Однако Частным партнером выполняются мероприятия по содержанию Элемента объекта соглашения № 3, в частности: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, и охрана объекта.

2. Реализация иных мероприятий по Соглашению

В отношении невыполнения Частным партнером сроков Проектирования и получения разрешений на строительство Публичным партнером 08.08.2022 в Арбитражный суд Новосибирской области был подан иск о взыскании неустойки. По результатам рассмотрения дела № А45-21788/2022 Арбитражным судом Новосибирской области принято решение об удовлетворении иска Публичного партнера и взыскании с Частного партнера неустойки (в просрочке обязательств в отношении Элементов объекта соглашения №№ 4, 5, 7). Не согласившись с размером начисленной судом неустойки, Публичный партнер 03.07.2023 направил апелляционную жалобу, которая была рассмотрена Седьмым арбитражным апелляционным судом. 15.08.2023 Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу Публичного партнера без удовлетворения. 16.10.2023 Публичный партнер направил кассационную жалобу, по результатам рассмотрения которой 07.12.2023 решение суда первой инстанции оставлено в силе. 13.02.2024 Публичным партнером направлена жалоба в Верховный Суд Российской Федерации, в рассмотрении которой 15.04.2024 было отказано. 23.05.2024 Частный партнер осуществил выплату Неустойки в полном объеме.

В связи с недостижением согласия между сторонами об определении ключевых этапов строительства и установления ответственности Частного партнера за их несоблюдение Публичным партнером 30.04.2023 подан иск в арбитражный суд Новосибирской области. Указанное исковое заявление было рассмотрено арбитражным судом Новосибирской области (дело № А45-10227/2023) 25.10.2023, в удовлетворении исковых требований Публичного партнера отказано. Публичный партнер направил 01.12.2023 апелляционную жалобу на принятое решение, в удовлетворении которой было отказано 31.01.2024. 02.04.2024 Публичный партнер направил кассационную жалобу, в удовлетворении которой было отказано

¹⁰ Представлены письмом министерства здравоохранения Новосибирской области от 01.12.2023 № 01-09/28868/24.

¹¹ На основании информации, представленной Частным партнером в Квартальном отчете Частного партнера на Эксплуатационном этапе.

30.05.2024.

В отчетном периоде сведений о фактах нецелевого использования Частным партнером Земельных участков не поступало. Визуальный осмотр Земельных участков фактов неправомерного использования Частным партнером Земельных участков не выявил. Договоры аренды земельных участков в отношении всех Земельных участков действительны. По сведениям департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, арендная плата за Земельные участки вносится своевременно, задолженность по арендной плате у Частного партнера отсутствует.

Требования пункта 7.1 Соглашения в отношении Банковской гарантии на этапе строительства Частным партнером соблюдены.

Выплаты Капитального гранта и (или) Возмещения Публичным партнером в отчетном периоде не осуществлялись.

Расходование средств Капитального гранта осуществлялось Частным партнером в отчетном периоде следующим образом (в тыс. рублях):¹²

Наименование Элемента объекта соглашения	Проектные работы	Строительно-монтажные работы	Дополнительное оборудование	Прочее	ВСЕГО
Элемент объекта соглашения № 1	2 226,42	0,00	111 280,25	409,14	113 915,81
Элемент объекта соглашения № 2	0,00	0,00	0,00	1 710,40	1 710,40
Элемент объекта соглашения № 3	1 132,98	0,00	0,00	1 233,72	2 366,71
Элемент объекта соглашения № 4	0,00	0,00	0,00	424,55	424,55
Элемент объекта соглашения № 5	0,00	0,00	0,00	238,05	238,05
Элемент объекта соглашения № 6	0,00	0,00	0,00	1 143,44	1 143,44
Элемент объекта соглашения № 7	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77
ВСЕГО	3 359,40	0,00	111 280,25	5 170,08	119 809,72

Согласно сведениям, предоставленным Частным партнером, по итогам 2 квартала 2024 года приняты к учету работы на общую сумму 472 900,99 тыс. рублей с НДС (в соответствии с Квартальным отчетом Частного партнера на Инвестиционном этапе):

– по Элементу объекта соглашения № 1 на сумму 452 149,45 тыс. рублей с НДС;

– по Элементу объекта соглашения № 2 на сумму 10 608,71 тыс. рублей с НДС;

– по Элементу объекта соглашения № 3 на сумму 1 361,42 тыс. рублей с НДС;

– по Элементу объекта соглашения № 4 на сумму 3 035,09 тыс. рублей с НДС;

– по Элементу объекта соглашения № 5 на сумму 1 058,83 рублей с НДС;

– по Элементу объекта соглашения № 6 на сумму 1 356,01 рублей с НДС;

– по Элементу объекта соглашения № 7 на сумму 3 331,48 рублей с НДС.

Источником финансирования являются средства Капитального гранта, средства Заемного финансирования.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период

¹² На основании письма ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 484/СМК/2024 от 09.07.2024.

2025 и 2026 годов» объем средств, предусмотренный для реализации Соглашения, является достаточным для исполнения обязательств Публичного партнера по Соглашению в 2024 году.

Значения критериев эффективности проекта и показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа сохраняют свою неотрицательность.

Особые обстоятельства:

В отчетном периоде Частным партнером заявлены и (или) действовали Особые обстоятельства по Соглашению, которые рассматривались (рассмотрены) Публичным партнером:

Положение Соглашение	Суть Особого обстоятельства	Реквизиты сообщения, уведомления Частного партнера	Результат рассмотрения Публичным партнером
Подпункт (ы) пункта 38.2	Несвоевременное осуществление технологического присоединения к централизованным сетям водоотведения (ливневой канализации) Элемента объекта соглашения № 1	Сообщение: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 763/СМК/2023 от 22.09.2023 (вх. № 20379/24 от 22.09.2023) Уведомление: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 850/СМК/2023 от 19.10.2023 (вх. № 23276/24 от 20.10.2023) Дополнение № 1: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 28/СМК/2024 от 19.01.2024 (вх. № 1119/24 от 22.01.2024) Дополнение № 2: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 270/СМК/2024 от 27.04.2024 (вх. № 9350/24 от 02.05.2024)	Срок действия Особого обстоятельства продлен до 31.07.2024

Заключение:

Частным партнером выполняются обязательства по исполнению Соглашения, в части строительно-монтажных работ в отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, 4 Разрешения на строительство, полученные Частным партнером, действительны в отношении всех Элементов объекта соглашения. В целях выполнения сроков по вводу в эксплуатацию Элементов объекта соглашения №№ 5 – 7 Частному партнеру в кратчайшие сроки рекомендуется возобновить строительно-монтажные работы. По факту задержки получения Частным партнером разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 2 между Сторонами Соглашения в Арбитражном суде Новосибирской области ведется рассмотрение Спора. По факту задержки получения Частным партнером разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 3 между Сторонами Соглашения в Арбитражном суде Новосибирской области ведется рассмотрение Спора.

Частному партнеру рекомендуется увеличить темпы производства строительно-монтажных работ, разработки и утверждения Рабочей документации в отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 4 – 7, в целях обеспечения своевременного обеспечения их ввода в эксплуатацию.

Частному партнеру в целях ввода элементов объекта соглашения в эксплуатацию рекомендуется обеспечить выполнение мероприятий по устранению нарушений в отношении Элемента объекта соглашения № 1, элемента объекта соглашения № 4, элемента объекта соглашения № 5, элемента объекта соглашения № 6, элемента объекта соглашения № 7, выявленных инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области в ходе мероприятий регионального государственного строительного надзора.

От Публичного партнера:


_____/В.В. Моор/


_____/К.В. Помогайбо/


_____/А.И. Коваленко/


_____/А.С. Татаров/


От Частного партнера:

_____/_____/


Дата ознакомления: _____._____.2024

Приложение к акту
о результатах контроля




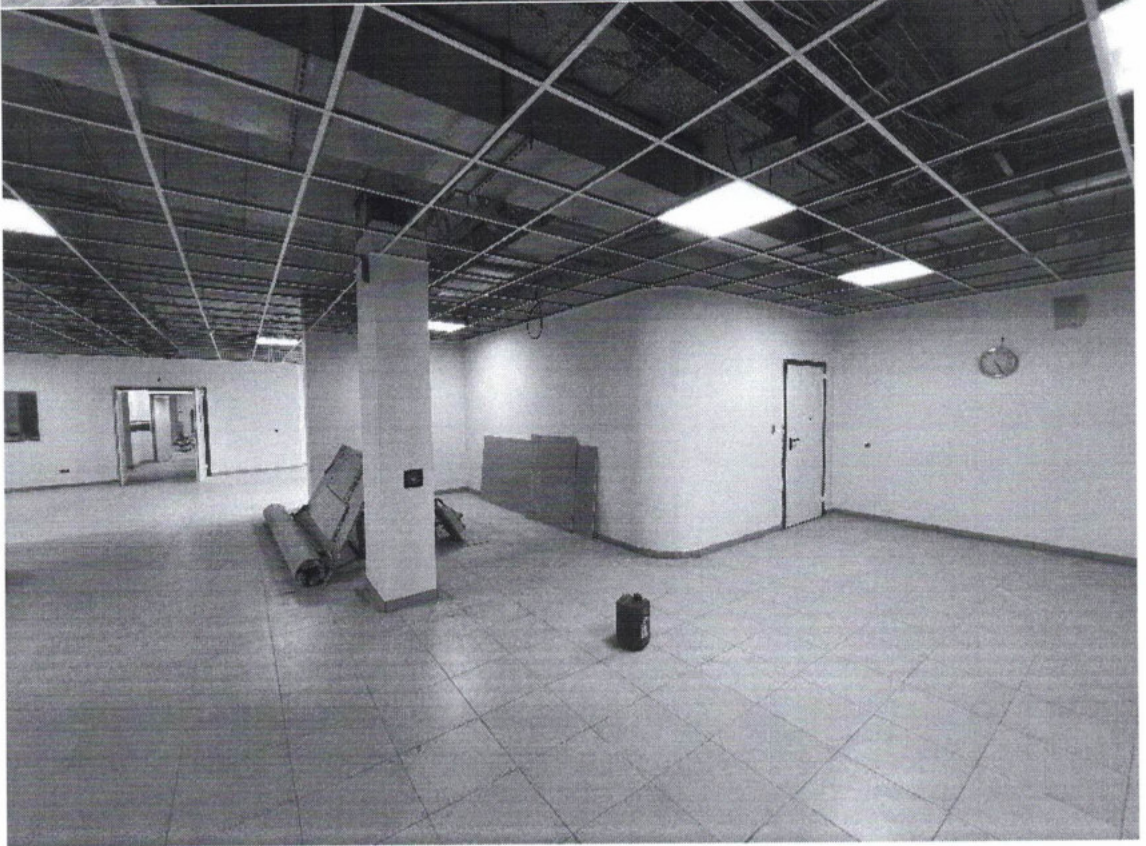





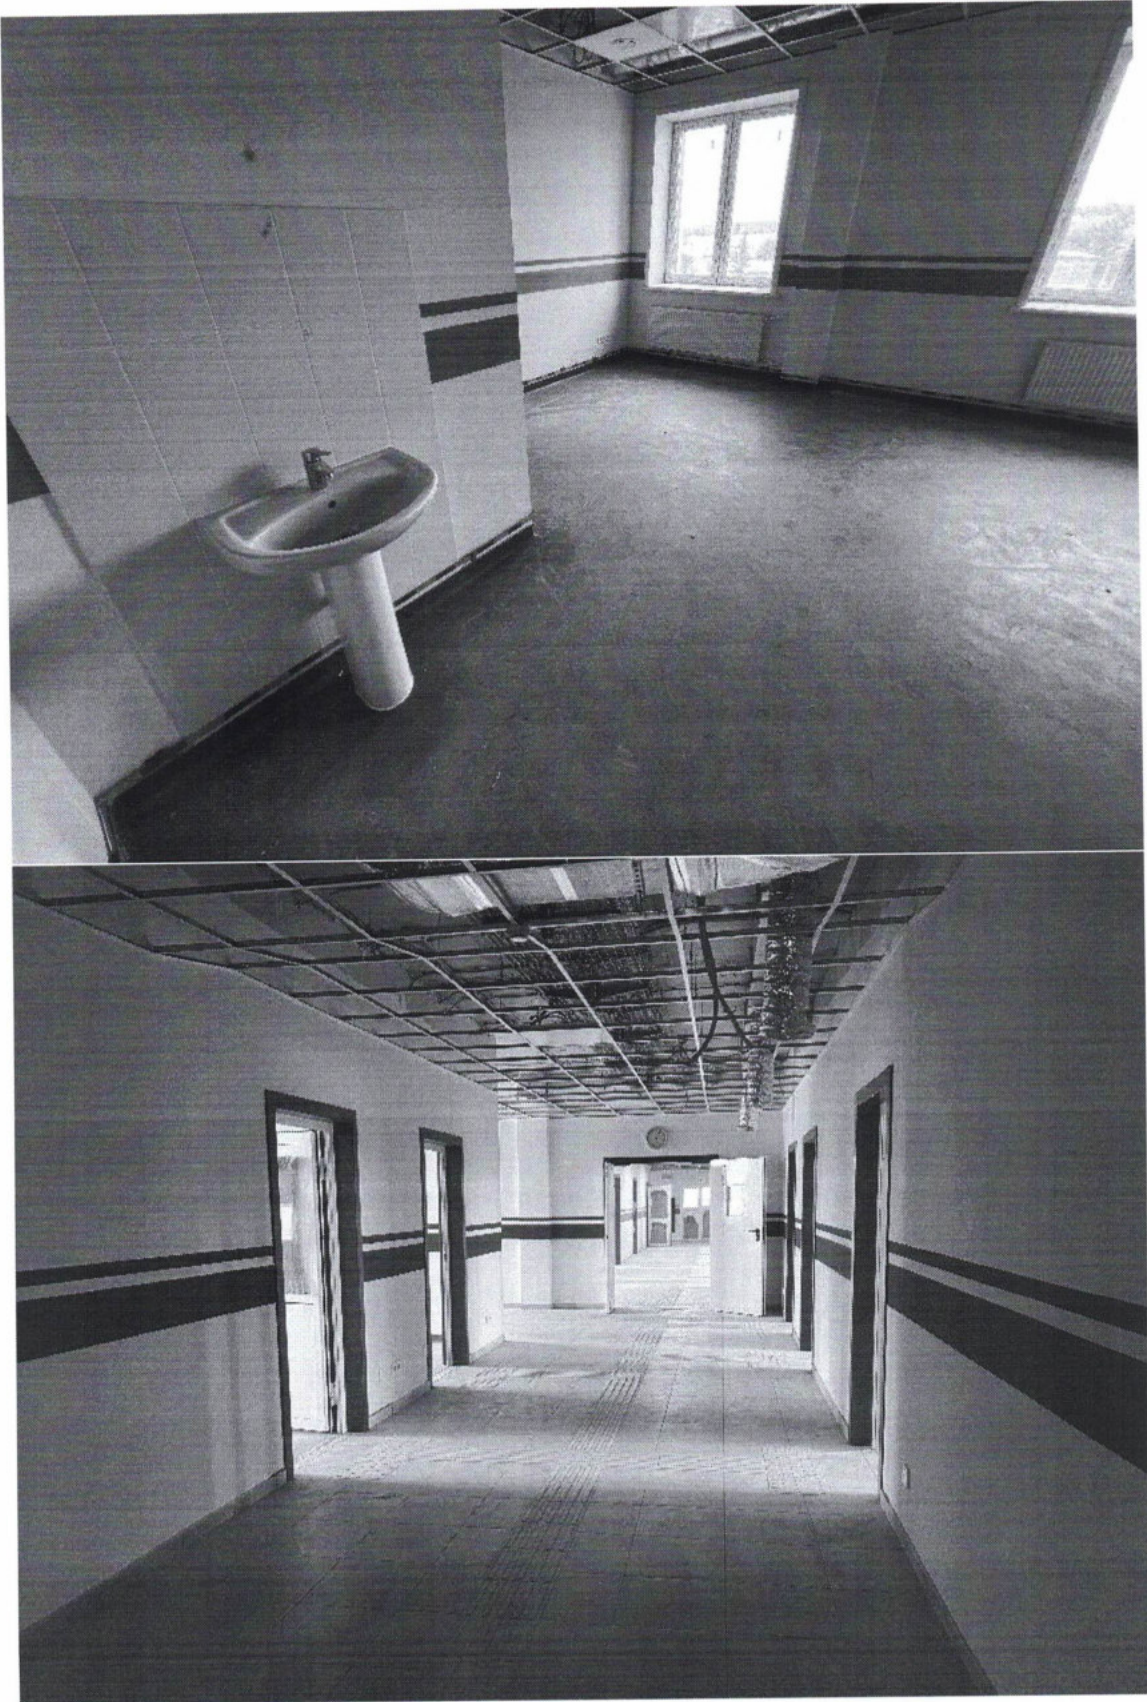

Элемент объекта соглашения № 1

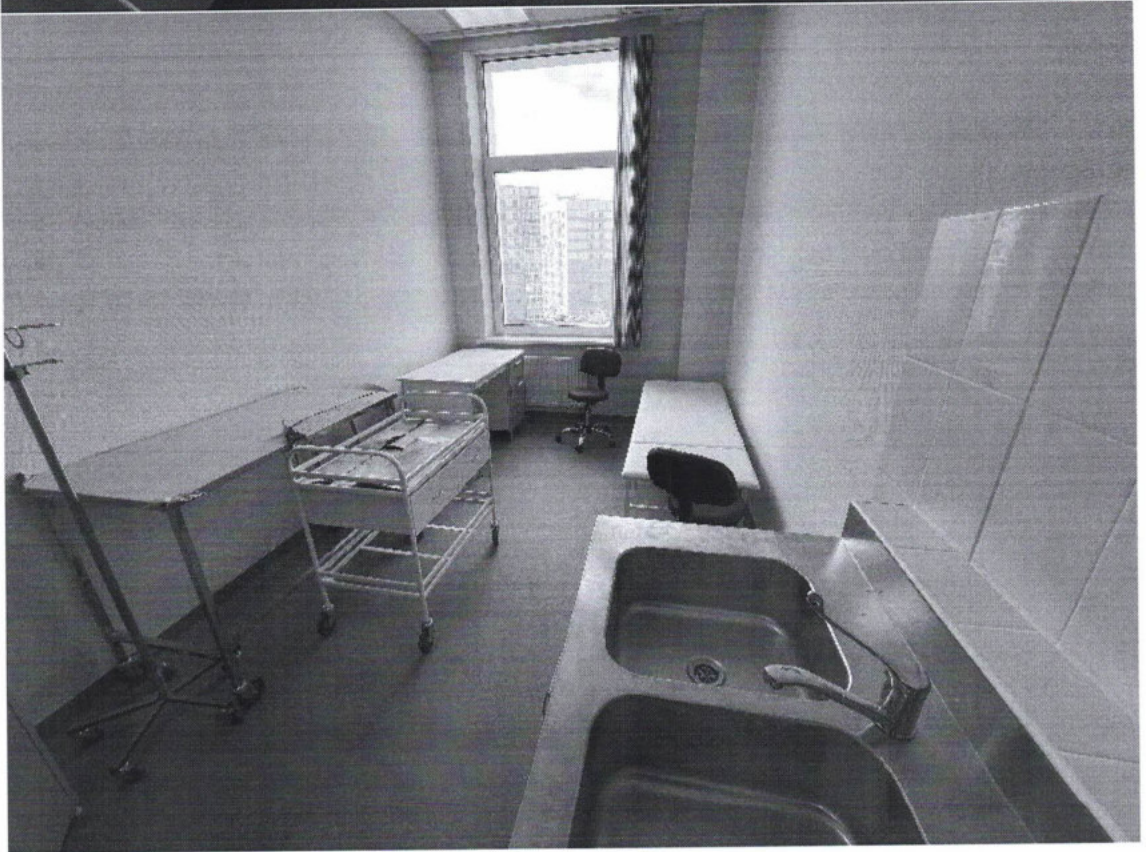


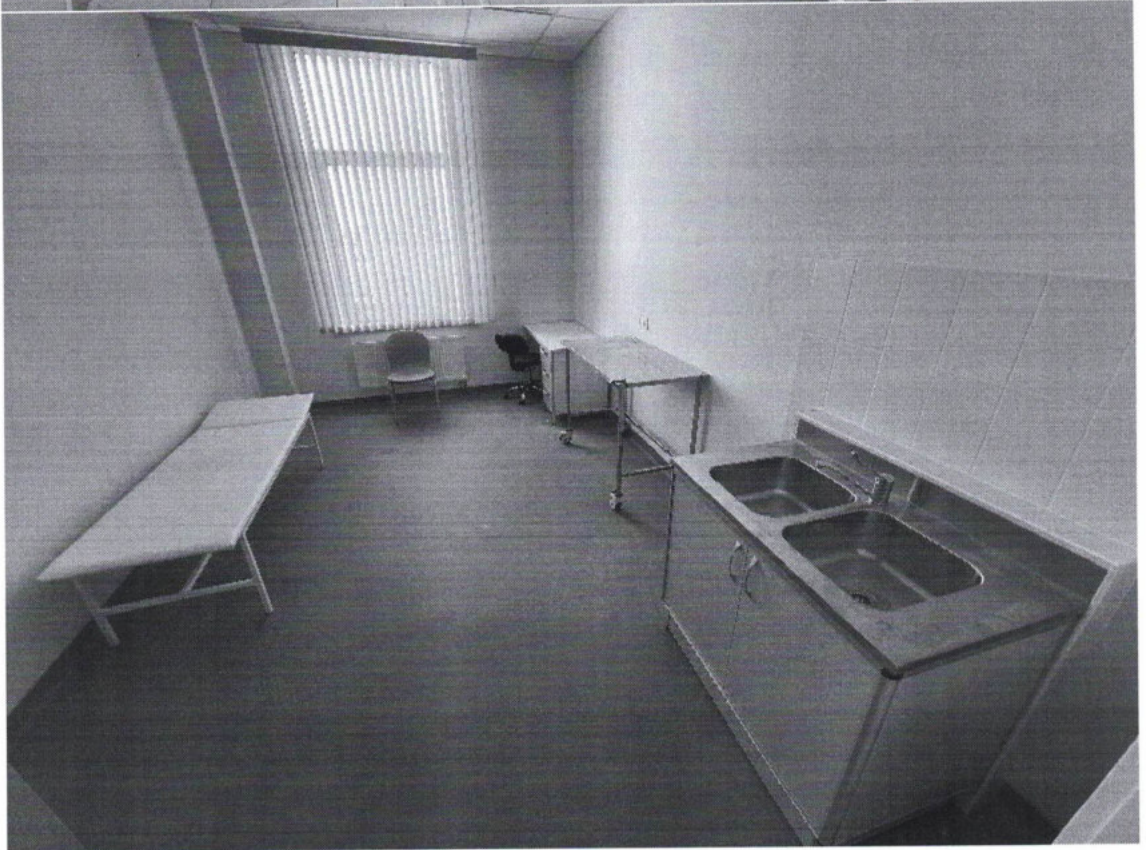

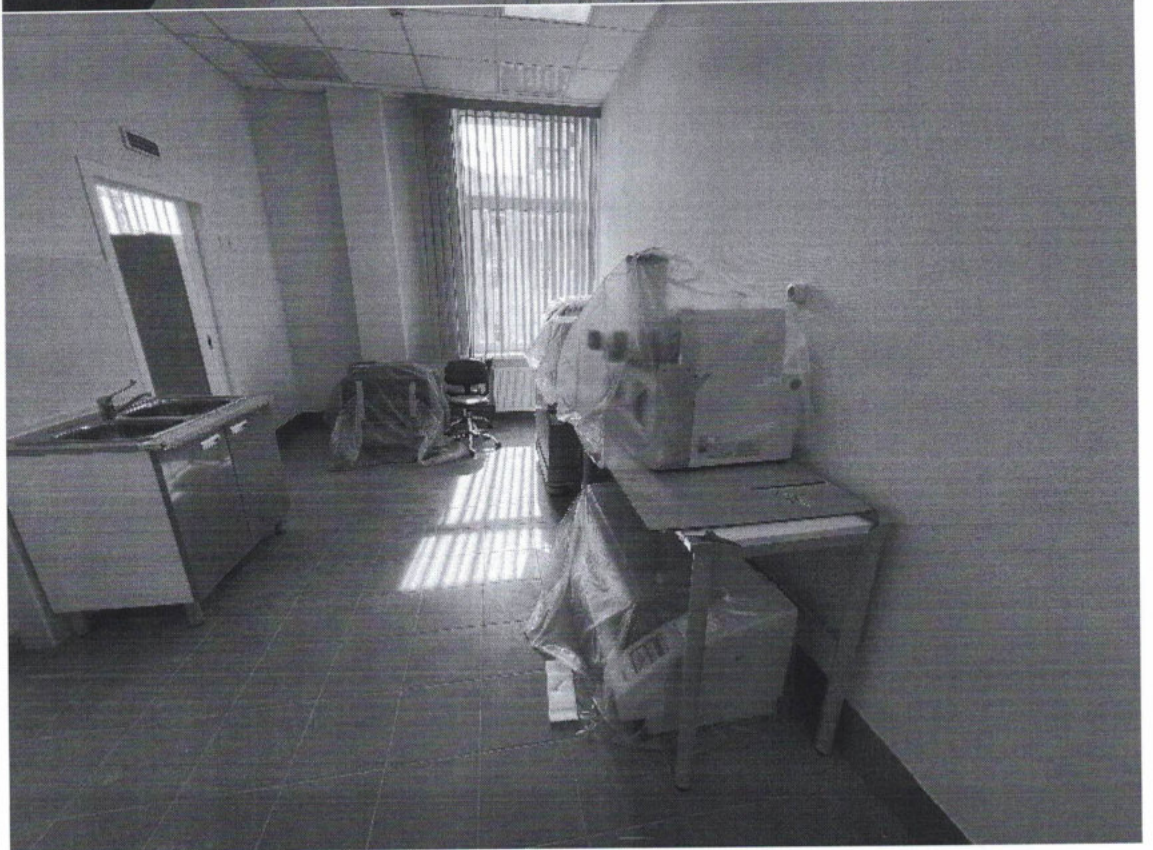



Элемент объекта соглашения № 2

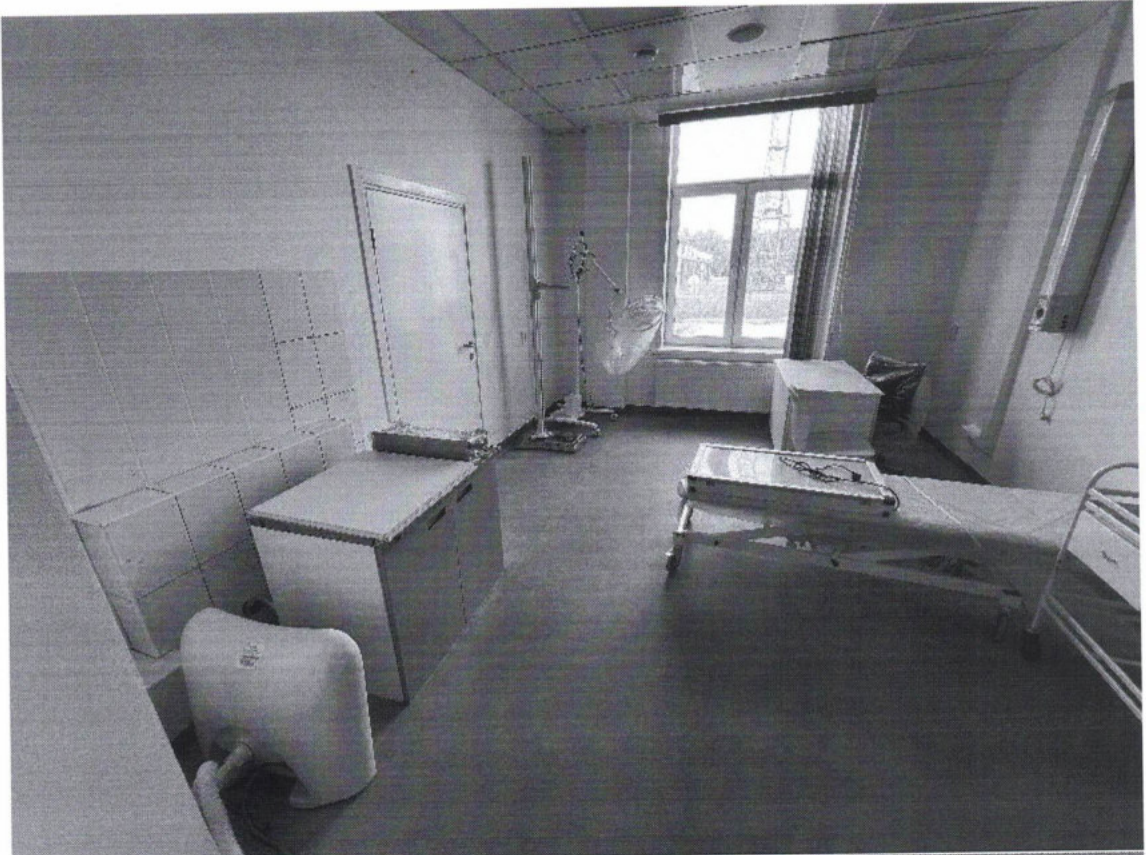








Элемент объекта соглашения № 3






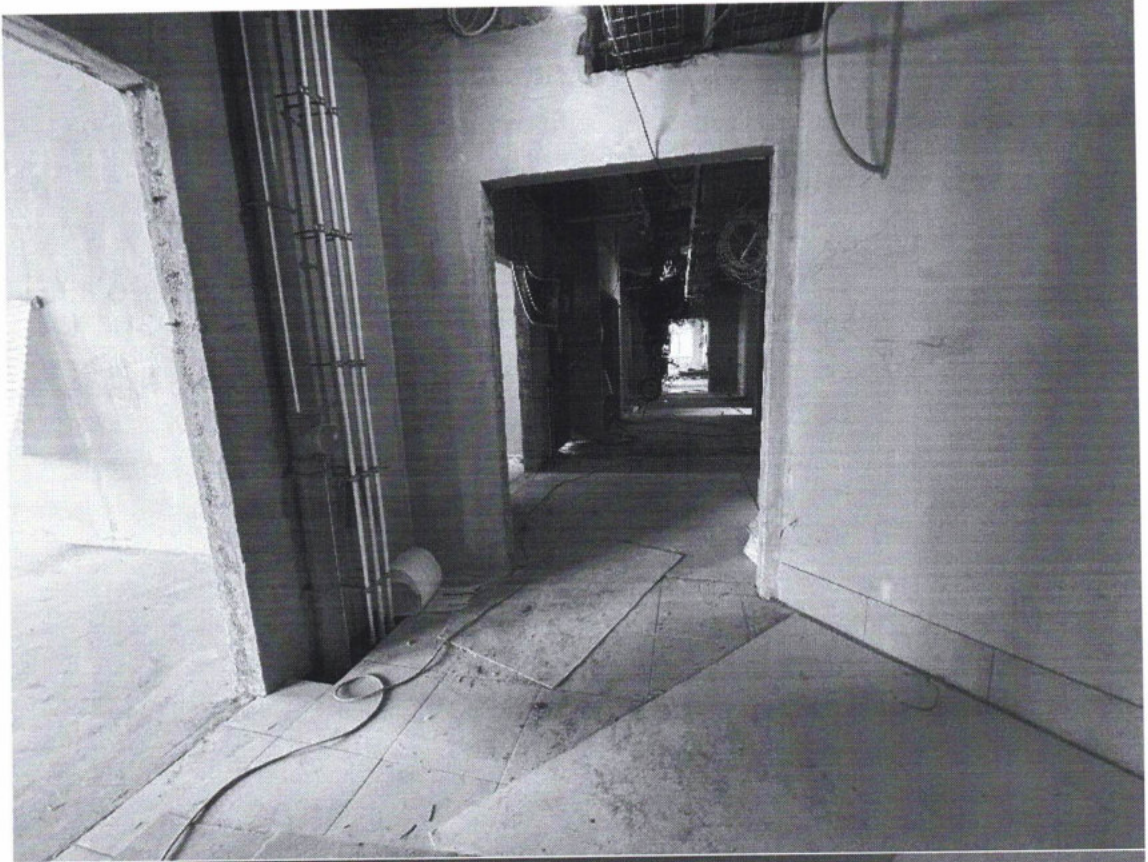

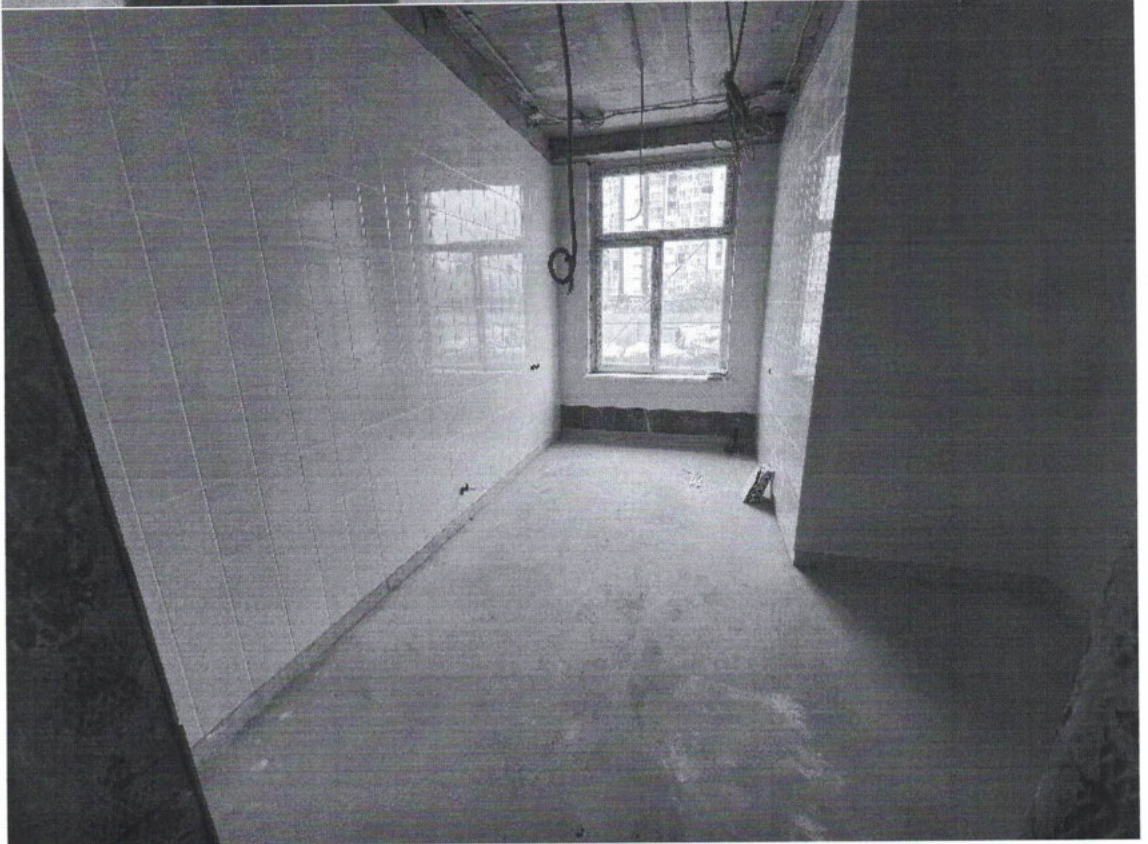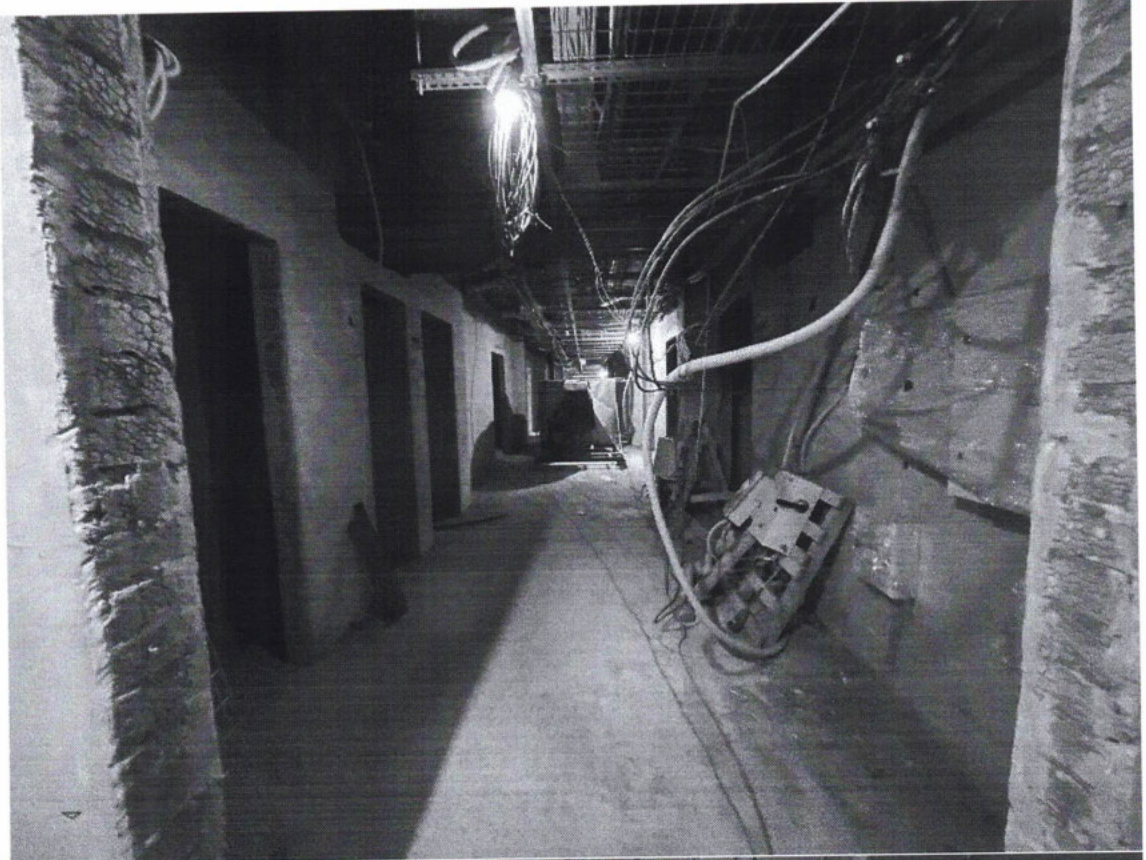


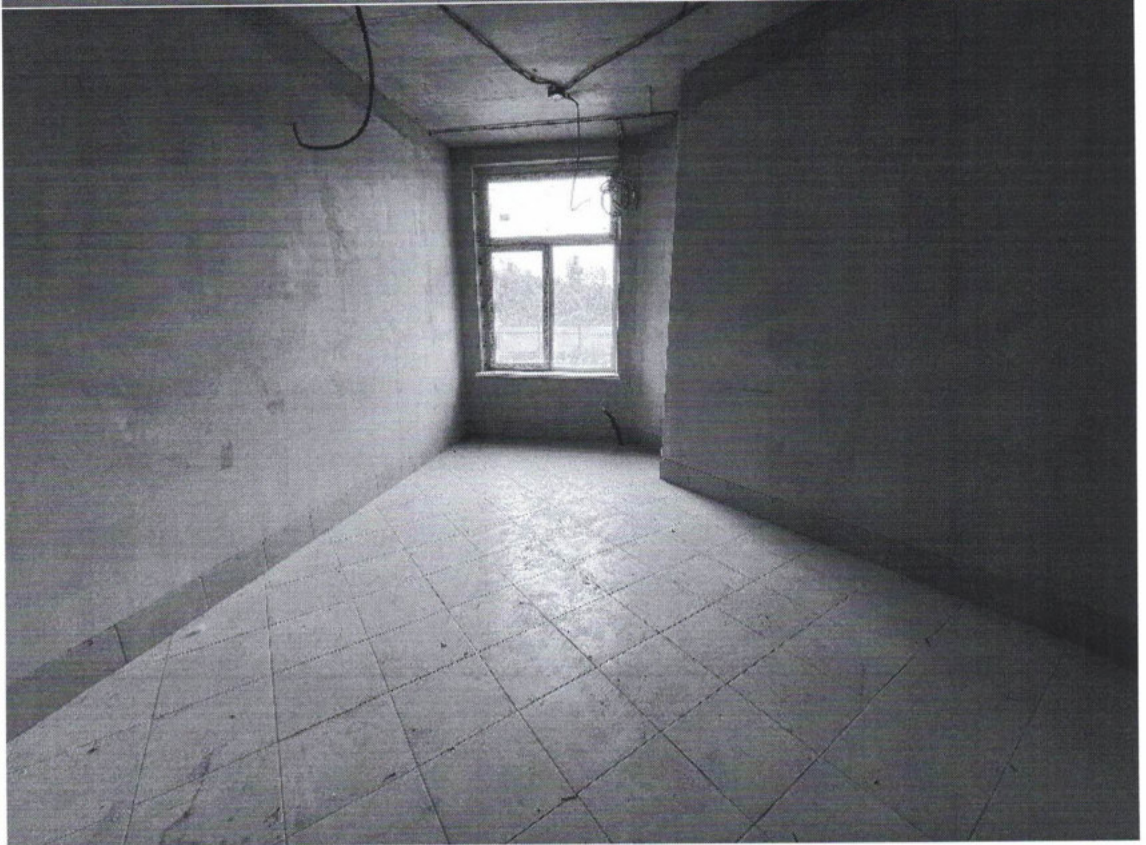
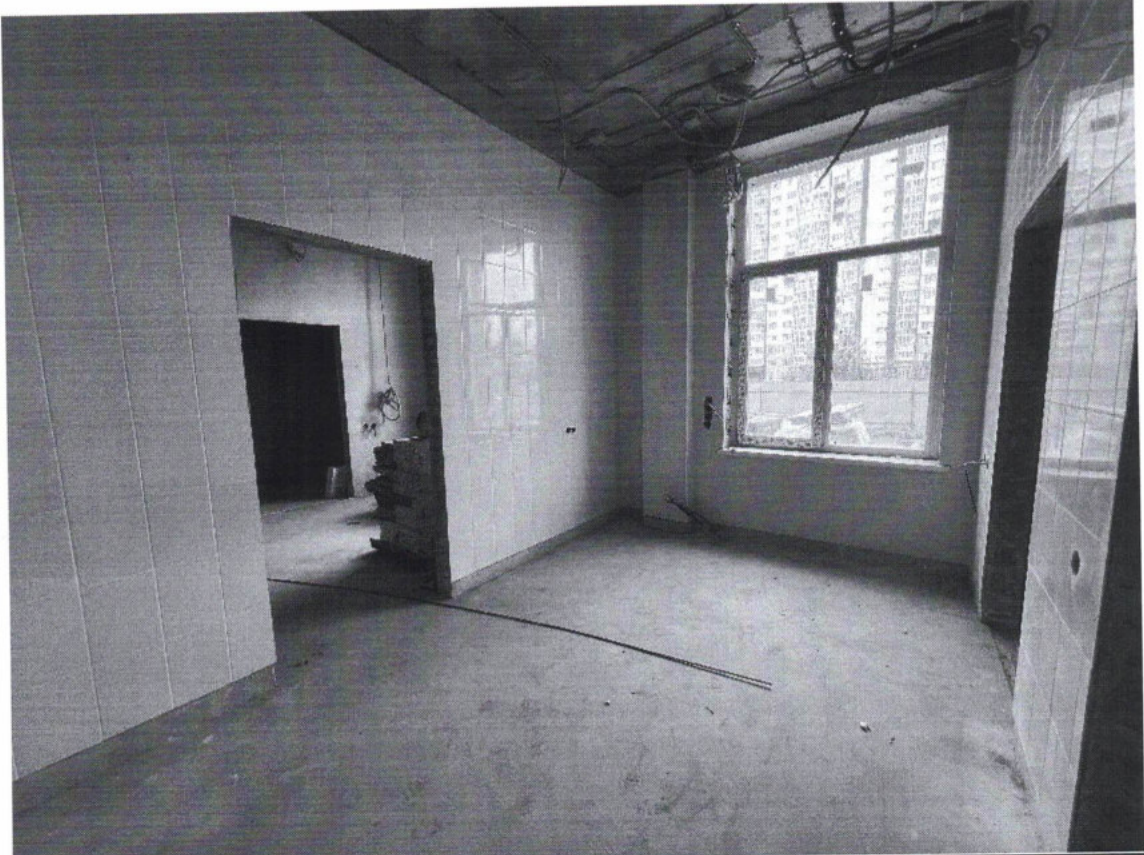



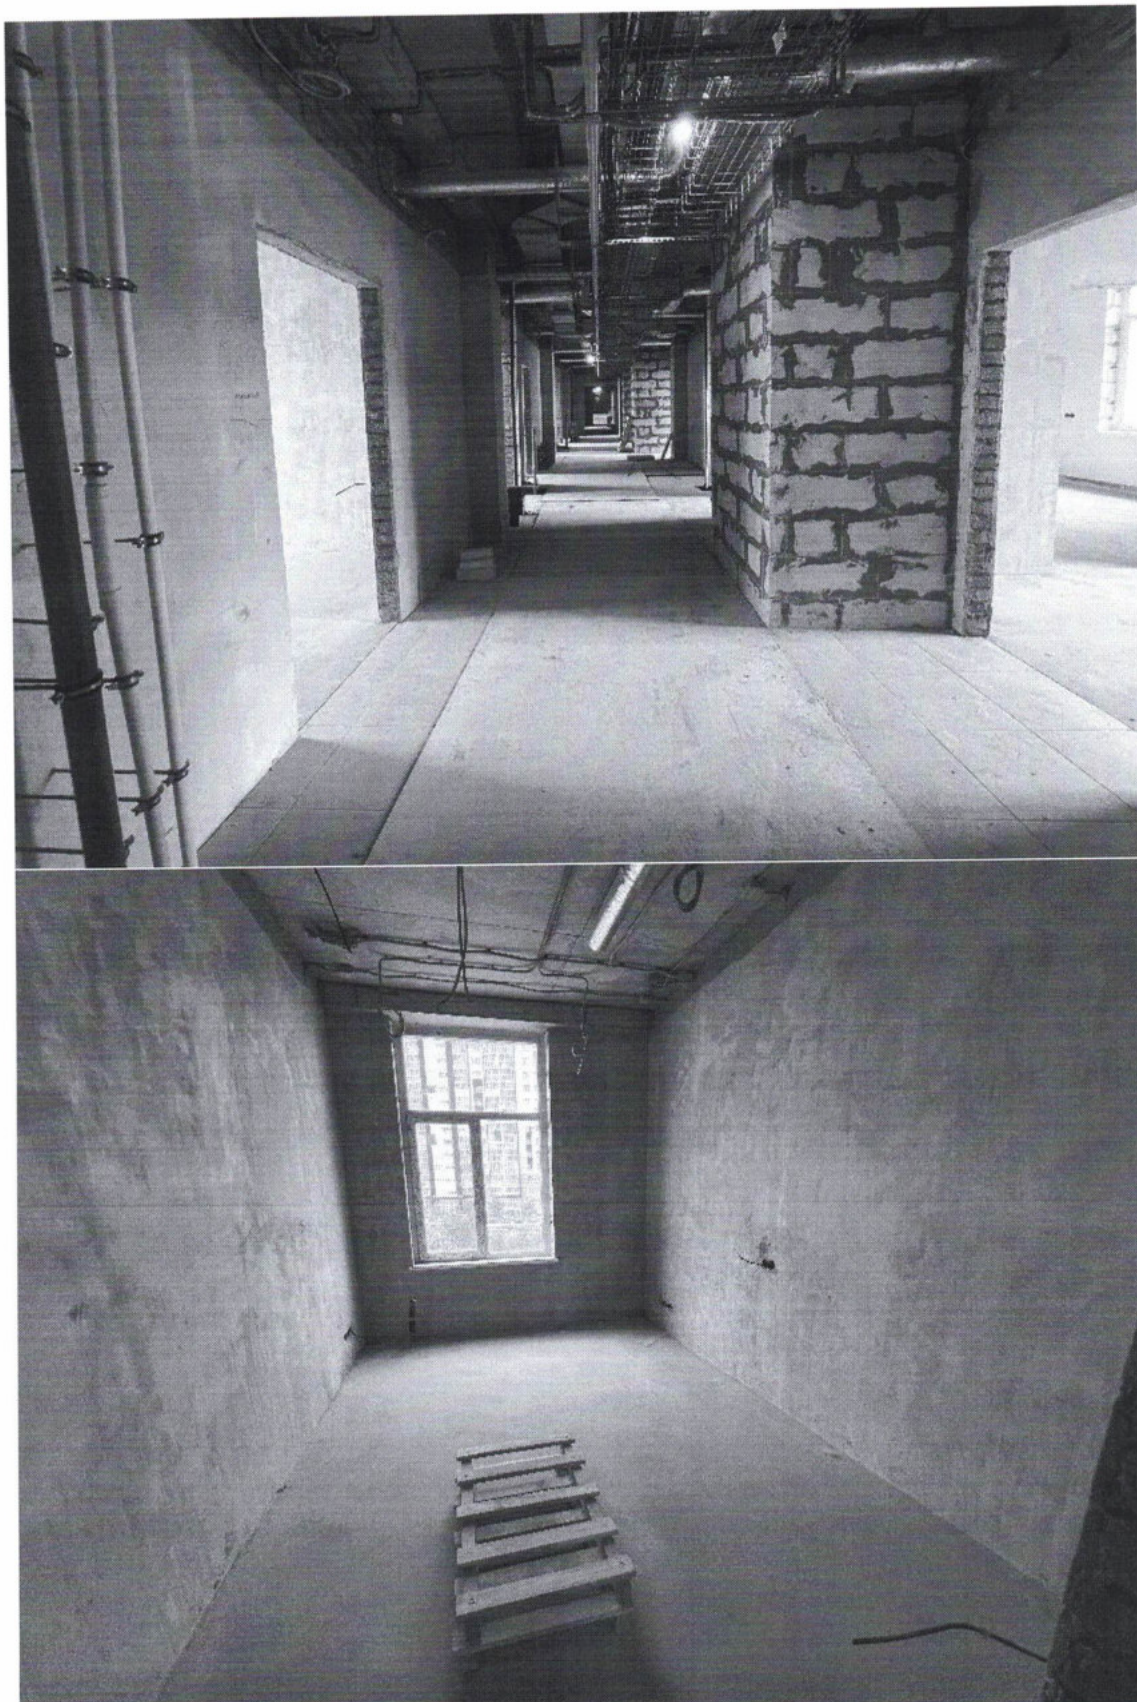



Элемент объекта соглашения № 4





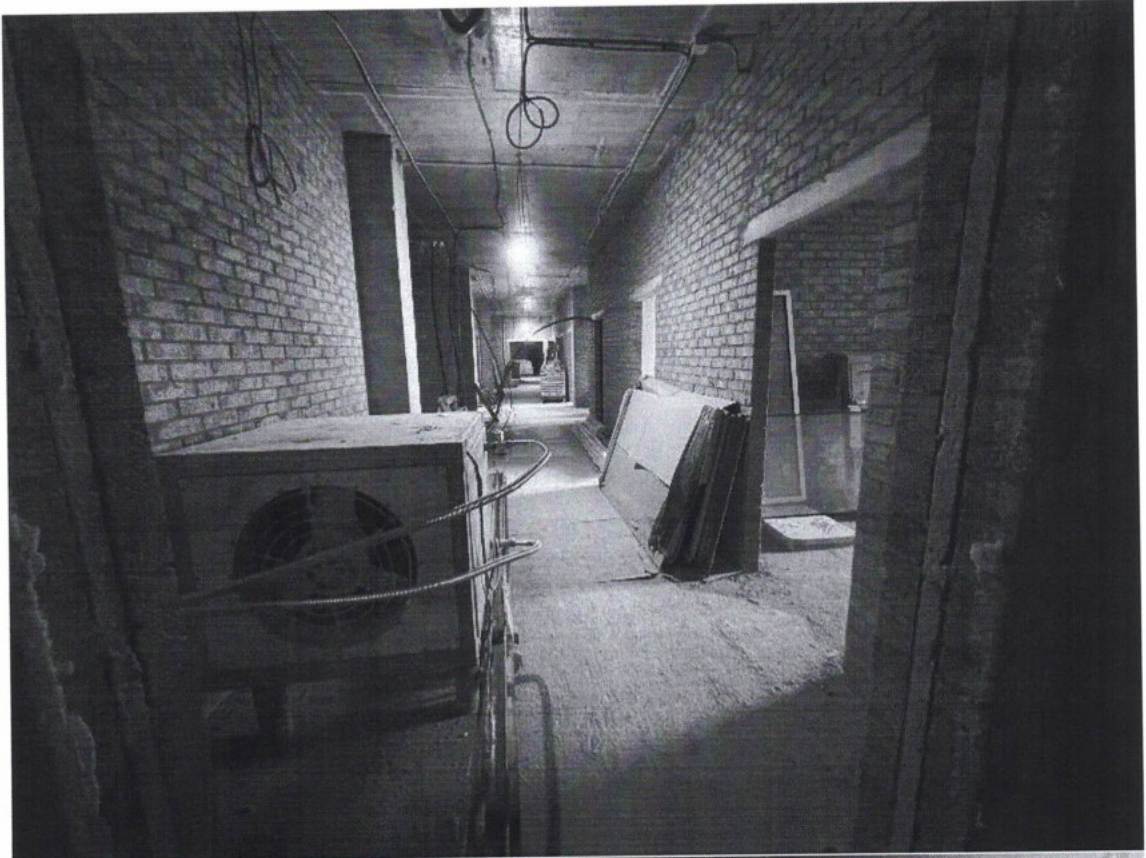

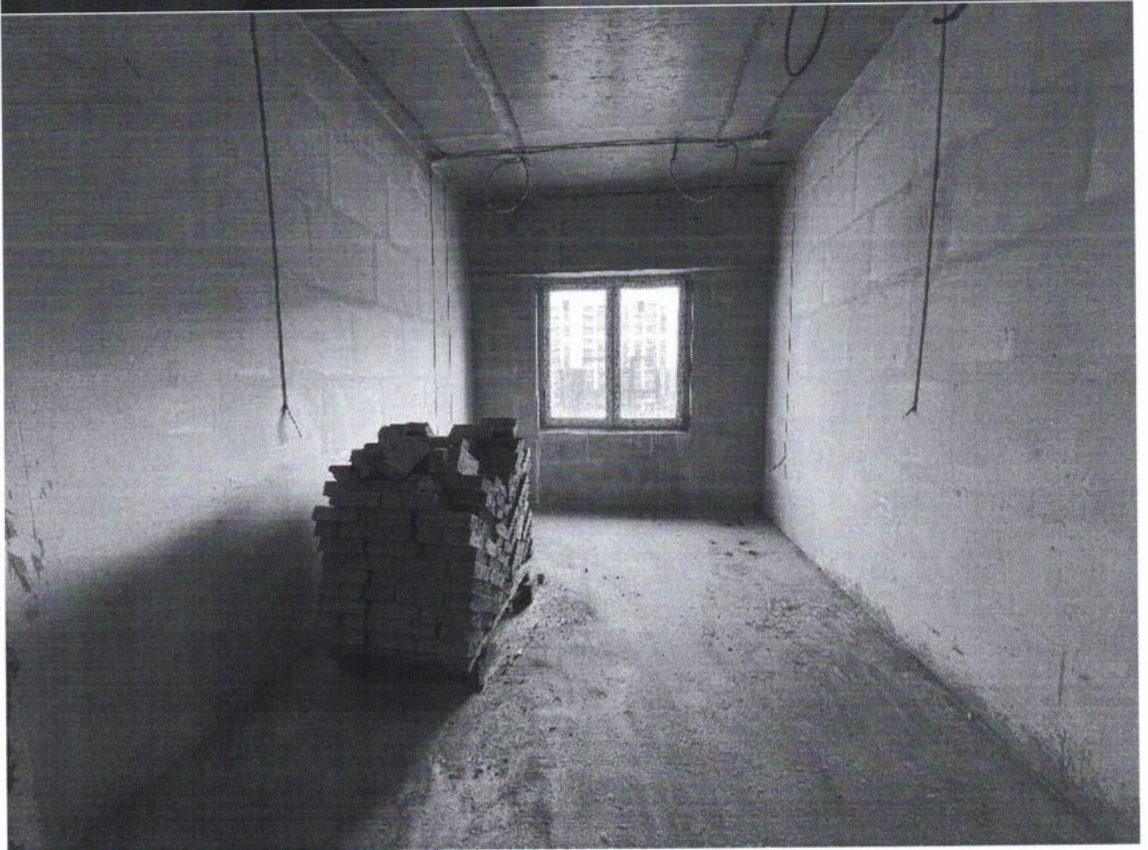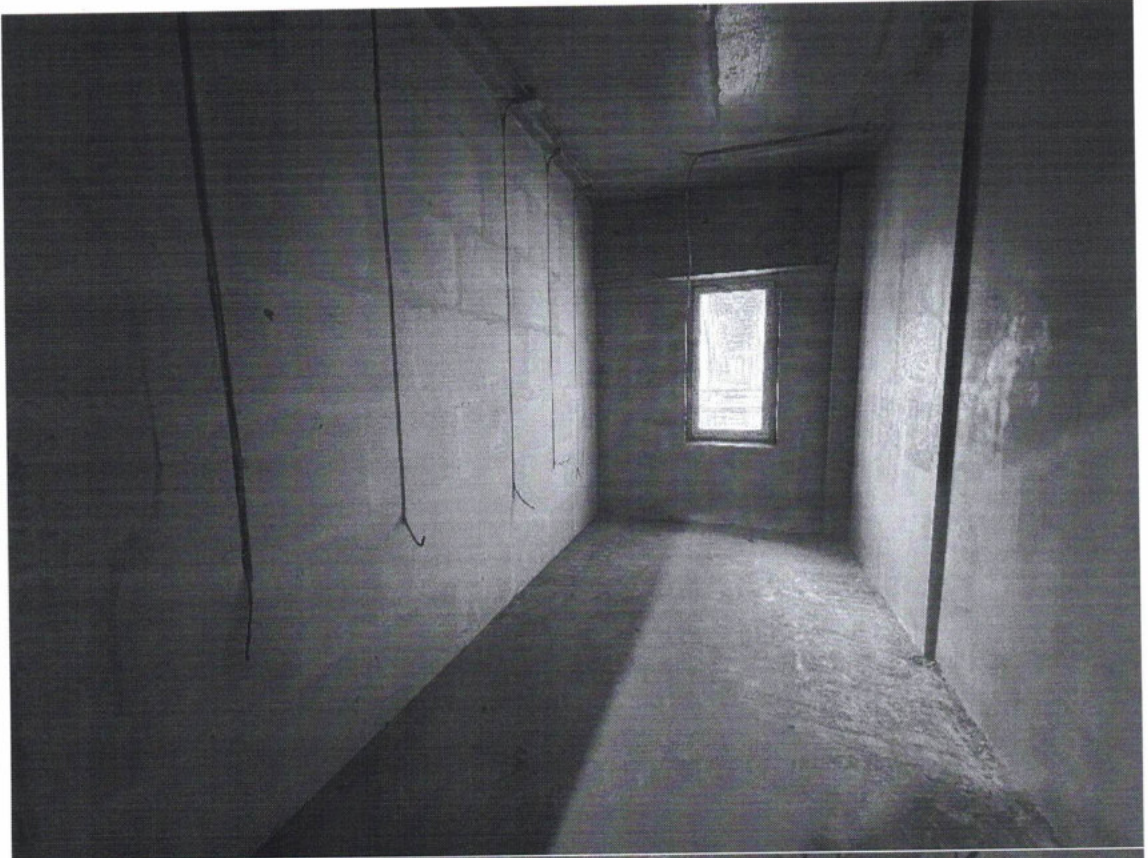

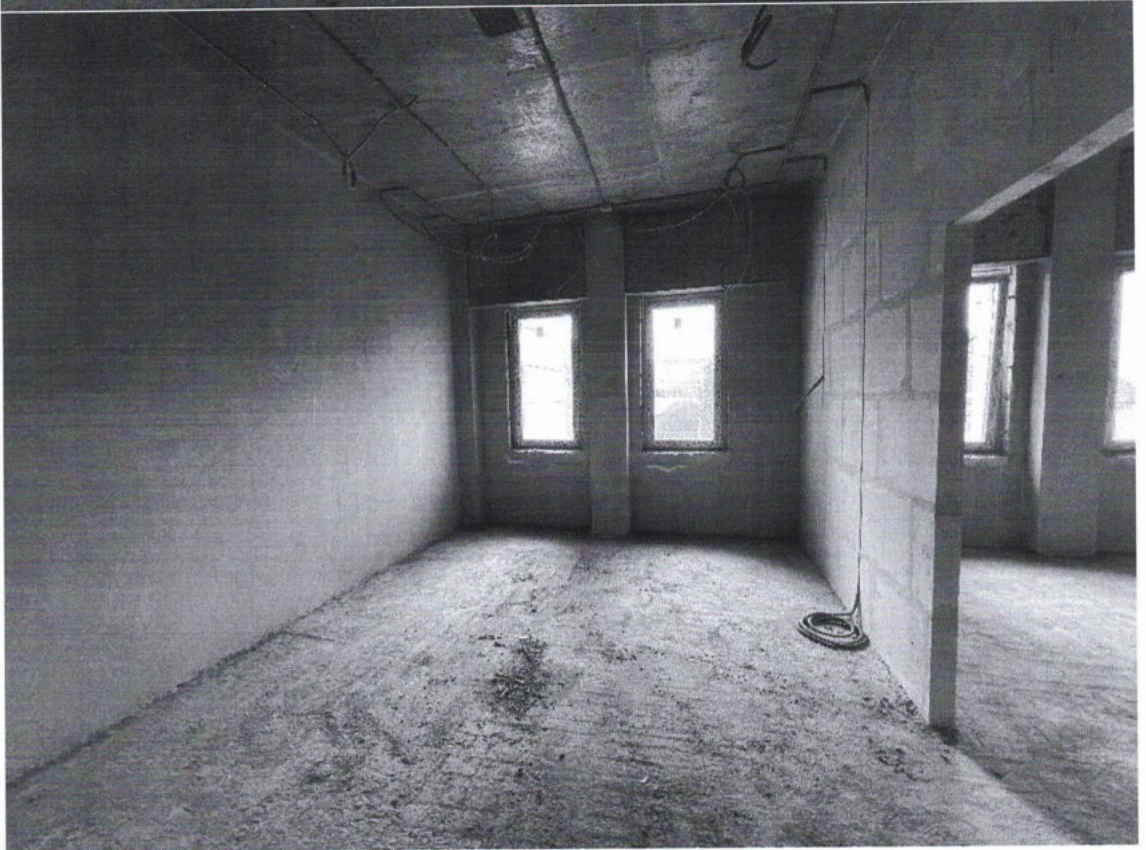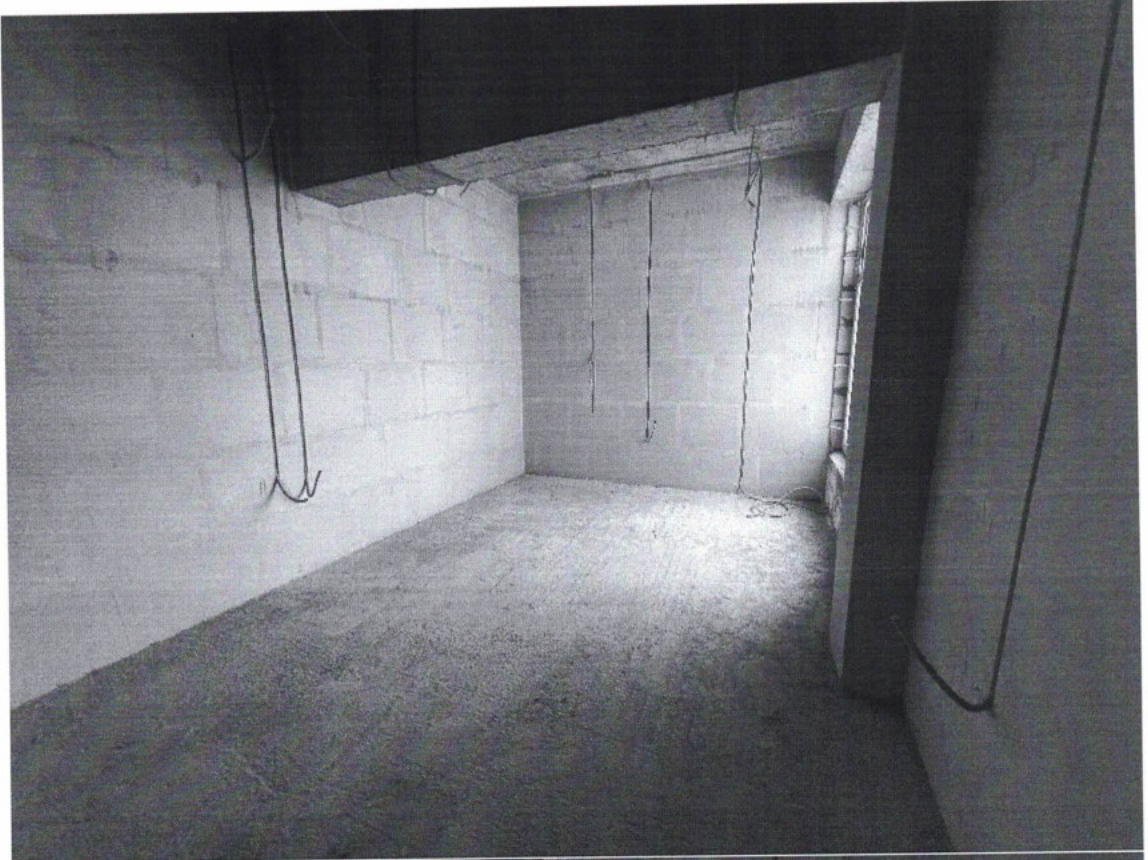

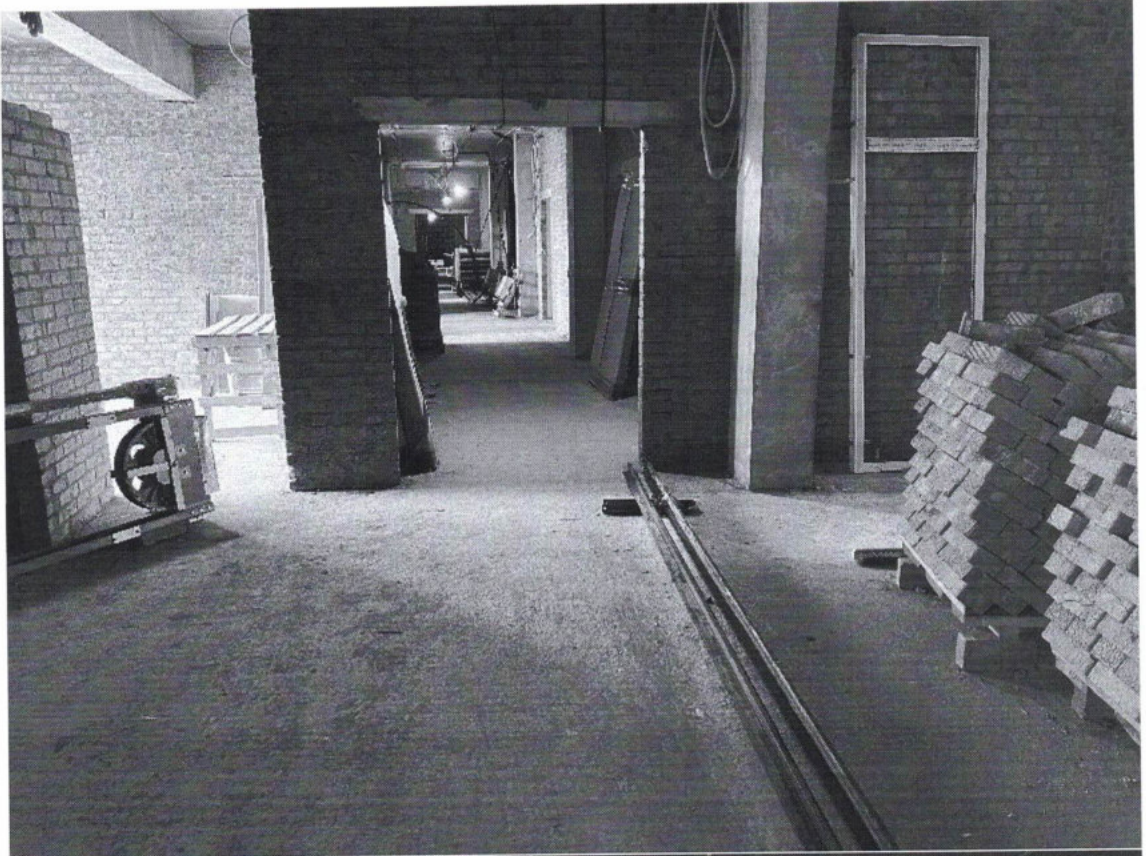

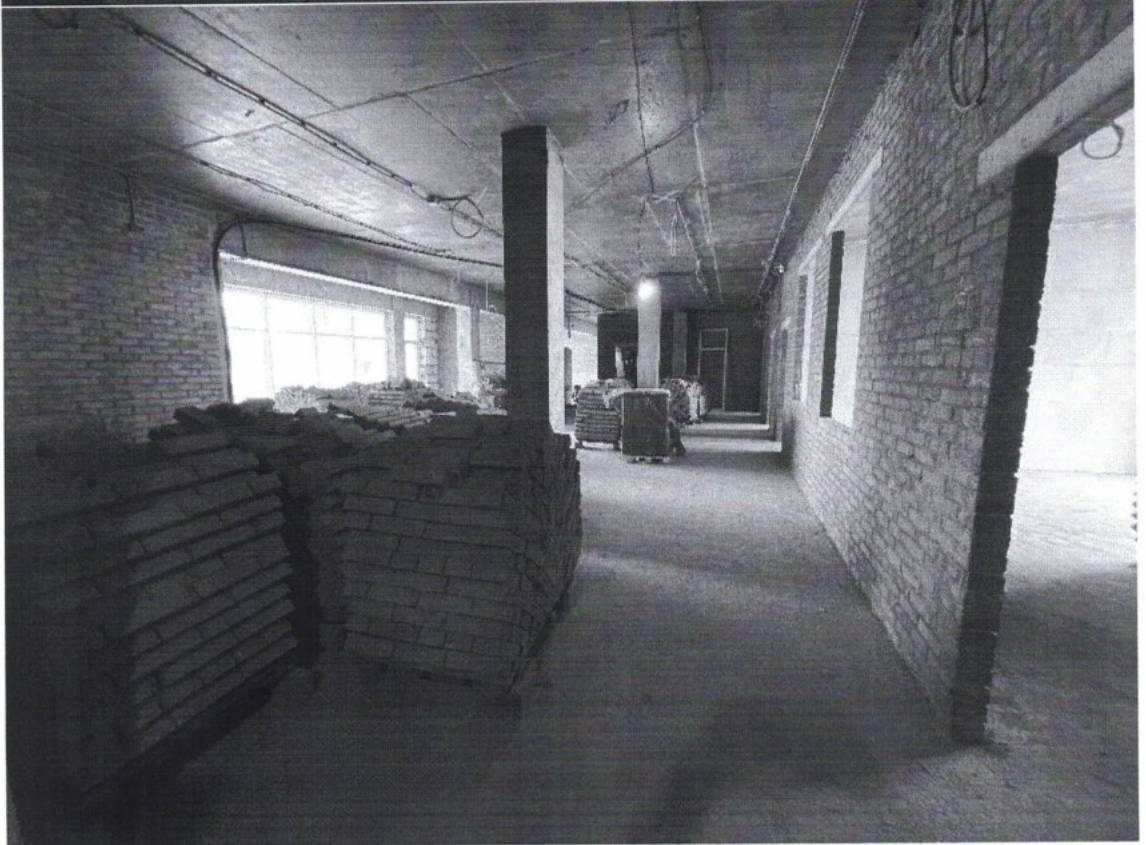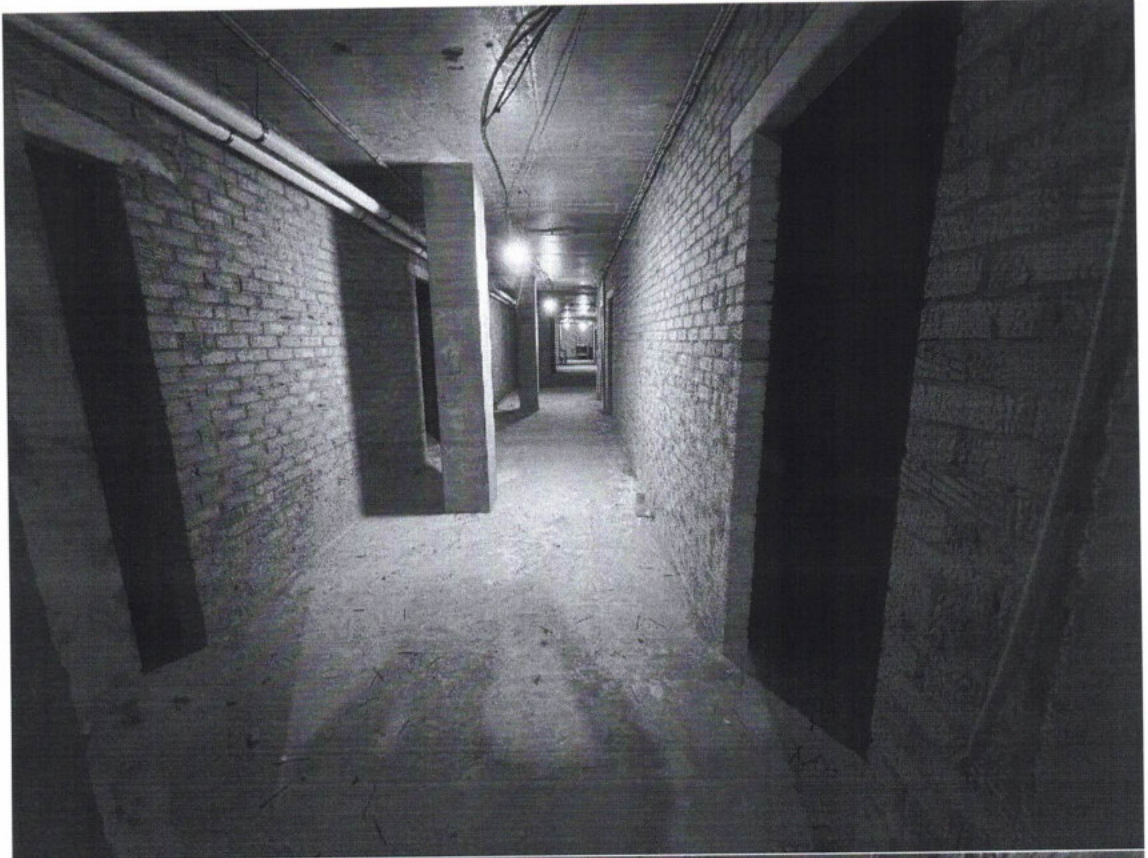

Элемент объекта соглашения № 5





Элемент объекта соглашения № 6









Элемент объекта соглашения № 7



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минздрав НСО)

Красный проспект, д.18,
г. Новосибирск, 630007
Тел.: (383) 238-63-68, факс: (383) 238-66-39
e-mail: Zdrav@nso.ru
<http://www.zdrav.nso.ru>

Генеральному директору
ООО «Национальный медицинский
холдинг» — управляющей организации
ООО «Седьмая концессионная
компания»

А.В. Козаренко

121096, г. Москва,
ул. В. Кожинной, д. 1, к. 1

02.08.2024 № 01-09/18714/24

На № _____ от _____

О направлении акта
о результатах контроля

Уважаемый Александр Вячеславович!

Между Новосибирской областью в лице министерства здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» заключено соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019 (далее — соглашение), во исполнение которого сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 24 Правил осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490, направляем экземпляр акта о результатах за исполнением соглашения во 2 квартале 2024 года.

Приложение: на 37 л. в 1 экз.

Министр

К.В. Хальзов

СПИСОК № 149 (Партия 46)
внутренних почтовых отправлений
от 02.08.2024
(дата)

Вид РПО: Бандероль
 Разряд: Без разряда
 Способ оплаты: - основной услуги марки безналичный расчет 300
 - уведомления о вручении марки безналичный расчет
 Способ пересылки: Наземный
 Отправитель: МИНЗДРАВ НСО e-mail: Vku@nso.ru
 ИНН/КПП: 5406635579 / 540601001 Договор №: 22/24-МР54

С услугой «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя РПО

9	1	3	9	0	0	3	2	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

«SMS-уведомление о вручении РПО» «SMS-уведомление о поступлении РПО в адресное ОПС»

Наименование и индекс места приема: ЦОЮЛ 630007

Всего отправлений: 1 Всего листов: 3 лист № 1

№ № п/п	Обозначение многоместного отправления	ШПИ (штриховой почтовый идентификатор)	Категория РПО	Фактическая масса, (кг.)	Доп. услуги: Тип	Сумма объявленной ценности, (руб.)	Сумма наложенного платежа, (руб.)	Сумма платы за пересылку (без доп. услуг), без НДС (руб.)	Сумма платы за пересылку (без доп. услуг), с НДС, (руб.)	Сумма платы за доп. услуги, без НДС, (руб.)	Сумма платы за доп. услуги, с НДС, (руб.)	Примечание
	Адресат (Ф.И.О.)			Объемный вес, (кг.)	уведомления							
	Почтовый адрес			Платный вес, (кг.)	Проверка соответствия вложения описи Ф.107							
	Номер почтомата, наименование населенного пункта, индекс ОПС, обслуживающий почтомат			Линейные размеры (ДхШхВ), (см.)	Надбавка за отметку 'Осторожно'							
	Номер мобильного телефона адресата	Внутренний номер клиента										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	- Генеральному директору ООО "Национальный медицинский холдинг" - управляющей организации ООО "Седьмая концессионная компания" 121096, ул Василисы Кожиной, д. 1 корп.1, г Москва	80083699828083 01-09/18714/ 24 К. В. Хальзов	Заказное	0.214		-	-	111.00	133.20	-	-	
Итого:						0.00	0.00	111.00	133.20	0.00	0.00	

Общее количество отправлений

1 (один)

(сумма цифрами и прописью)

Из них количество отправлений по категориям, а также сумма их платы за пересылку с учетом платы за объявленную ценность:

Заказное

(категория РПО)

1

(количество РПО цифрами)

Сумма платы за пересылку с НДС

133.20 (Сто тридцать три рубля 20 копеек)

(сумма цифрами и прописью)

Сумма платы за пересылку без НДС

111.00 (Сто одиннадцать рублей 00 копеек)

(сумма цифрами и прописью)

Отправитель: МИНЗДРАВ НСО

В т.ч. НДС 22.20 (Двадцать два рубля 20 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Плата за пересылку:

Общая сумма платы за пересылку с НДС 133.20 (Сто тридцать три рубля 20 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку без НДС 111.00 (Сто одиннадцать рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 22.20 (Двадцать два рубля 20 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма объявленной ценности всех РПО 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за объявленную ценность с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Итого за пересылку, с НДС 133.20 (Сто тридцать три рубля 20 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Итого за пересылку без НДС 111.00 (Сто одиннадцать рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 22.20 (Двадцать два рубля 20 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Дополнительные услуги:

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя с НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя без НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги без НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список без НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Всего к оплате:

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) с НДС 133.20 (Сто тридцать три рубля 20 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) без НДС 111.00 (Сто одиннадцать рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 22.20 (Двадцать два рубля 20 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

СПИСОК № 149 (Партия 46) Дата 02.08.2024 Лист № 3


Отправитель: МИНЗДРАВ НСО

Сдал:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)




Принял:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



(оттиск КПШ ОПС
места приема)

Отрывной талон

К СПИСКУ № 149 (Партия 46) Дата 02.08.2024

Отправитель: МИНЗДРАВ НСО

из один РПО, включенных в список, получено счетом в исправной упаковке _____
(кол-во цифрами и прописью) (кол-во цифрами и прописью)

Сдал:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)




Получил:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



(оттиск КПШ)
