

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019

31.10.2024, 10:00

630007, г. Новосибирск,
Красный проспект, 18,
министерство здравоохранения
Новосибирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», разделом 8 Соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019 (далее — Соглашение) и статьей 7 Приложения № 6 к Соглашению Публичным партнером был проведен контроль за исполнением Соглашения в 3 квартале 2024 года.

Публичный партнер¹ — министерство здравоохранения Новосибирской области, ИНН 5406635579.

Частный партнер — ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986.

Проверка проводилась в следующем составе:

– В.В. Моор — начальник отдела материально-технического обеспечения и развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области;

А.С. Татаров — начальник отдела контроля за строительством объектов капитального строительства управления сопровождения строительства министерства строительства Новосибирской области;²

– А.А. Большова — консультант отдела контроля за строительством объектов капитального строительства управления сопровождения строительства министерства строительства Новосибирской области;²

– А.И. Коваленко — консультант министерства здравоохранения Новосибирской области;

– К.В. Помогайбо — главный эксперт министерства здравоохранения Новосибирской области.

¹ Здесь и далее по тексту термины и определения с заглавной буквы приведены в значении, определенном в Соглашении, если не установлено иное.

² Участие представителя министерства строительства осуществлялось только в рамках выездного мероприятия.

Статус проверки: документарная, выездная, плановая.

Проверка была проведена с 14.10.2024 по 25.10.2024 по месту нахождения Публичного партнера и по месту нахождения Элементов объекта соглашения:

- Элемента объекта соглашения № 1 (г. Новосибирск, ул. Ереванская, кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:671);
- Элемента объекта соглашения № 2 (г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, кадастровый номер земельного участка 54:35:072255:50);
- Элемента объекта соглашения № 3 (г. Новосибирск, ул. Пролетарская, (259), кадастровый номер земельного участка 54:35:071935:602);
- Элемента объекта соглашения № 4 (г. Новосибирск, ул. Краснодарская, 6/5, кадастровый номер земельного участка 54:35:053645:214);
- Элемента объекта соглашения № 5 (г. Новосибирск, ул. Степная, 266, кадастровый номер земельного участка 54:35:062555:134);
- Элемента объекта соглашения № 6 (г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, 2/1, кадастровый номер земельного участка 54:35:051165:114);
- Элемента объекта соглашения № 7 (г. Новосибирск, пл. Райсовета, кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:207).

Период проведения контрольных мероприятий составил 12 дней.

Предметом проверки явилось: определение статуса готовности Объекта соглашения, действие разрешений на строительство, соблюдение графиков производства работ, ввод в эксплуатацию Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, осуществление Частным партнером технического обслуживания Элемента объекта соглашения № 3, контроль за исполнением иных условий по Соглашению.

За 3 квартал 2024 года была рассмотрена информация об исполнении обязательств Частного партнера по Соглашению (Соглашение, письма Частного партнера, письма Сторон Соглашения, отчет Частного партнера на инвестиционном этапе за 3 квартал 2024 года³ (далее — Квартальный отчет Частного партнера на Инвестиционном этапе), отчет Частного партнера на эксплуатационном этапе за 3 квартал 2024 года⁴ (далее — Квартальный отчет Частного партнера на Эксплуатационном этапе), результаты совместных межведомственных совещаний, пр.).

1. Статус исполнения Частным партнером условий Соглашения

Основные мероприятия	Предполагаемые сроки ⁵	Фактические сроки	Статус
Получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении Элементов объекта соглашения:			
В отношении Элемента объекта соглашения № 1	до 31.12.2023 (09.09.2024) ⁶	не исполнен	выдано предписание

³ Представлен письмом ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 768/СМК/2024 от 25.10.2024.

⁴ Представлен письмом ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 769/СМК/2024 от 25.10.2024.

⁵ В соответствии с дополнительным соглашением № 10 от 21.05.2024 к Соглашению.

Основные мероприятия	Предполагаемые сроки ⁵	Фактические сроки	Статус
В отношении Элемента объекта соглашения № 2	до 30.06.2023	04.09.2024	ведется Спор
В отношении Элемента объекта соглашения № 3	до 30.06.2023 (30.01.2024) ⁶	14.03.2024	срок не соблюден, проведен Спор ⁷
В отношении Элемента объекта соглашения № 4	до 31.12.2024	не наступил	–
В отношении Элемента объекта соглашения № 5	до 31.03.2025	не наступил	–
В отношении Элемента объекта соглашения № 6	до 31.12.2025	не наступил	–
В отношении Элемента объекта соглашения № 7	до 31.12.2025	не наступил	–
Дата приемки объекта	до 28.02.2026	не наступил	–

Строительство Объекта соглашения в соответствии с Проектной документацией, разработанной Частным партнером в полном объеме (исх. № 154/СМК/2021 от 28.04.2021, исх. № 394/СМК/2021 от 07.10.2021, исх. № 425/СМК/2021 от 18.11.2021, исх. № 427/СМК/2021 от 19.11.2021), получившей положительное заключение Государственной экспертизы (№ 54-1-1-3-034703-2021 от 30.06.2021, № 54-1-1-3-034749-2021 от 30.06.2021, № 54-1-1-3-045794-2021 от 13.08.2021, № 54-1-1-3-066801-2021 от 12.11.2021, № 54-1-1-3-057808-2021 от 07.10.2021, № 54-1-1-3-037067-2021 от 07.07.2021, № 54-1-1-3-066285-2021 от 11.11.2021).

В отчетном периоде действуют все разрешения на строительство в отношении всех Элементов объекта соглашения (№ 54-Ru54303000-98-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-96-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-97-2021 от 09.06.2021, № 54-Ru54303000-242-2021 от 01.12.2021, № 54-Ru54303000-230-2021 от 22.11.2021, № 54-Ru54303000-141-2021 от 16.07.2021, № 54-Ru54303000-244-2021 от 02.12.2021).

В отчетном квартале срок действия:

– разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 1 (клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27) в связи с истечением было продлено Частным партнером 21.08.2024;

– разрешения на строительство в отношении Элемента объекта соглашения № 6 (городская клиническая поликлиника № 22) в связи с истечением было продлено 13.08.2024.

Рабочая документация в соответствии с требованиями пункта 15.4 Соглашения представлена Публичному партнеру не в полном объеме.

В отчетном периоде в отношении элемента объекта соглашения № 2 (городской клинической поликлиники № 2) получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 04.09.2024 № 54-35-125-2024.

В отчетном периоде в отношении задержки получения Частным партнером Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 2 велось рассмотрение искового заявления Публичного партнера в Арбитражном суде Новосибирской области с требованием о взыскании Неустойки. Рассмотрение

⁶ Подробнее см. Особые обстоятельства.

⁷ У Частного партнера имеется возможность направить кассационную жалобу.

ведется в рамках дела № А45-17152/2024. За пределами отчетного периода суд первой инстанции удовлетворил требования Публичного партнера в полном объеме. На дату составления настоящего отчета решение Суда еще не вступило в законную силу.

В отчетном периоде в отношении задержки получения Частным партнером Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 3 велось рассмотрение искового заявления Публичного партнера в Арбитражном суде Новосибирской области с требованием о взыскании Неустойки. Рассмотрение ведется в рамках дела № А45-19627/2024. 23.08.2024 суд первой инстанции удовлетворил в полном объеме требования Публичного партнера в размере 8,6 млн рублей. За пределами отчетного периода Частным партнером указанное решение было обжаловано, однако Седьмой арбитражный апелляционный суд 24.10.2024 отказал в удовлетворении жалобы Частного партнера.

В ходе контрольных мероприятий был проведен анализ статуса исполнения Частным партнером обязательств по Строительству Объекта соглашения.

15.10.2024 совместно с представителями прокуратур Ленинского и Кировского районов города Новосибирска и представителями Публичного партнера был осуществлен выездной информационный осмотр Элемента объекта соглашения № 4 – 7.

16.10.2024 совместно с представителями прокуратур Октябрьского и Заельцовского районов города Новосибирска и представителями Публичного партнера был осуществлен выездной информационный осмотр Элемента объекта соглашения № 1 – 3.

Частным партнером были актуализированы графики производства работ (графики строительства) в отношении Элементов объекта соглашения №№ 4 – 7.

В соответствии с графиками производства работ (графиками строительства) по состоянию на 30.09.2024 строительная готовность оценочно должна составлять в отношении:

- Элемента объекта соглашения № 1 — 100%;
- Элемента объекта соглашения № 2 — 100%;
- Элемента объекта соглашения № 4 — 60%;
- Элемента объекта соглашения № 5 — 50%;
- Элемента объекта соглашения № 6 — 45%;
- Элемента объекта соглашения № 7 — 30%.

Согласно сведениям Частного партнера по состоянию на 02.10.2024,⁸ для Строительства Элементов объекта соглашения №№ 1, 4, 5, 6, 7 задействовано 132 рабочих и специалистов, 0 единиц строительной техники и механизмов. По сравнению со 2 кварталом 2024 года задействовано на 94 рабочих и специалистов больше (связано, в первую очередь, получением Частным партнером транша Финансирующей организации⁹, сменой части подрядных организаций Подрядчика). Вместе с тем, с 30.10.2023 происходит значительное увеличение размера ключевой ставки Банка России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России на Дату заключения соглашения, что является, по мнению Частного партнера, Особым

⁸ На основании письма ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 701/СМК/2024 от 02.10.2024.

⁹ Во 2 квартале 2024 года Финансирующей организацией одобрено выделение транша Частному партнеру в размере до 1 500 000 тыс. рублей. Средства Финансирующей организации получены частным партнером в июле 2024 года.

обстоятельством. За пределами отчетного периода Частным партнером направлено уведомление об Особом обстоятельстве, которое по состоянию составления настоящего Акта рассматривается Публичным партнером.

Степень строительной готовности Элементов объекта соглашения оценивается Частным партнером следующим образом:¹⁰

- в отношении Элемента объекта соглашения № 1 — 90,8%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 2 — 100,0% (введен в эксплуатацию 04.09.2024);
- в отношении Элемента объекта соглашения № 4 — 56,7%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 5 — 36,3%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 6 — 31,3%;
- в отношении Элемента объекта соглашения № 7 — 13,4%.

В ходе контрольных мероприятий зафиксировано отсутствие у Частного партнера Разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 1, в связи с чем в рамках текущего контрольного мероприятия Частному партнеру было вынесено Предписание об обеспечении получения разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении Элемента объекта соглашения № 1 в срок не позднее 18.12.2024.

В отношении Элементов объекта соглашения № №4, 5, 6 строительномонтажные работы не ведутся в недостаточной интенсивности, что влечет риск несвоевременного ввода указанных объектов капитального строительства в эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 15.4 соглашения частным партнером с 24.07.2023 не предоставлялся комплект Рабочей документации в отношении какого-либо Элемента объекта соглашения.

Вместе с тем, в отношении Элемента объекта соглашения № 4, Элемента объекта соглашения № 5, Элемента объекта соглашения № 6 в отчетном периоде МП «Метро Мир» не выполнены мероприятия по осуществлению технологического присоединения к централизованным сетям водоотведения (ливневой канализации), что может препятствовать исполнению Частным партнером пункта 17.3 Соглашения.

Стоит также отметить, что внутривозрадные сети водоотведения (ливневой канализации) Частным партнером в отношении Элемента объекта соглашения № 4, Элемента объекта соглашения № 5, Элемента объекта соглашения № 6 не выполнены.

По пояснениям Частного партнера, отставание от графиков строительства Элементов объекта соглашения связано с действием Особых обстоятельств, заявленных Частным партнером (но не оспоренных Публичным партнером только в отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 3), недостаточностью рабочей силы, низкой производительностью труда субподрядчиков, ограниченностью заемного финансирования.

В отчетном периоде Частным партнером осуществлялось устранение Недостатков в отношении Элемента объекта соглашения №№ 2, 3.¹¹

На Эксплуатационном этапе в отношении Элемента объекта соглашения

¹⁰ На основании письма ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 701/СМК/2024 от 02.10.2024.

¹¹ Представлены письмами министерства здравоохранения Новосибирской области от 01.12.2023 № 01-09/28868/24 и от 22.12.2023 № 01-09/30954/24 и от 05.07.2024 № 01-09/16474/24.

№№ 2, 3: в отчетном периоде мероприятия по Техническому обслуживанию не выполнялись ввиду отсутствия заключенных Договоров аренды элементов с Операторами по эксплуатации, Государственными органами в эксплуатационной части (за исключением контрольного мероприятия Публичного партнера) проверок не проводилось, Предписания, представления, штрафы и т.п. отсутствуют, фактов действия или бездействия любых лиц, которые могут нанести ущерб Элементу объекта соглашения №№ 2, 3 или иным образом препятствовать исполнению Соглашения не зафиксировано.¹² Однако Частным партнером выполняются мероприятия по содержанию Элементов объекта соглашения №№ 2, 3, в частности: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, и охрана объекта. Выплата Платежа за поддержание ТЭП из состава Возмещения в отчетном периоде не осуществлялась в связи с несоответствием, по мнению Публичного партнера, заявок требованиям Соглашения, в том числе отсутствием актуализированной Финансовой модели, переговоры между Сторонами Соглашения по формировании условий которой ведутся в период со 02.08.2024 по настоящее время.

2. Реализация иных мероприятий по Соглашению

В отчетном периоде сведений о фактах нецелевого использования Частным партнером Земельных участков не поступало. Визуальный осмотр Земельных участков фактов неправомерного использования Частным партнером Земельных участков не выявил. Договоры аренды земельных участков в отношении всех Земельных участков действительны. По сведениям департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, арендная плата за Земельные участки вносится своевременно, задолженность по арендной плате у Частного партнера отсутствует.

Требования пункта 7.1 Соглашения в отношении Банковской гарантии на этапе строительства Частным партнером соблюдены.

Выплаты Капитального гранта и (или) Возмещения Публичным партнером в отчетном периоде не осуществлялись.

В отчетном периоде между Сторонами возник Спор касательно выплаты Возмещения за 2 квартал 2024 года. По результату Спора определена неоспариваемая часть Возмещения, подлежащая выплате.

Расходование средств Капитального гранта осуществлялось Частным партнером в отчетном периоде следующим образом (в тыс. рублях).¹³

Наименование Элемента объекта соглашения	Проектные работы	Строительно-монтажные работы	Дополнительное оборудование	Прочее	ВСЕГО
Элемент объекта соглашения № 1	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97
Элемент объекта соглашения № 2	0,00	0,00	0,00	10,81	10,81
Элемент объекта соглашения № 3	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67
Элемент объекта соглашения № 4	0,00	0,00	0,00	10,55	10,55

¹² На основании информации, представленной Частным партнером в Квартальном отчете Частного партнера на Эксплуатационном этапе.

¹³ На основании информации, представленной Частным партнером письмом ООО «Седьмая концессионная компания» от 07.10.2024 исх. № 713/СМК/2024.

Наименование Элемента объекта соглашения	Проектные работы	Строительно-монтажные работы	Дополнительное оборудование	Прочее	ВСЕГО
Элемент объекта соглашения № 5	0,00	0,00	0,00	17,46	17,46
Элемент объекта соглашения № 6	0,00	0,00	0,00	13,43	13,43
Элемент объекта соглашения № 7	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77
ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	79,66	79,66

Согласно сведениям, предоставленным Частным партнером, по итогам 3 квартала 2024 года приняты к учету работы на общую сумму 30 282,81 тыс. рублей с НДС (в соответствии с Квартальным отчетом Частного партнера на Инвестиционном этапе):

- по Элементу объекта соглашения № 1 на сумму 18 626,87 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 2 на сумму 241,55 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 3 на сумму 252,35 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 4 на сумму 267,47 тыс. рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 5 на сумму 10 894,57 рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 6 на сумму 0,00 рублей с НДС;
- по Элементу объекта соглашения № 7 на сумму 0,00 рублей с НДС.

Источником финансирования являются средства Капитального гранта, средства Заемного финансирования.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» объем средств, предусмотренный для реализации Соглашения, является достаточным для исполнения обязательств Публичного партнера по Соглашению в 2024 году.

Значения критериев эффективности проекта и показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа сохраняют свою неотрицательность.

Особые обстоятельства:

В отчетном периоде Частным партнером заявлены и (или) действовали Особые обстоятельства по Соглашению, которые рассматривались (рассмотрены) Публичным партнером:

Положение Соглашение	Суть Особого обстоятельства	Реквизиты сообщения, уведомления Частного партнера	Результат рассмотрения Публичным партнером
Подпункт (о) пункта 38.2	Невыплата Возмещения	Сообщение: письмо ООО «Седьмая концессионная компания» исх. № 640/СМК/2024 от 05.09.2024 Уведомление: представлено не было	Не рассмотрено ввиду отсутствия уведомления об особом обстоятельстве


Заключение:


Частным партнером выполняются обязательства по исполнению Соглашения, в части строительно-монтажных работ в отношении Элементов объекта соглашения №№ 1, 2, 4. Разрешения на строительство, полученные Частным партнером, действительны в отношении всех Элементов объекта соглашения, находящихся в стадии строительства. В целях выполнения сроков по вводу в эксплуатацию

Элементов объекта соглашения Частному партнеру рекомендуется увеличить количество рабочих и специалистов, синхронизировать выполнение работ. По факту задержки получения Частным партнером разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 2 между Сторонами Соглашения в судебном порядке ведется рассмотрение Спора. По факту задержки получения Частным партнером разрешения на ввод в эксплуатацию Элемента объекта соглашения № 3 в пользу Публичного партнера присуждена Неустойка в размере 8,6 млн рублей.

Частному партнеру в целях ввода элементов объекта соглашения в эксплуатацию рекомендуется обеспечить выполнение мероприятий по устранению нарушений в отношении Элемента объекта соглашения № 1, элемента объекта соглашения № 4, элемента объекта соглашения № 5, элемента объекта соглашения № 6, элемента объекта соглашения № 7, выявленных инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области в ходе мероприятий регионального государственного строительного надзора.


От Публичного партнера:


_____/В.В. Моор/


_____/К.В. Помогайбо/


_____/А.А. Большова/


_____/А.И. Коваленко/




_____/А.С. Татаров/



От Частного партнера:



_____/_____/

Дата ознакомления: ____ . ____ . 2024



Приложение к акту
о результатах контроля

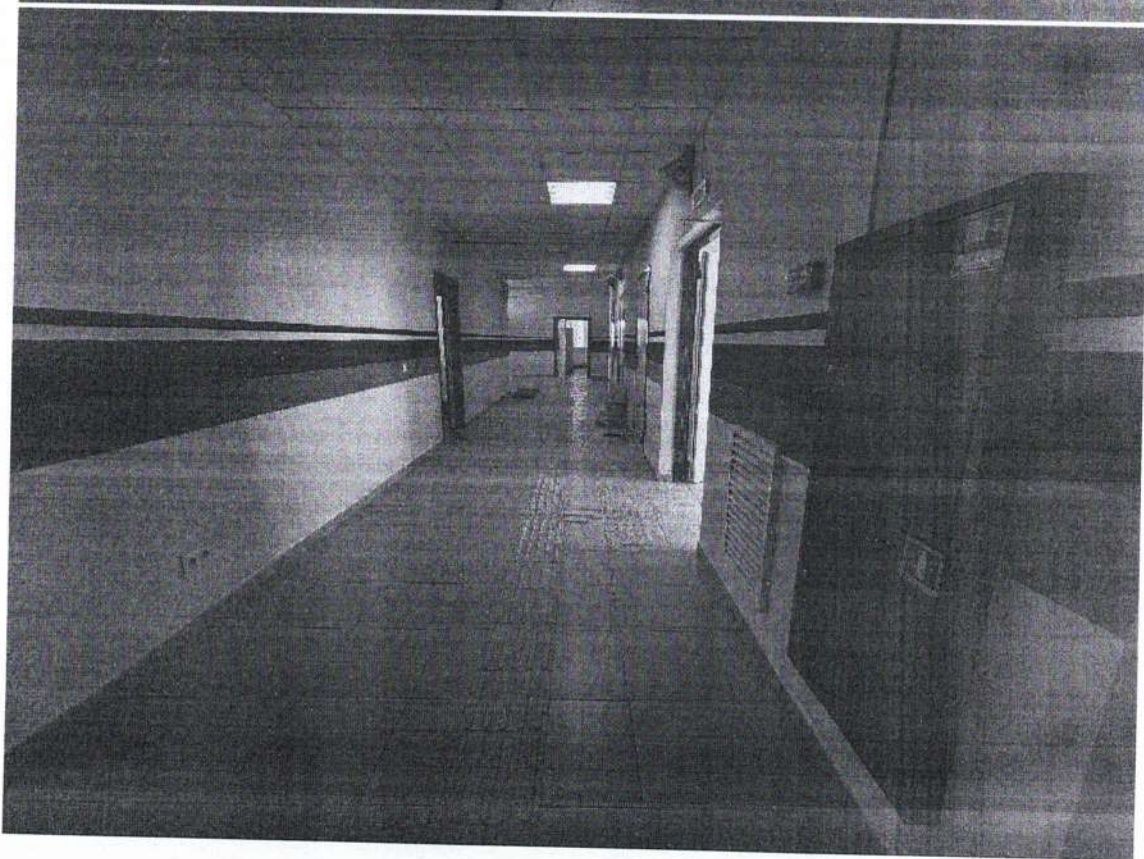
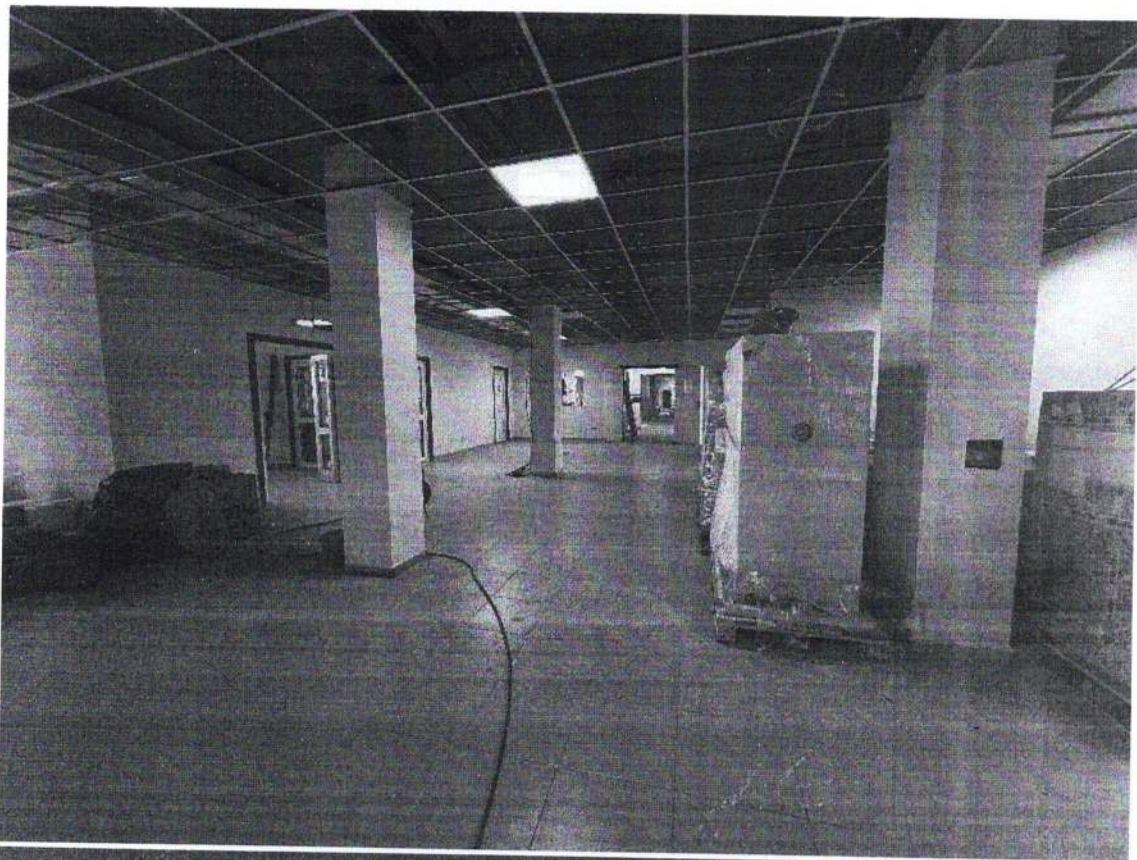


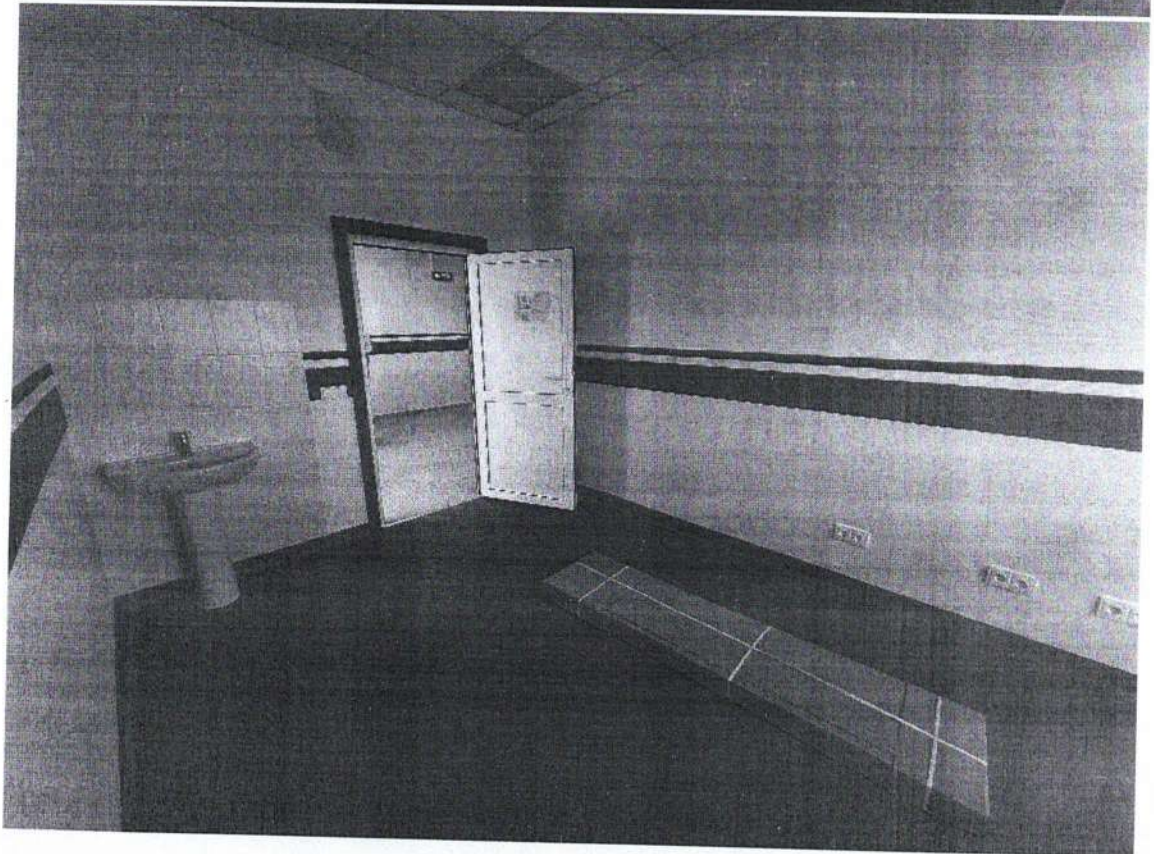
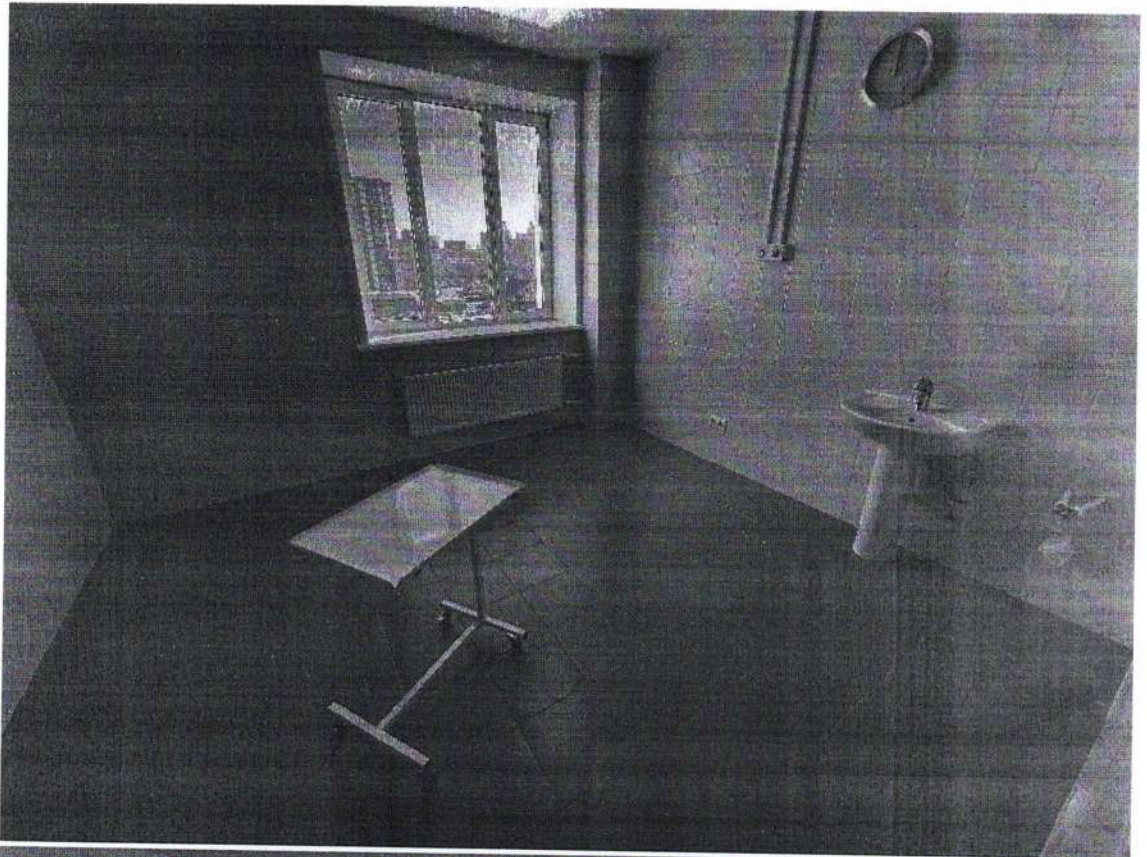


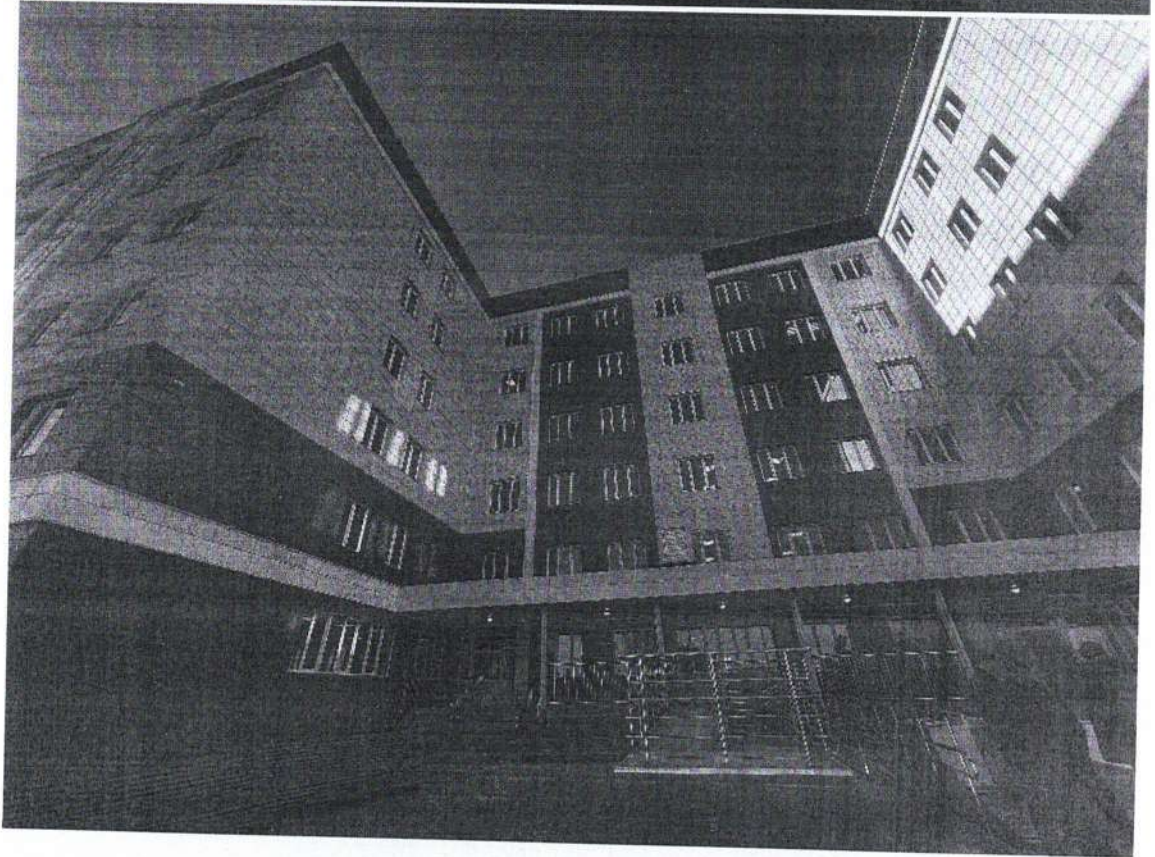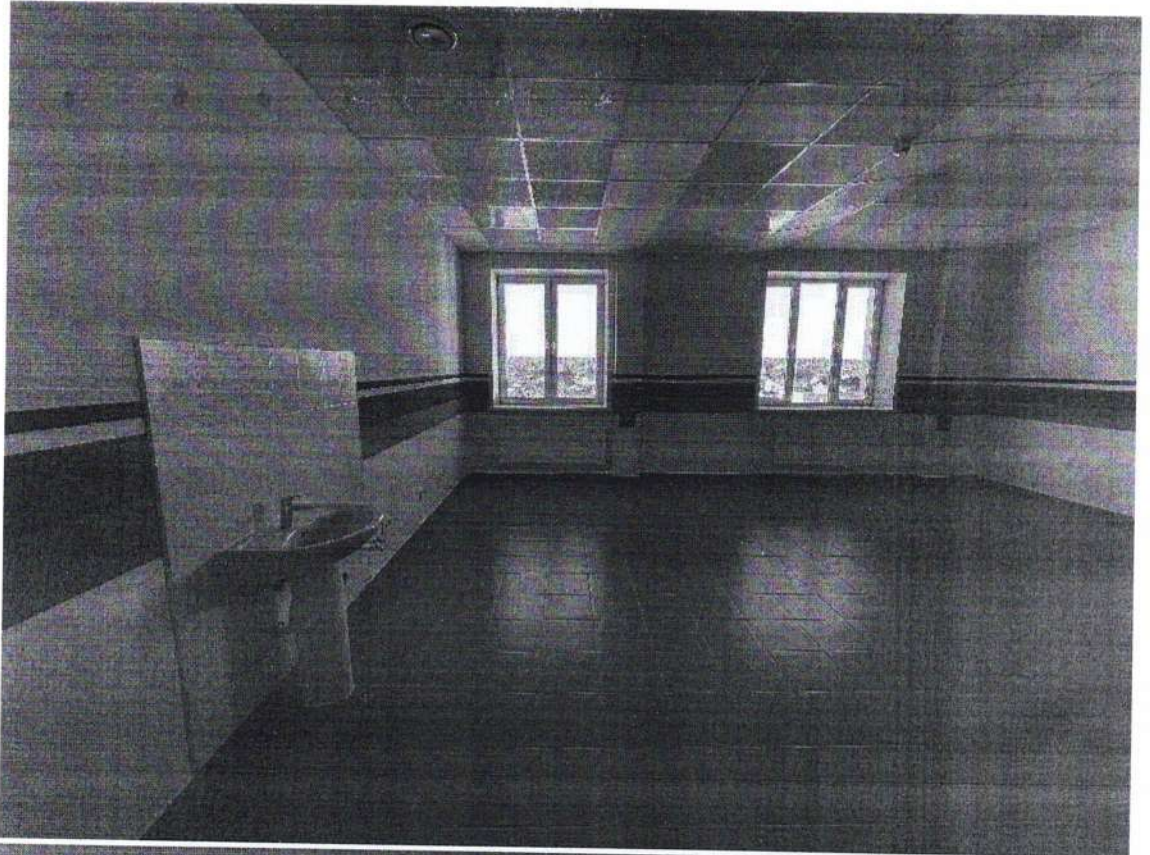



Элемент объекта соглашения № 1

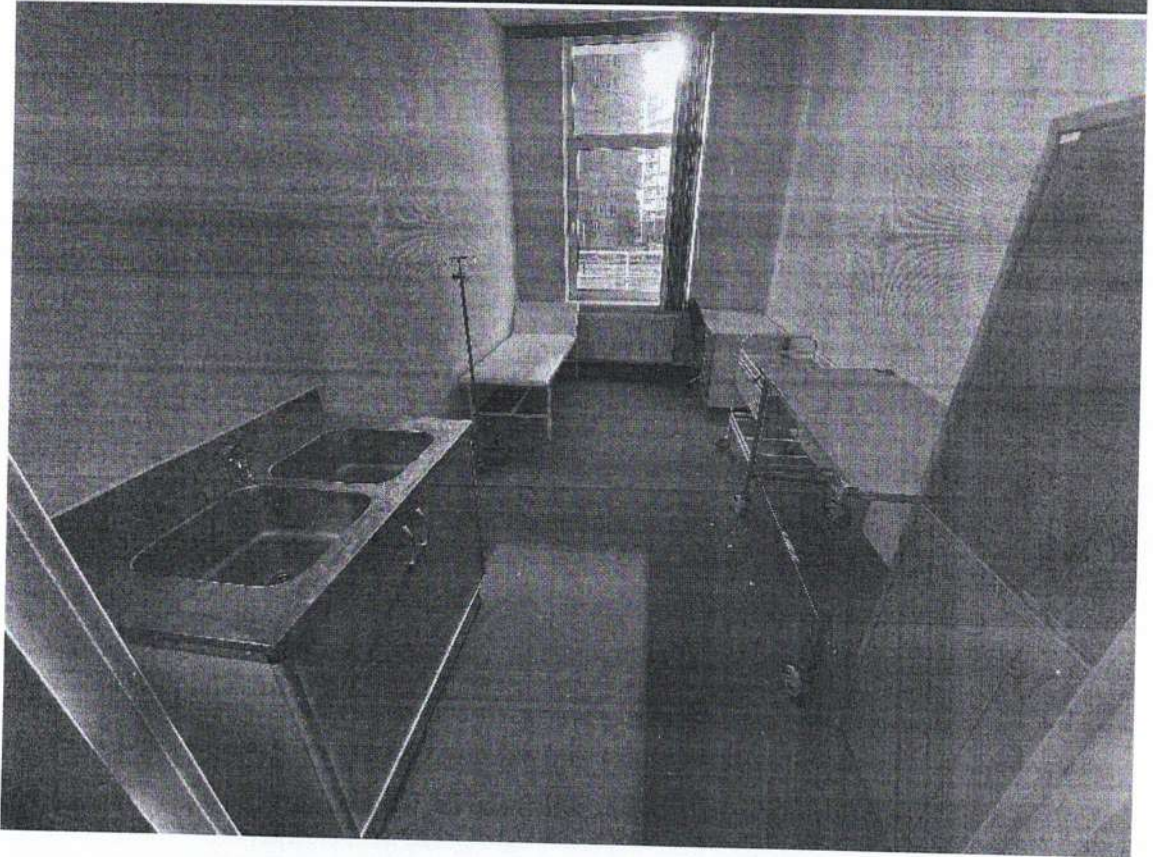
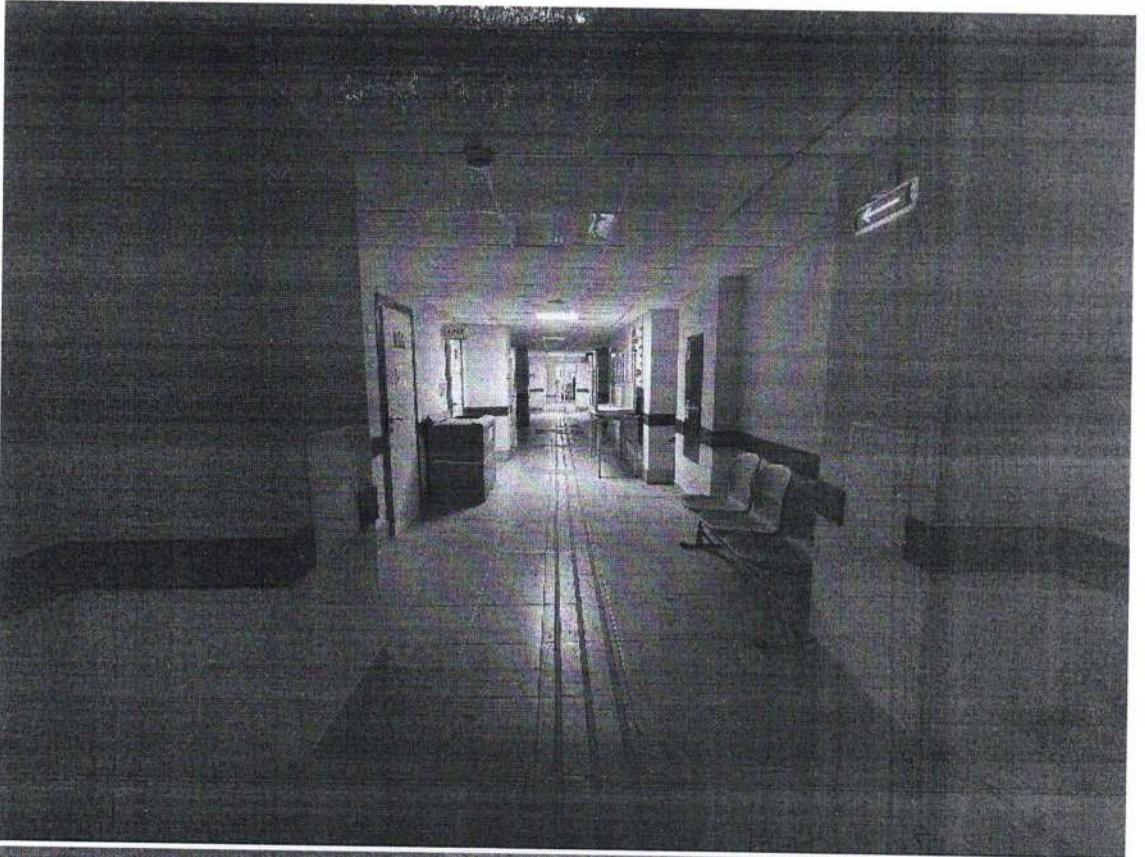


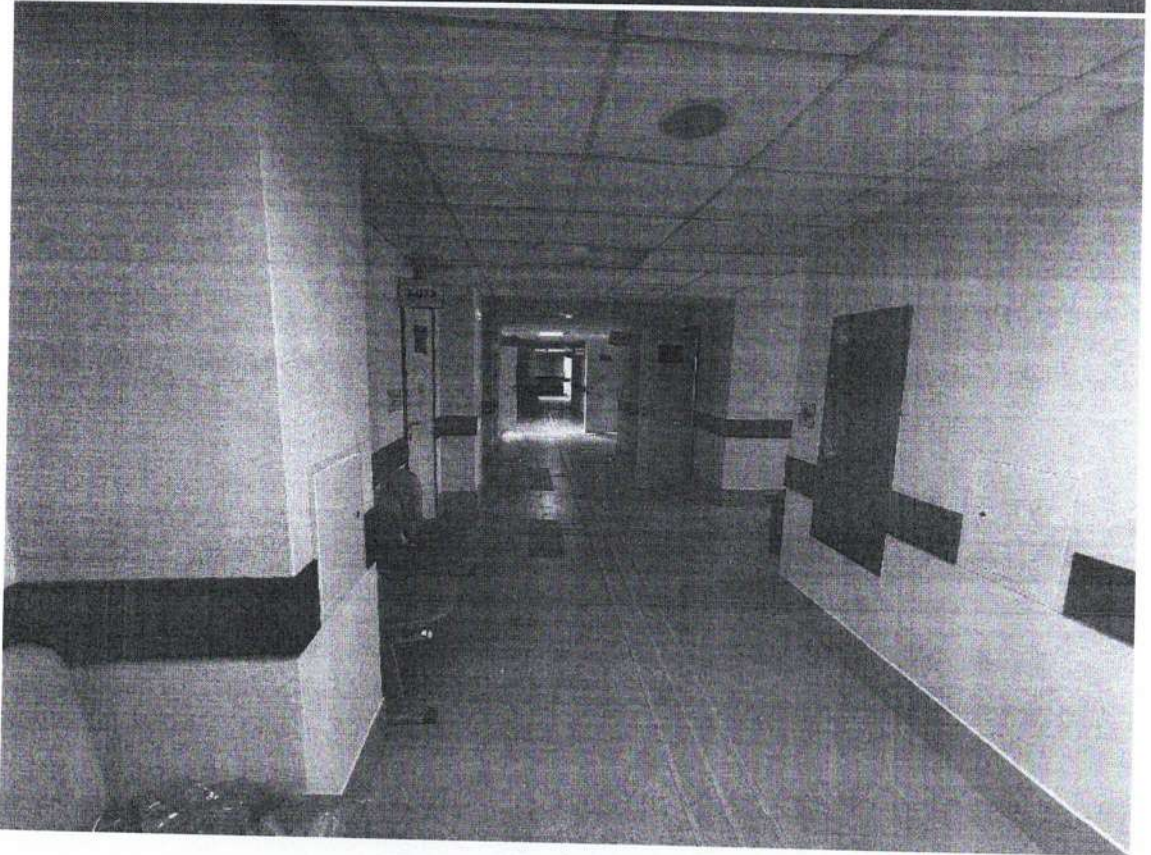
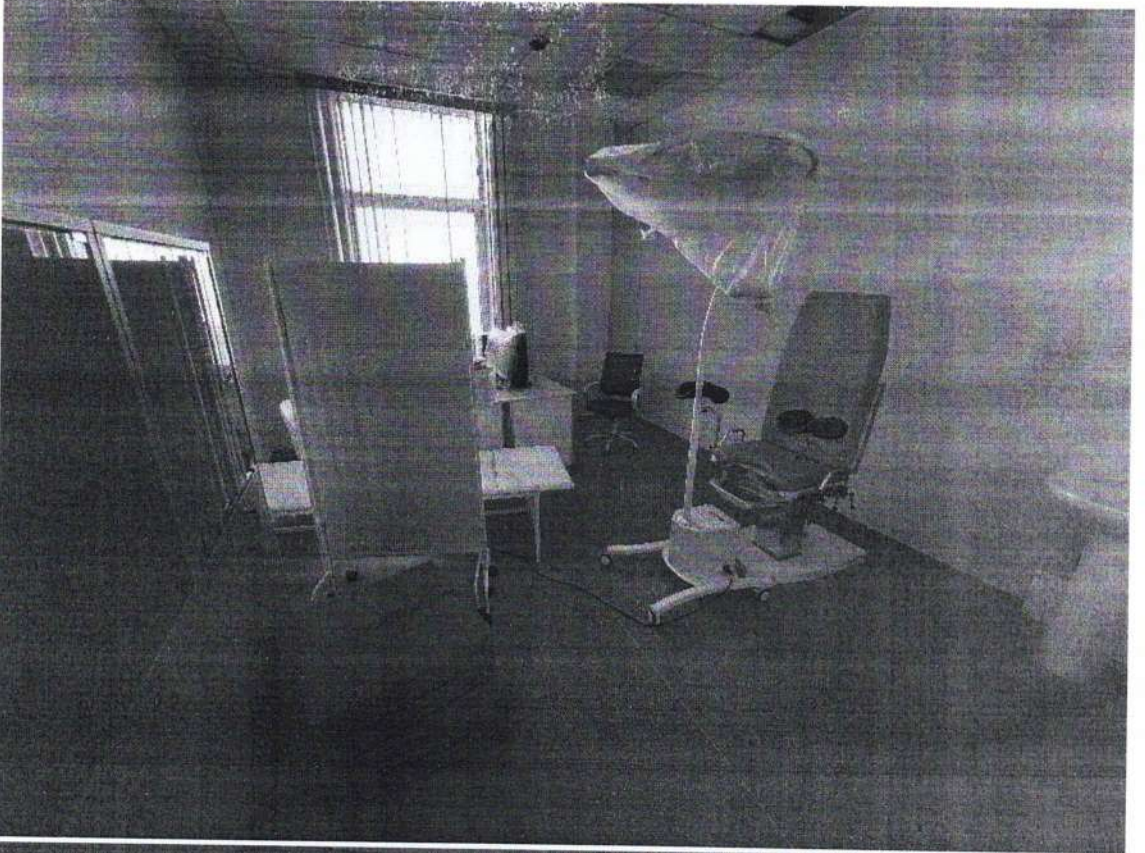


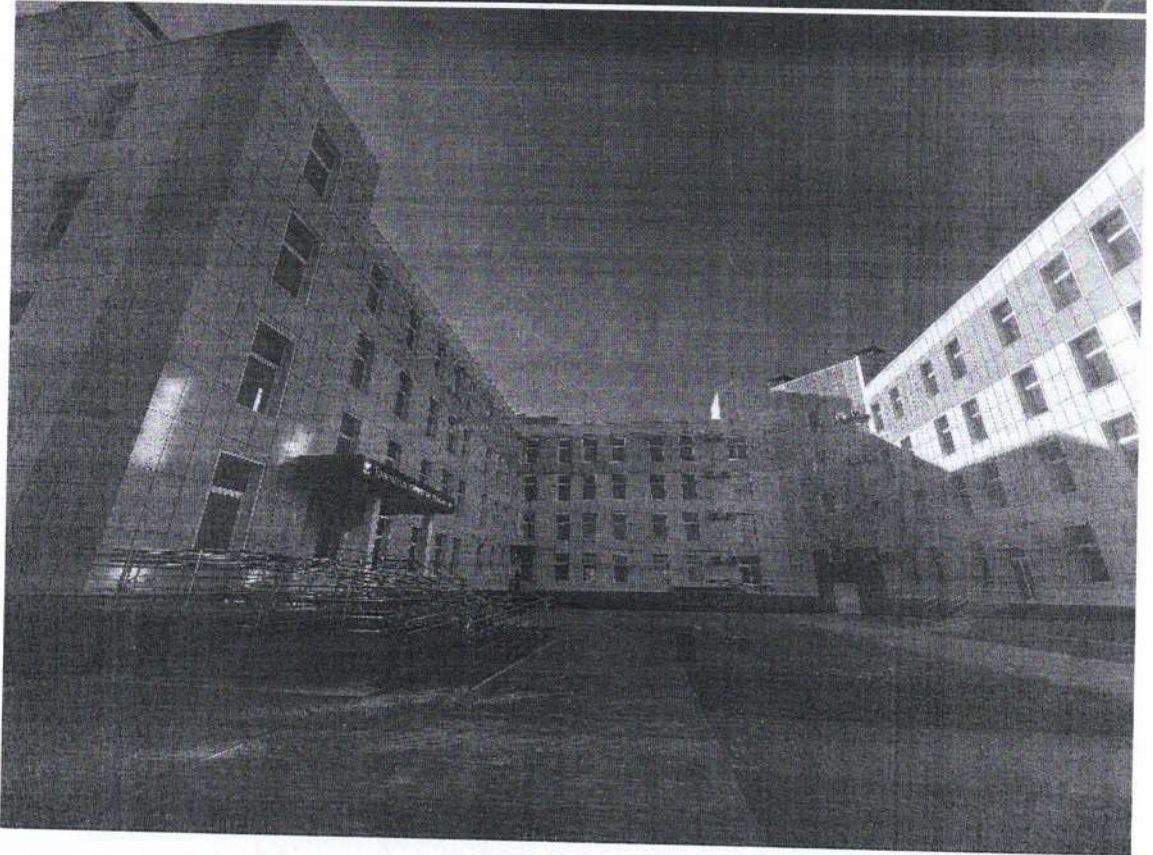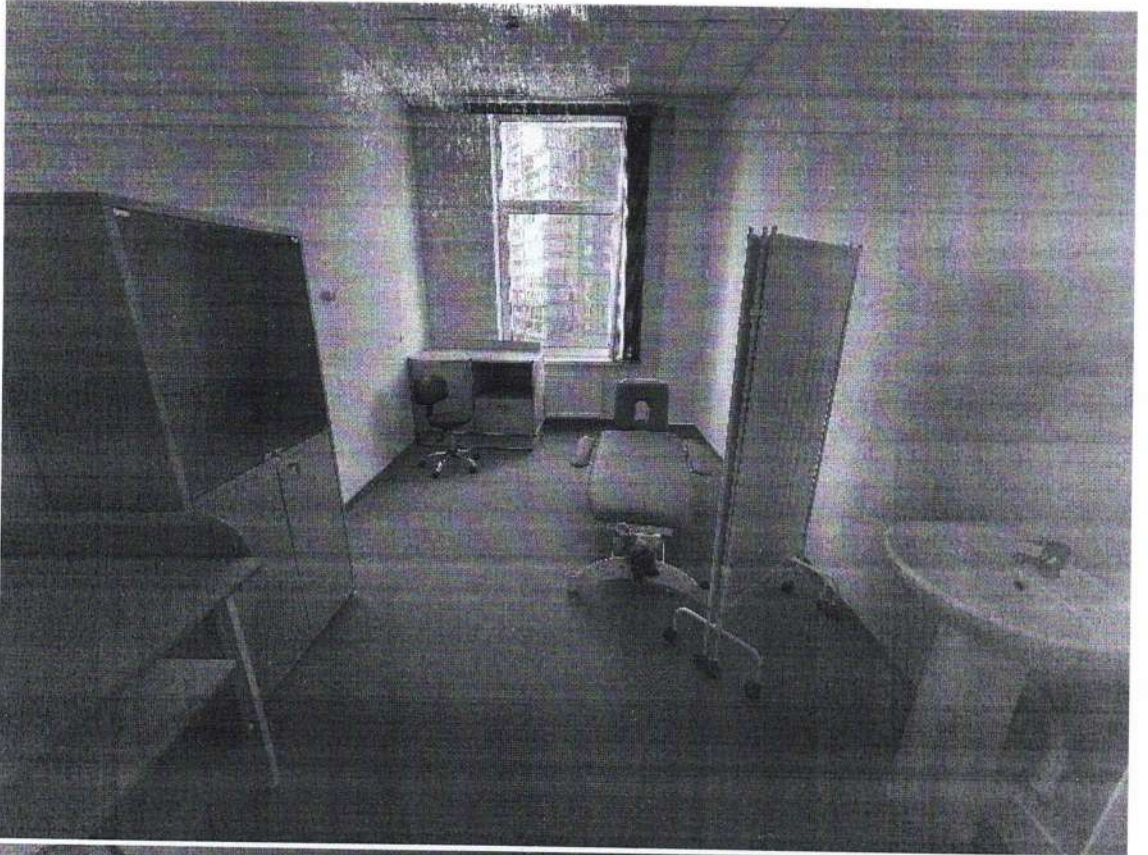


Элемент объекта соглашения № 2

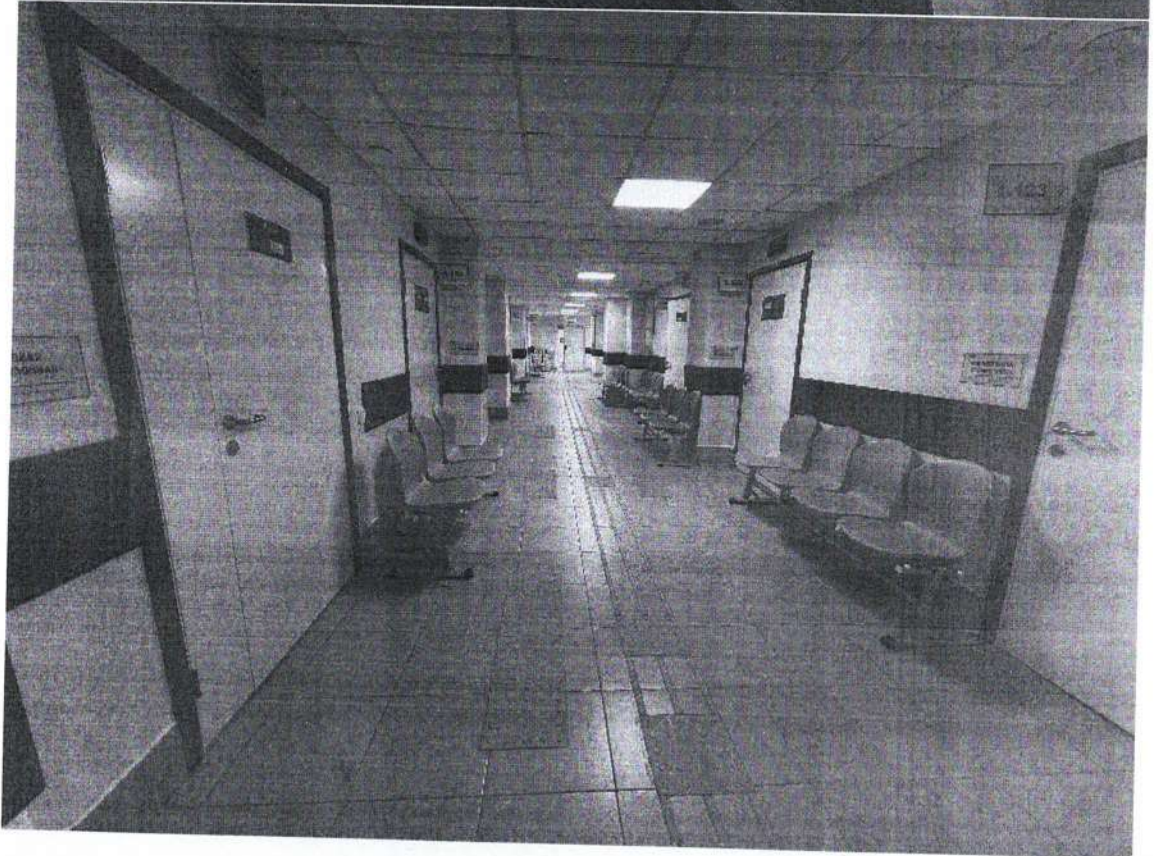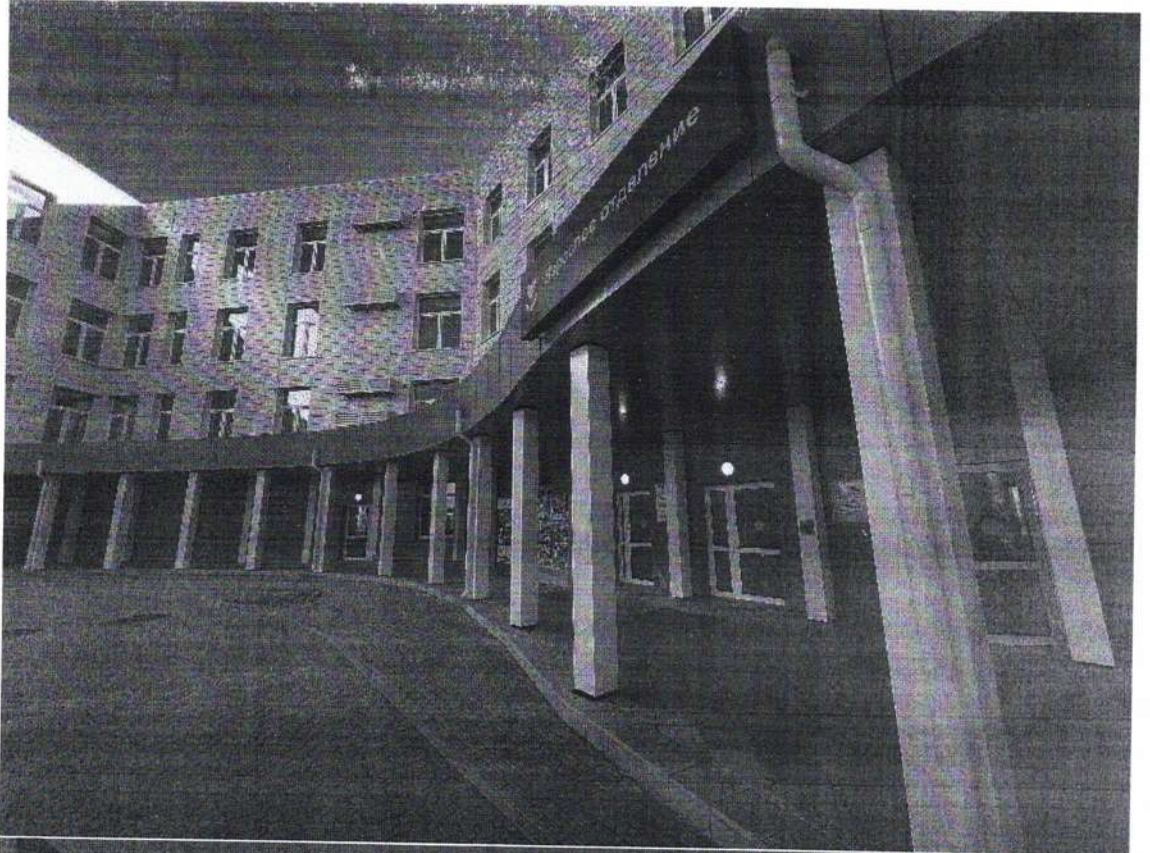


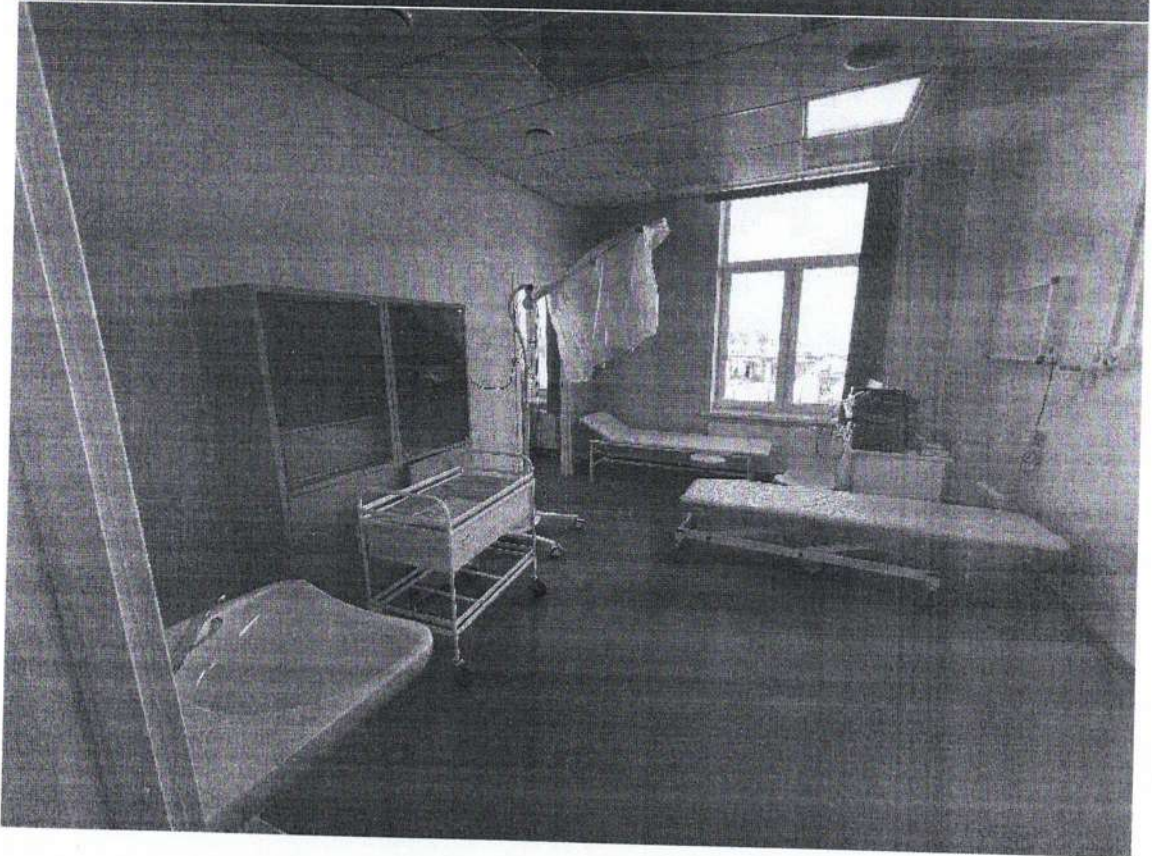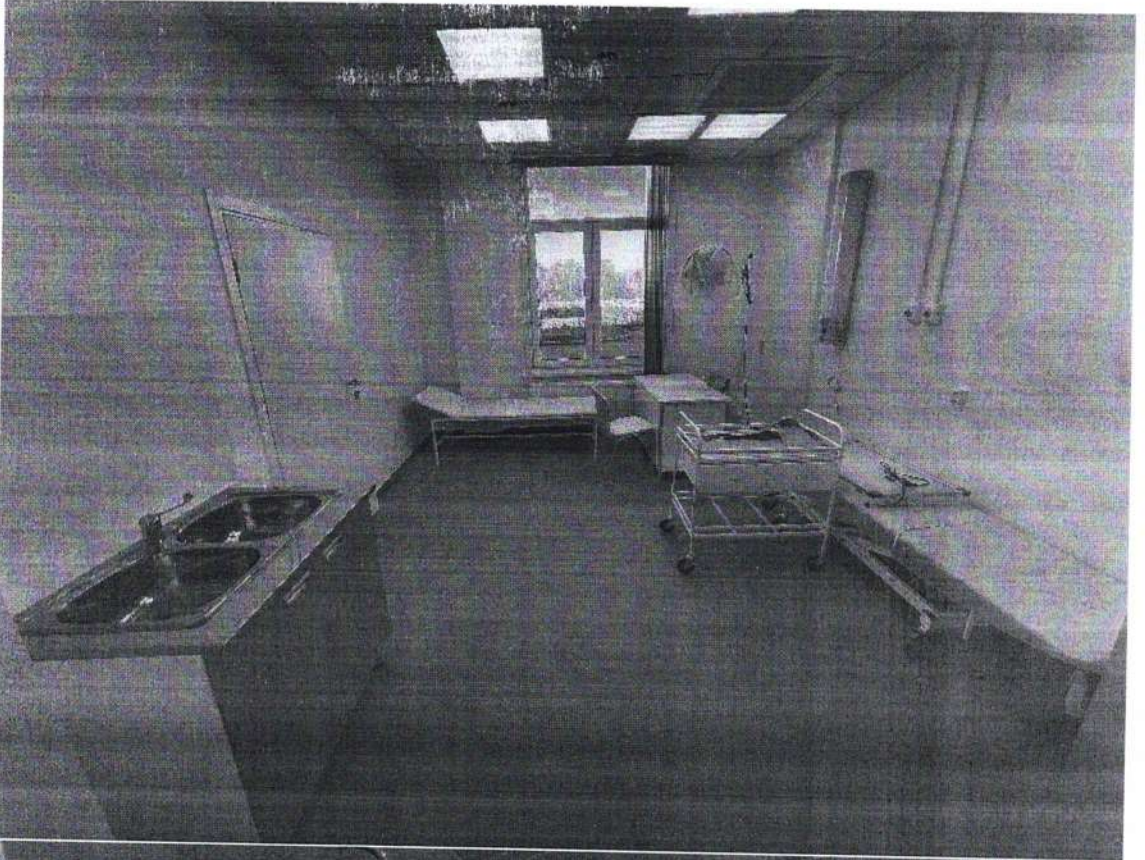


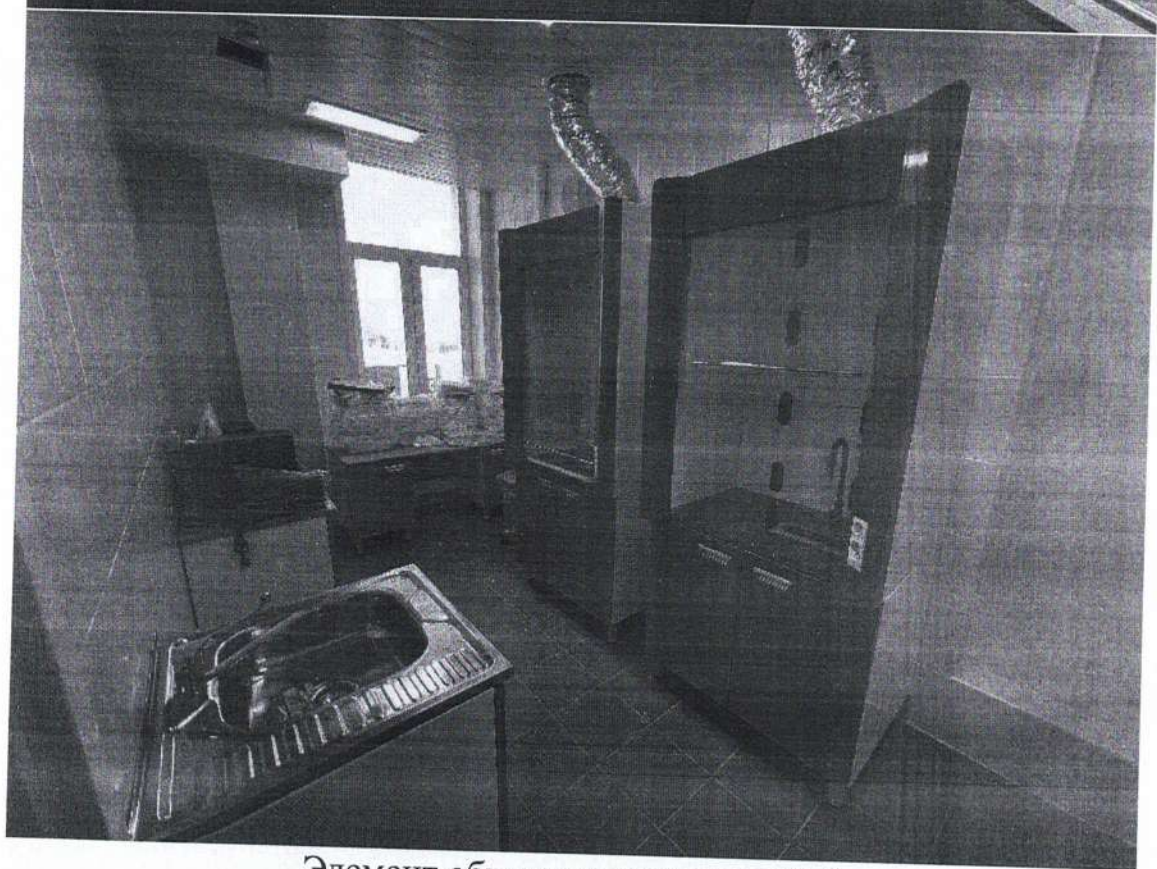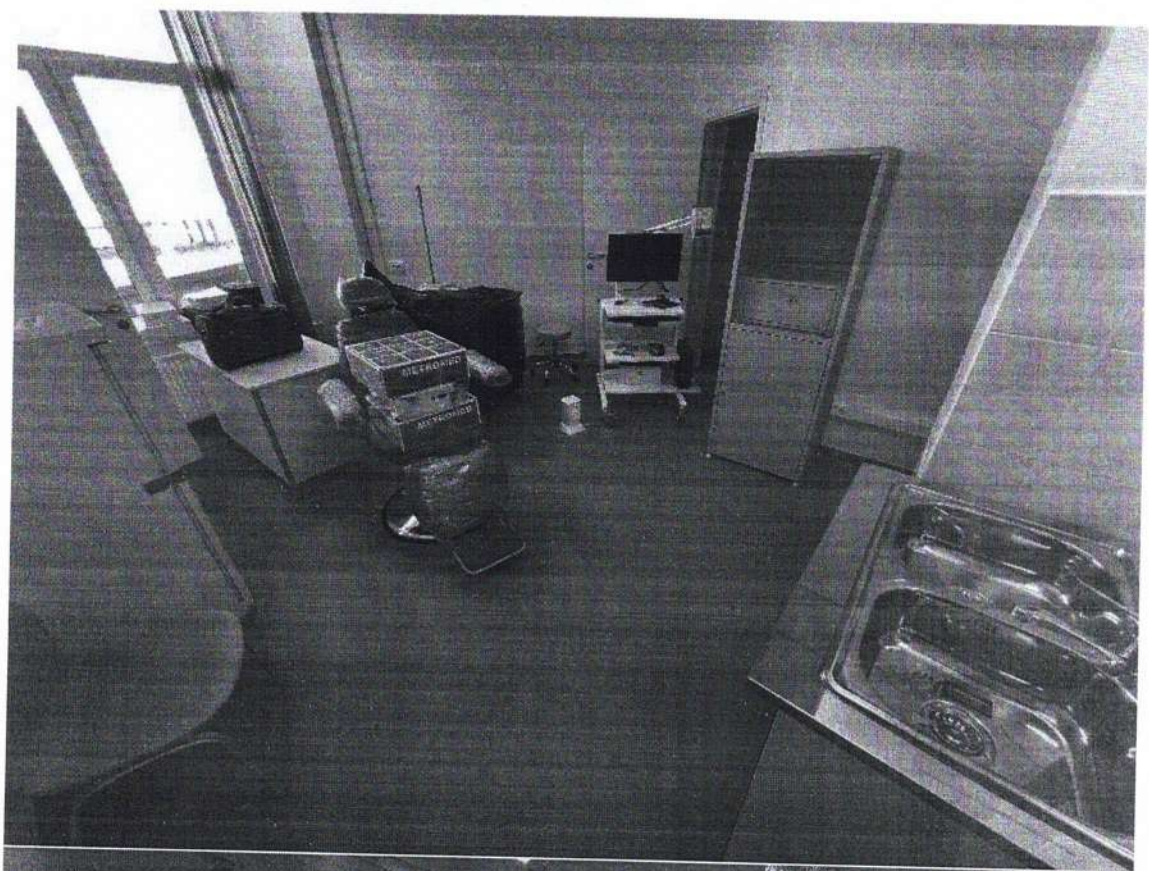



Элемент объекта соглашения № 3

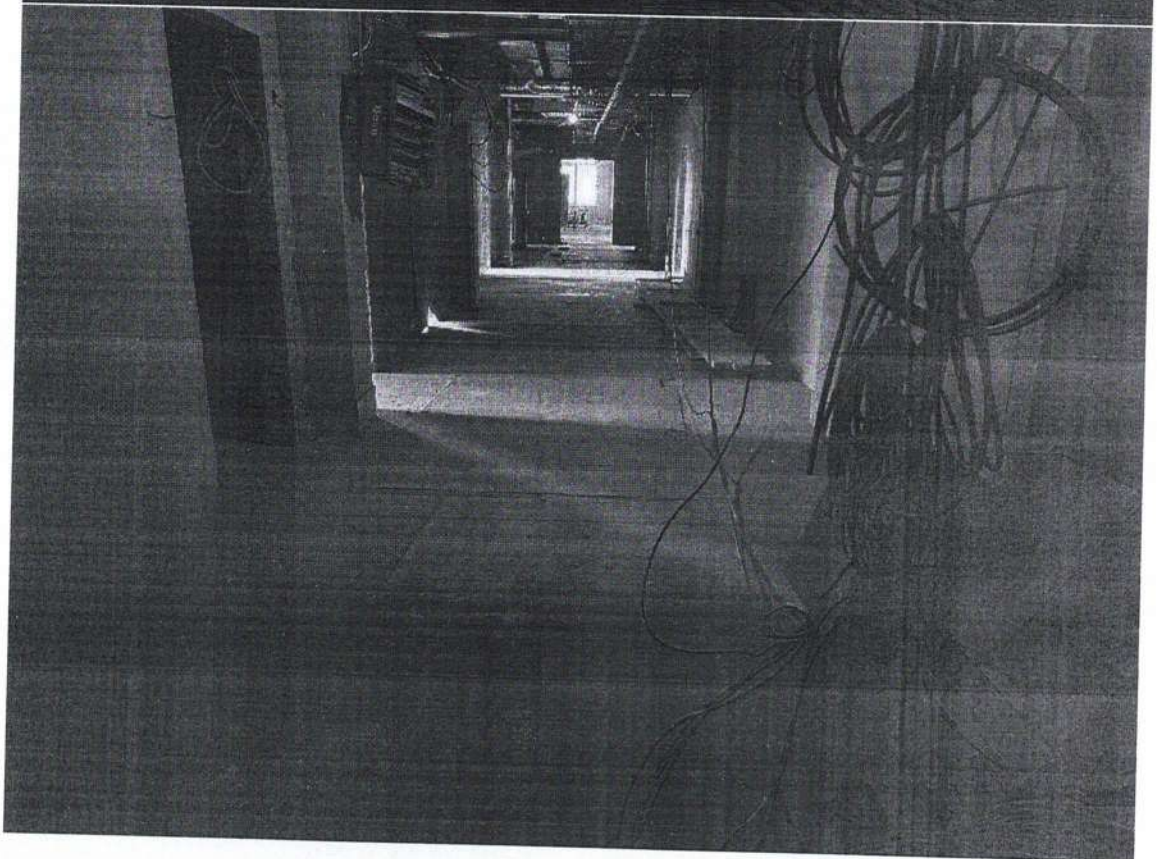



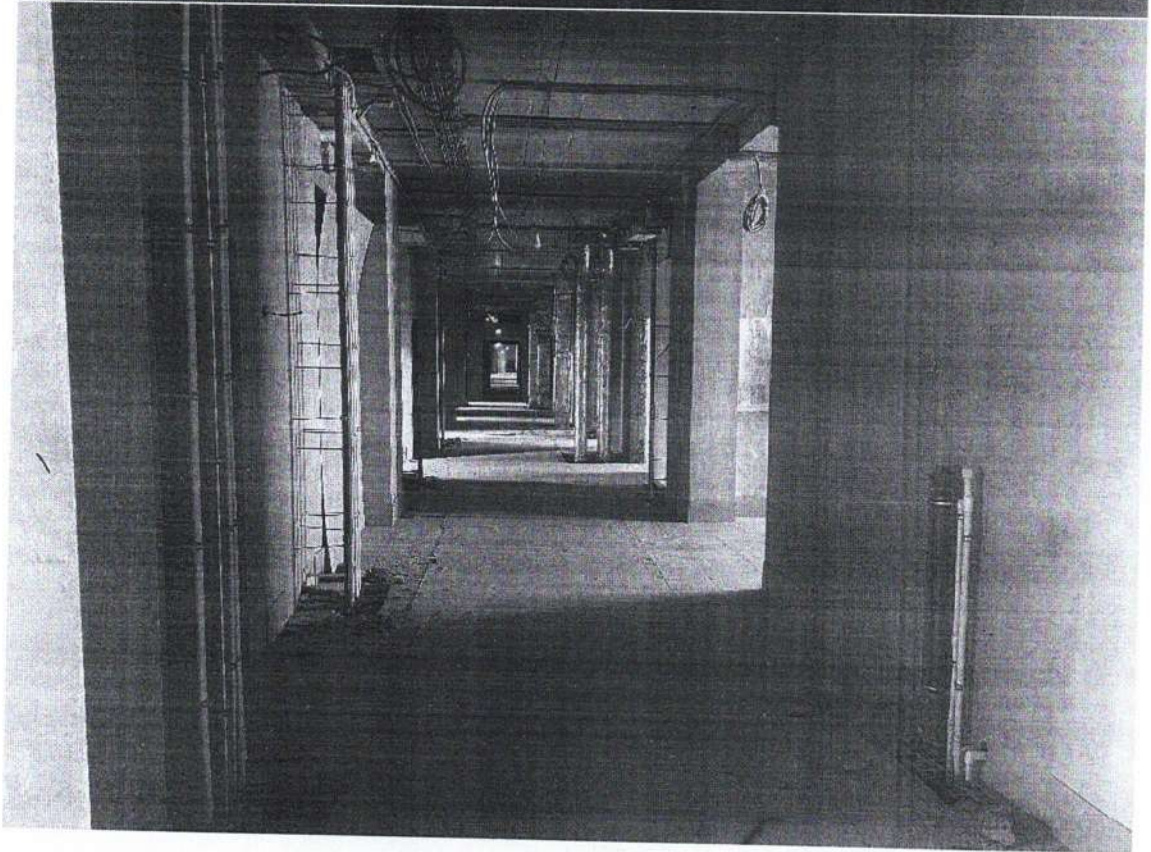


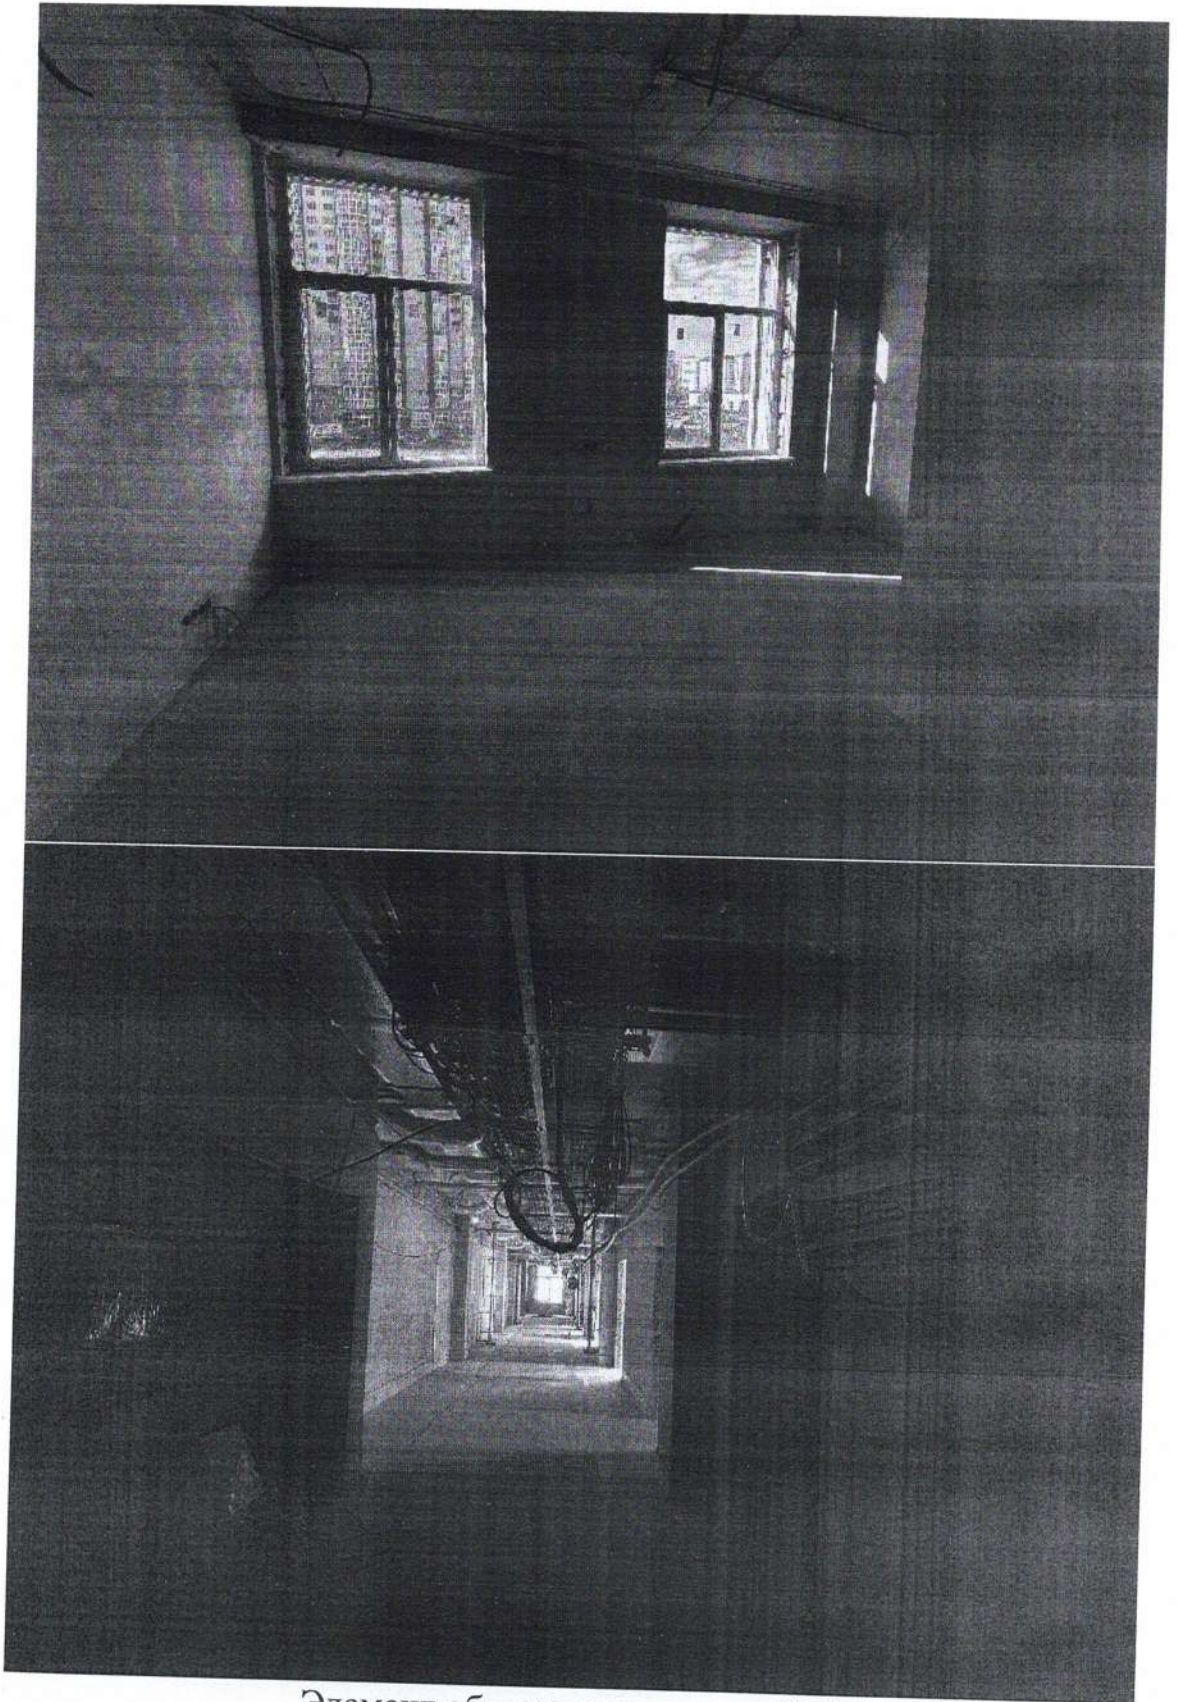


Элемент объекта соглашения № 4

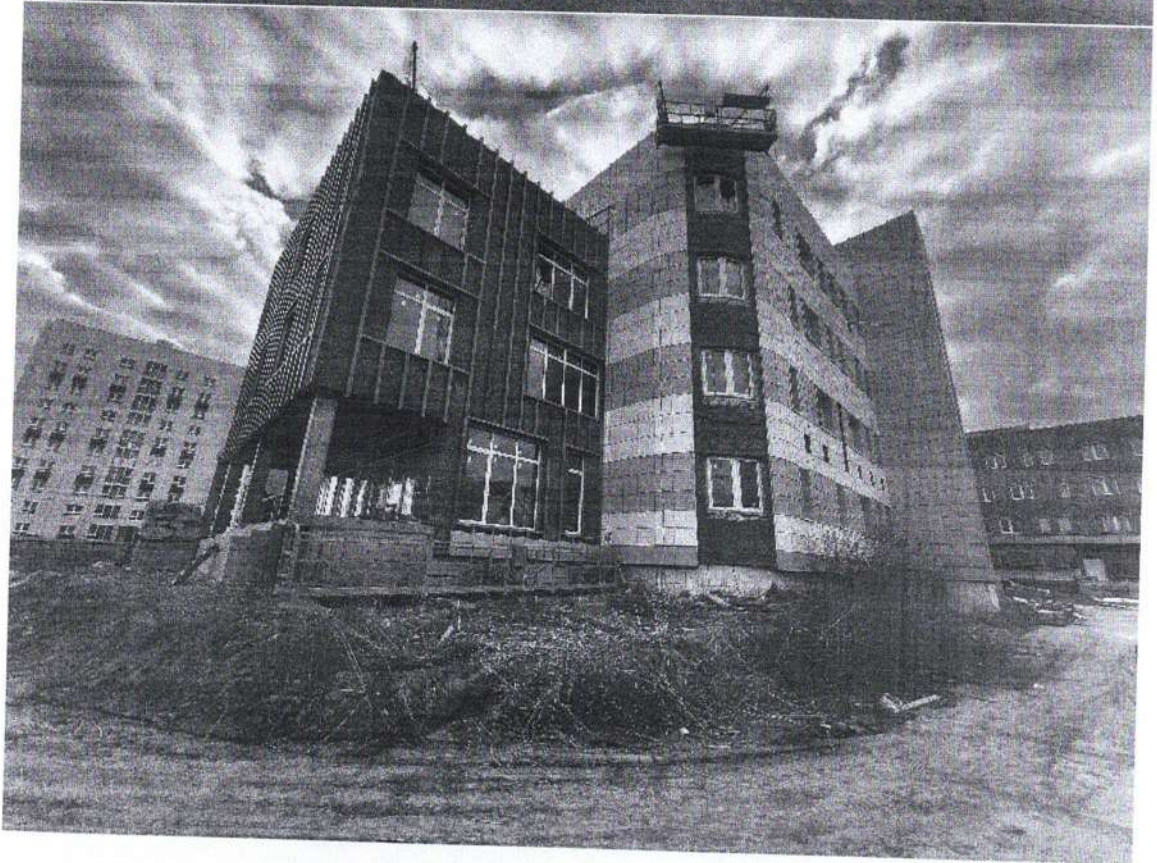
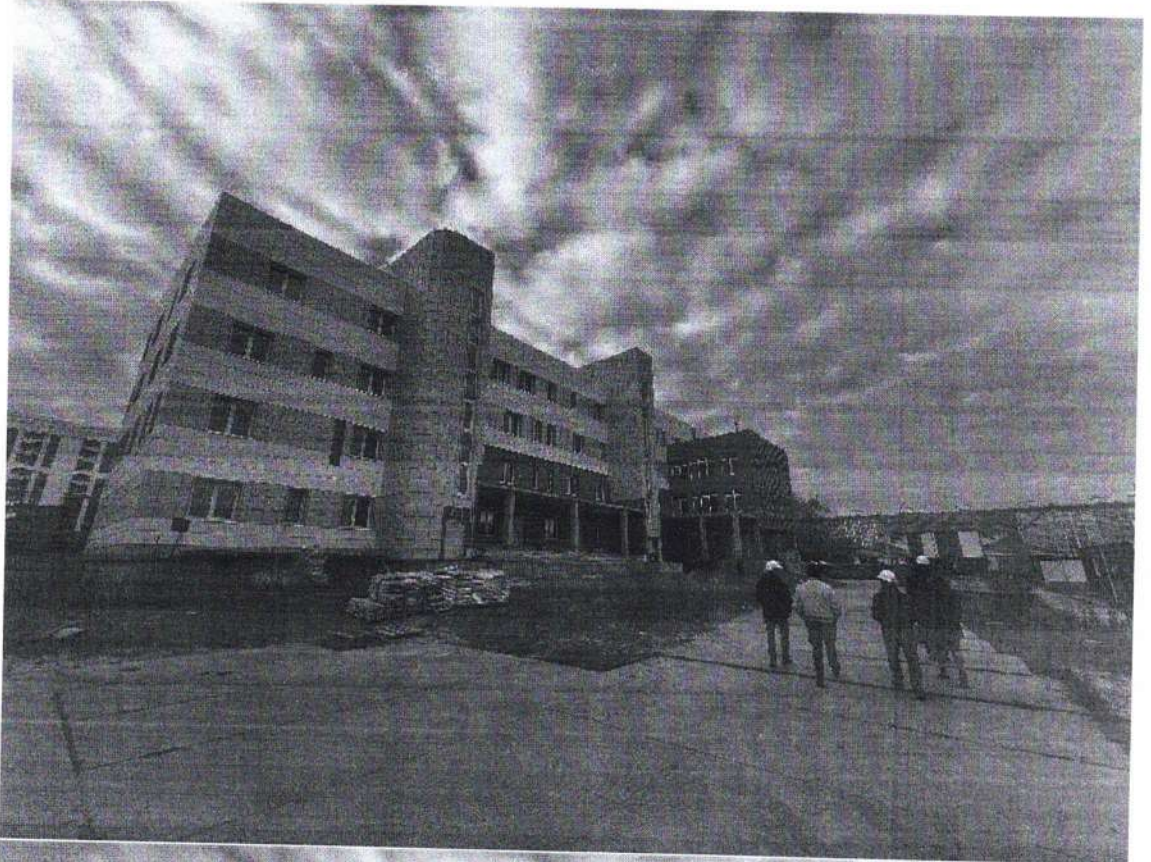



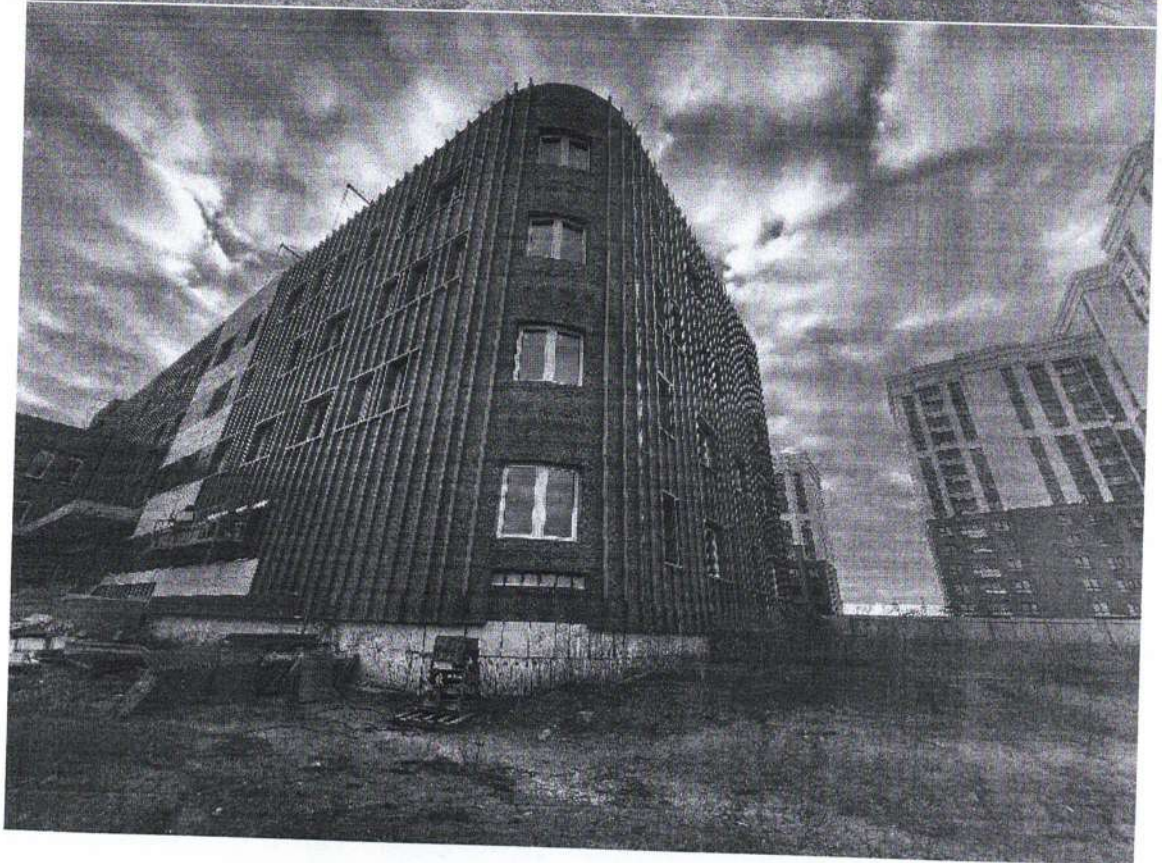


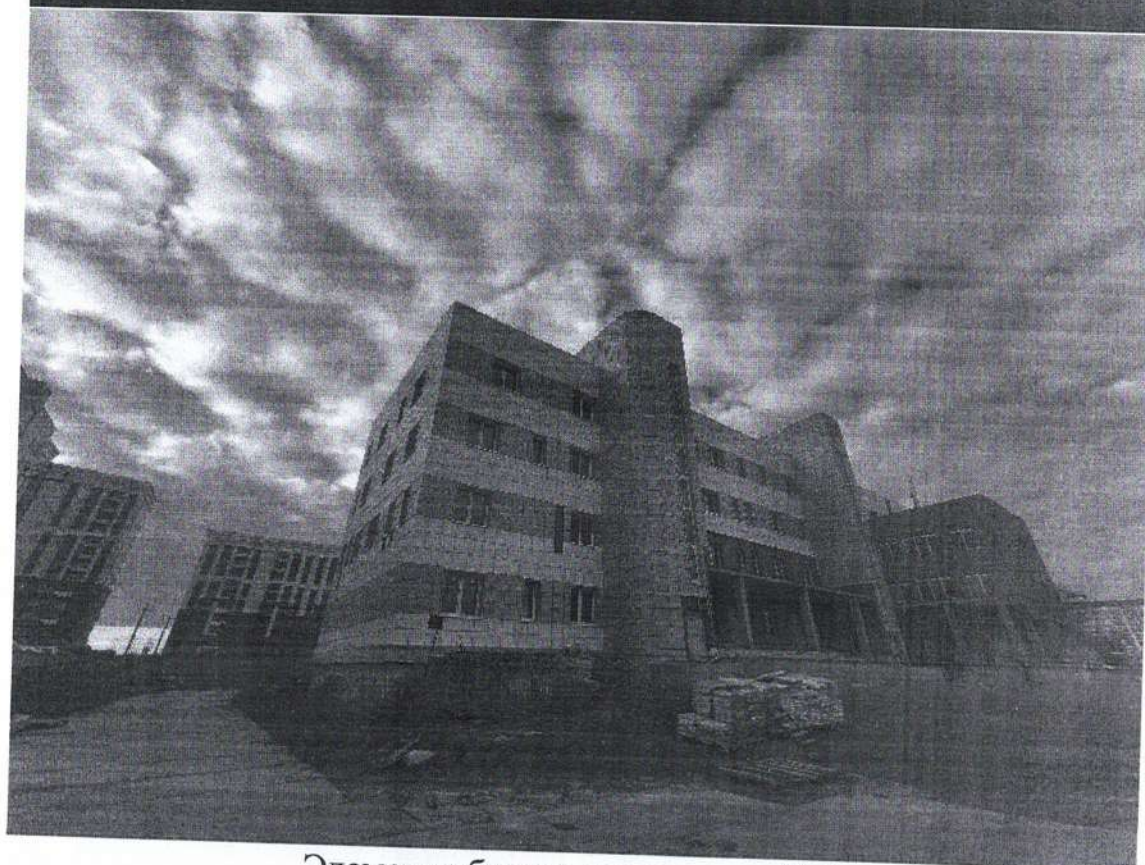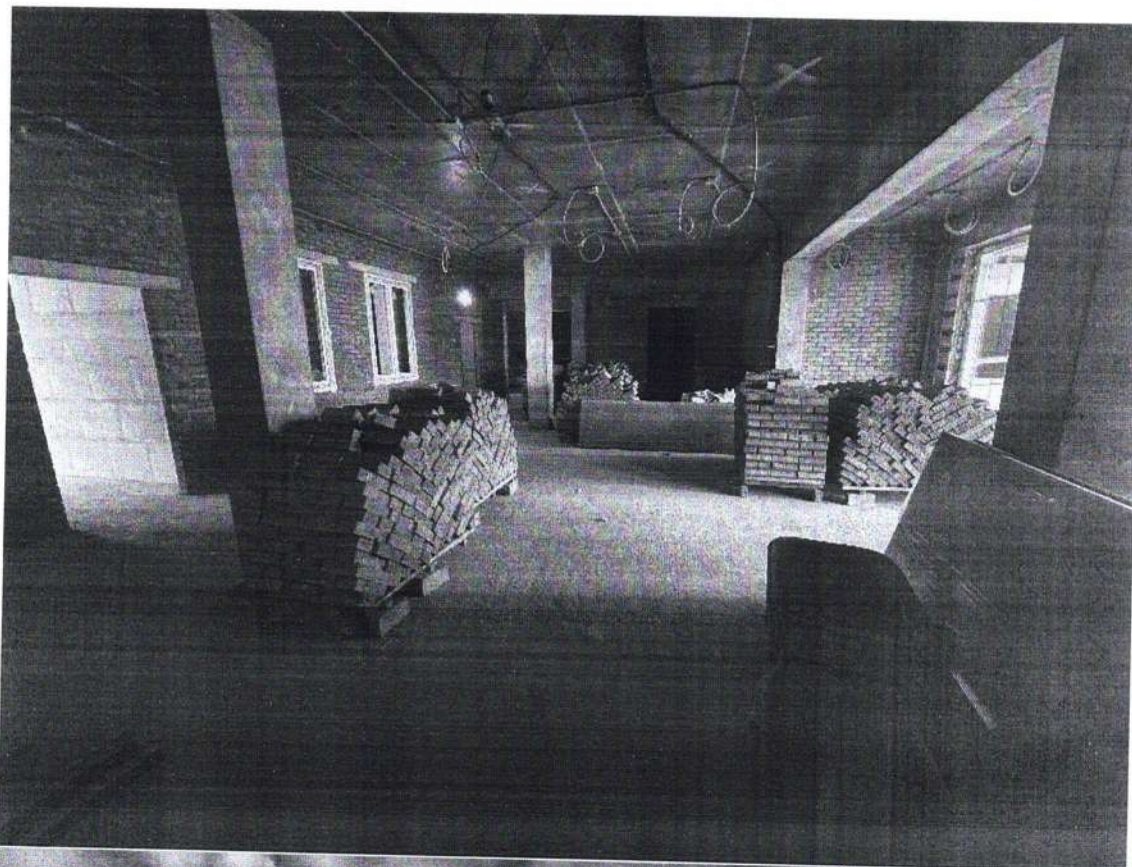


Элемент объекта соглашения № 5


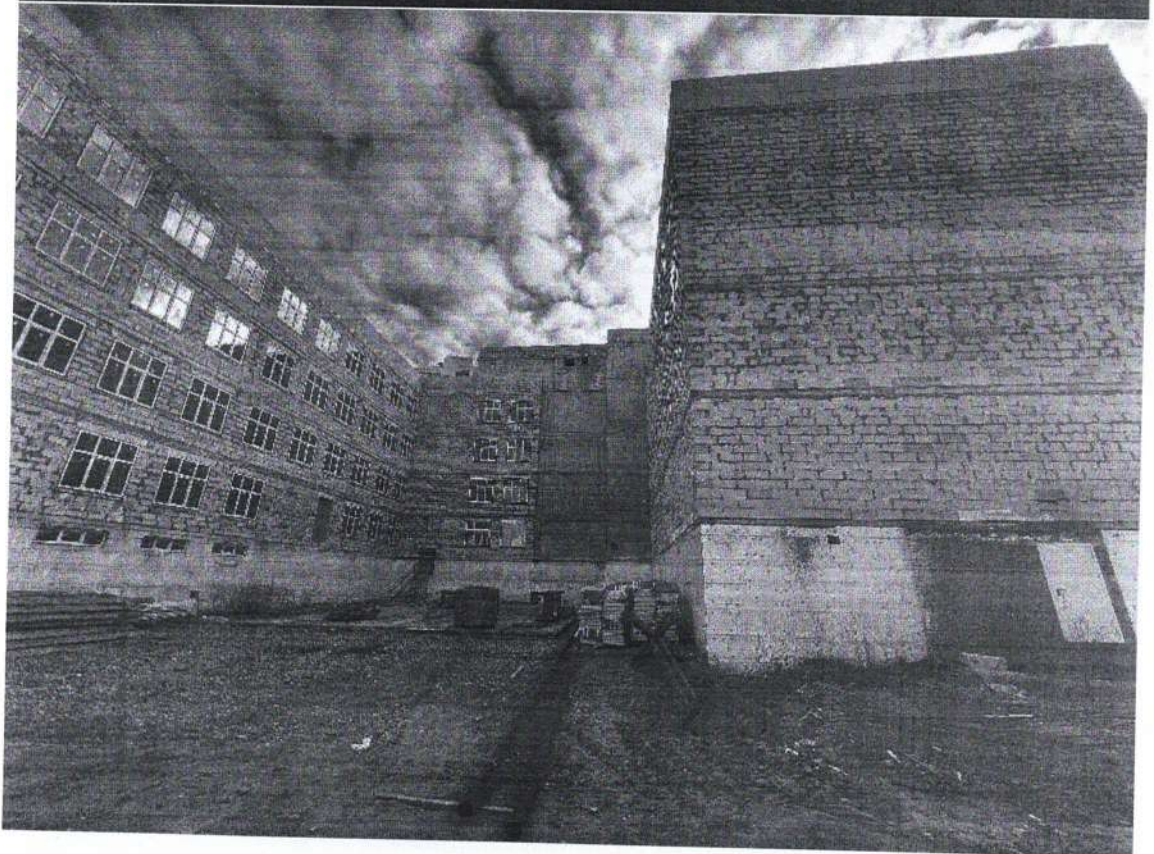


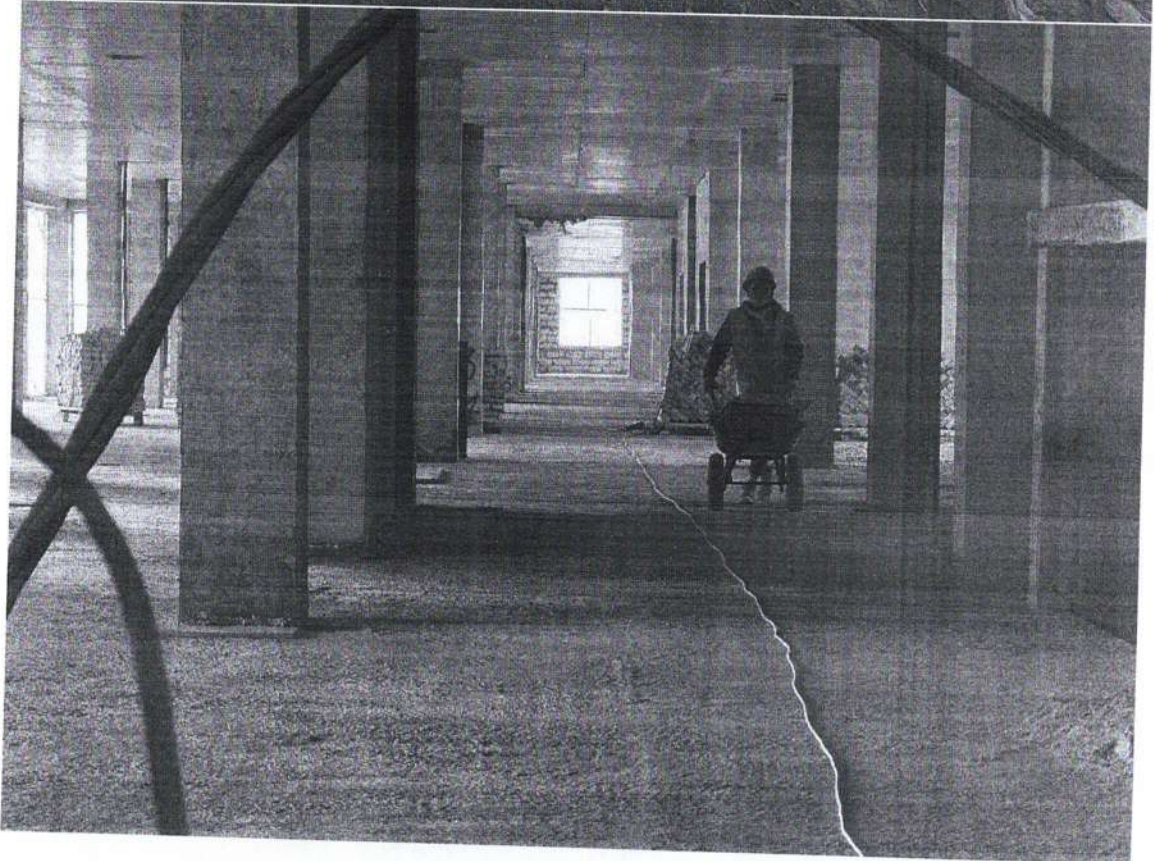
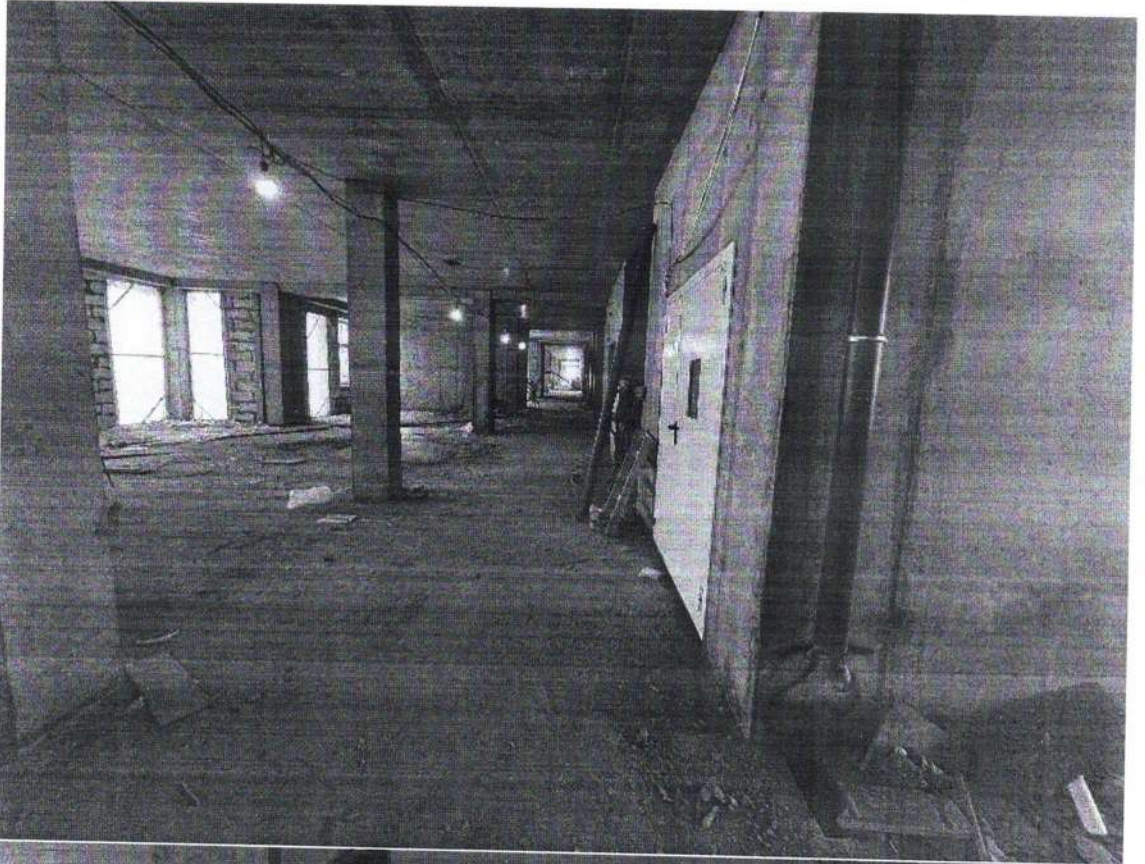


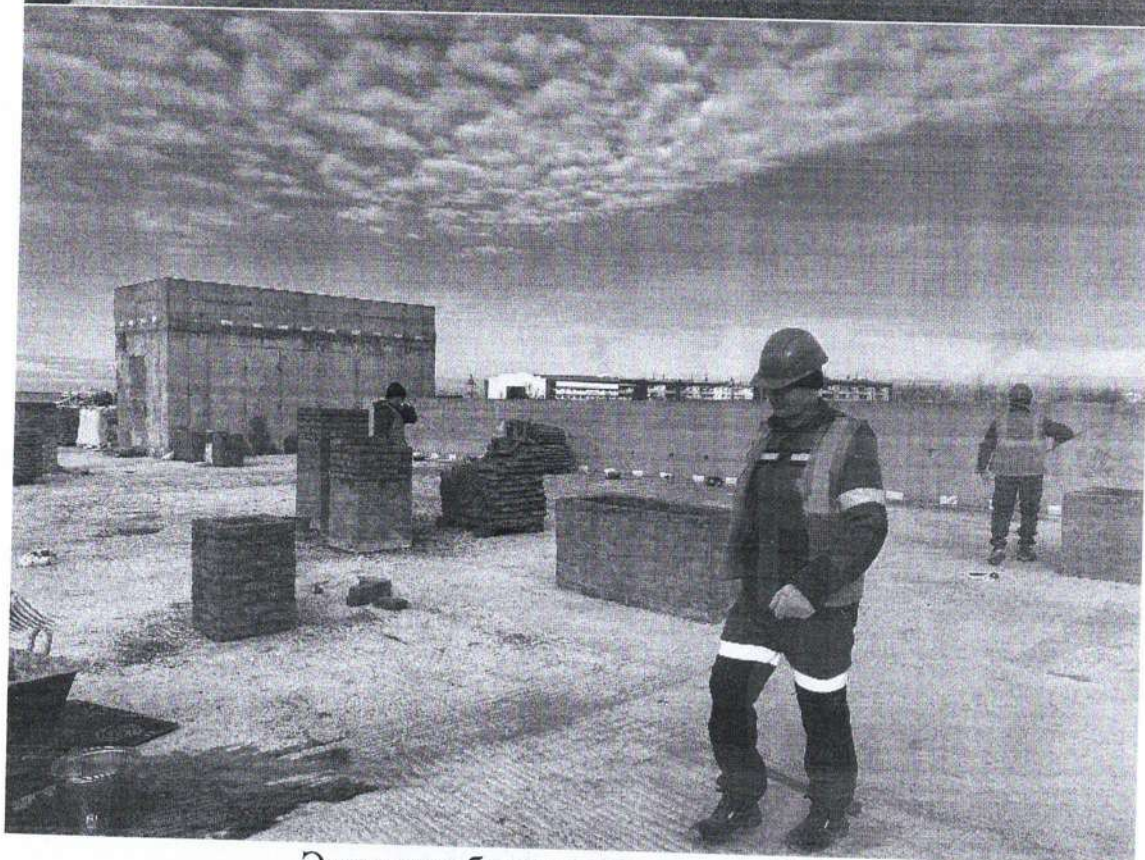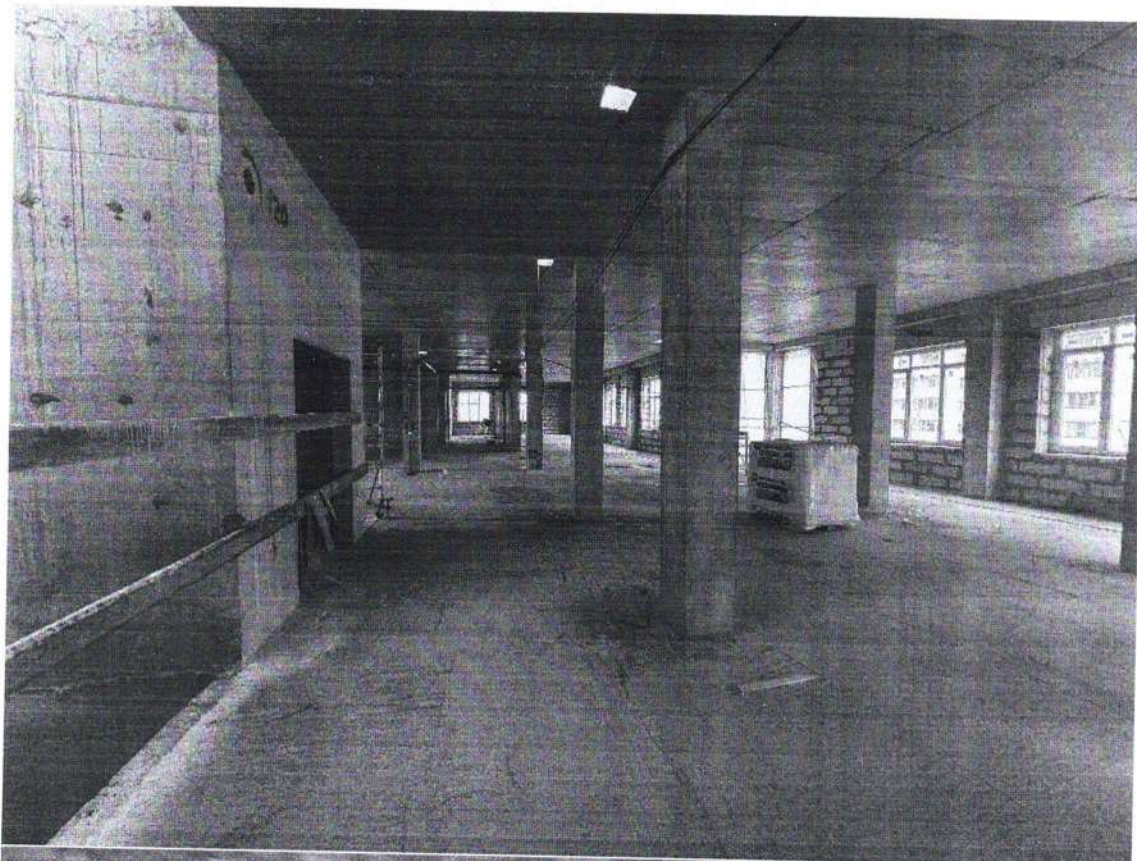

Элемент объекта соглашения № 6

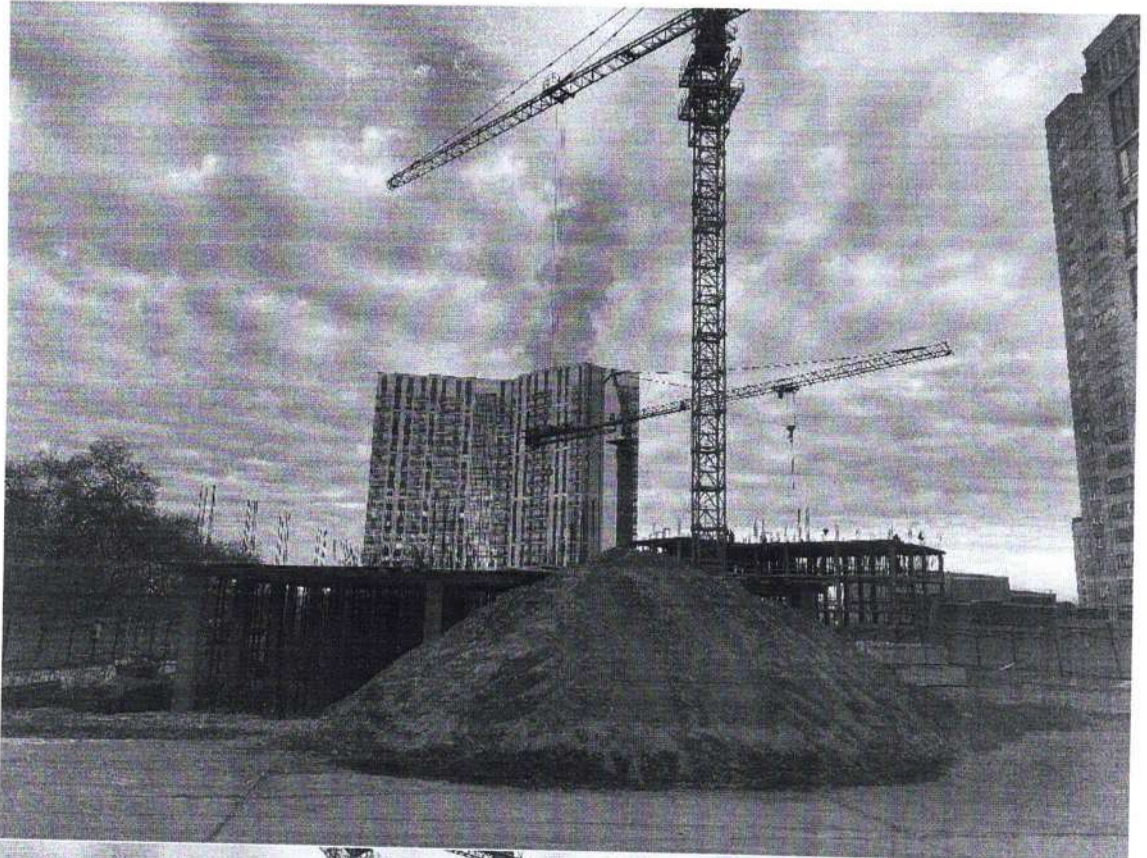

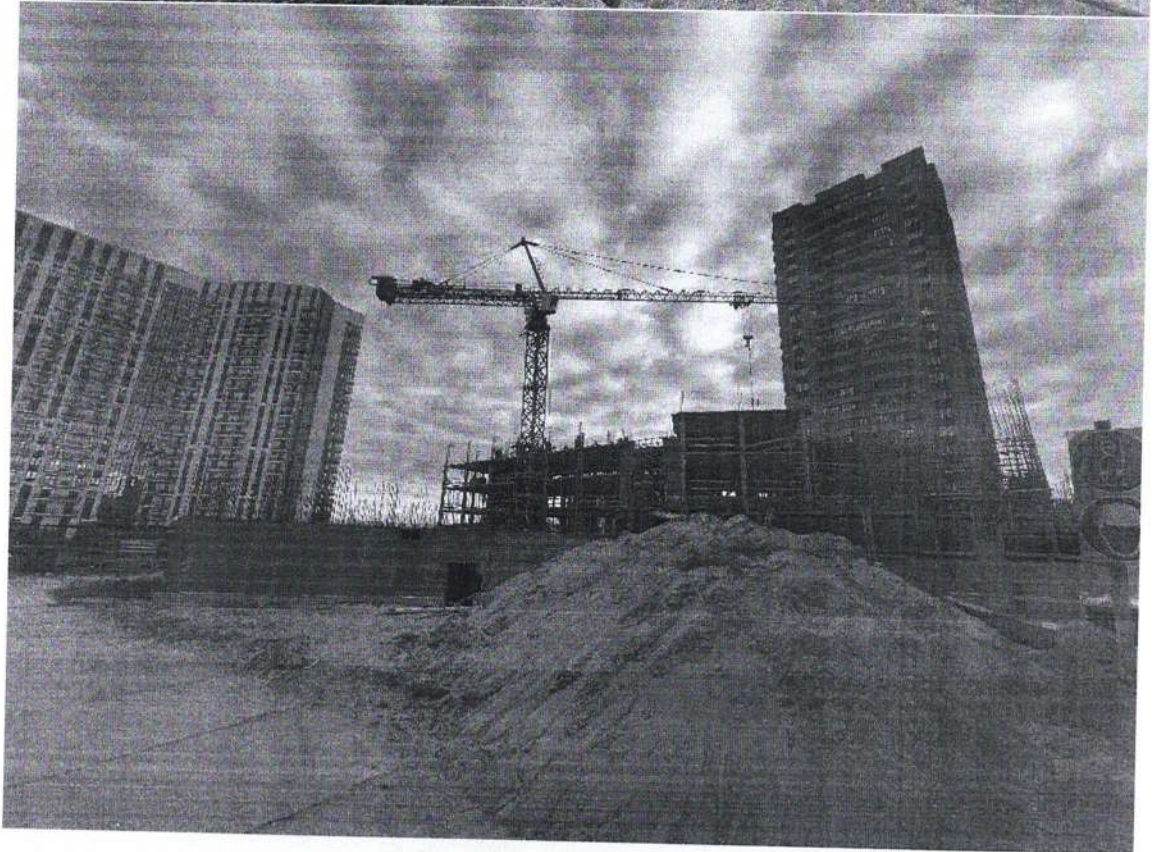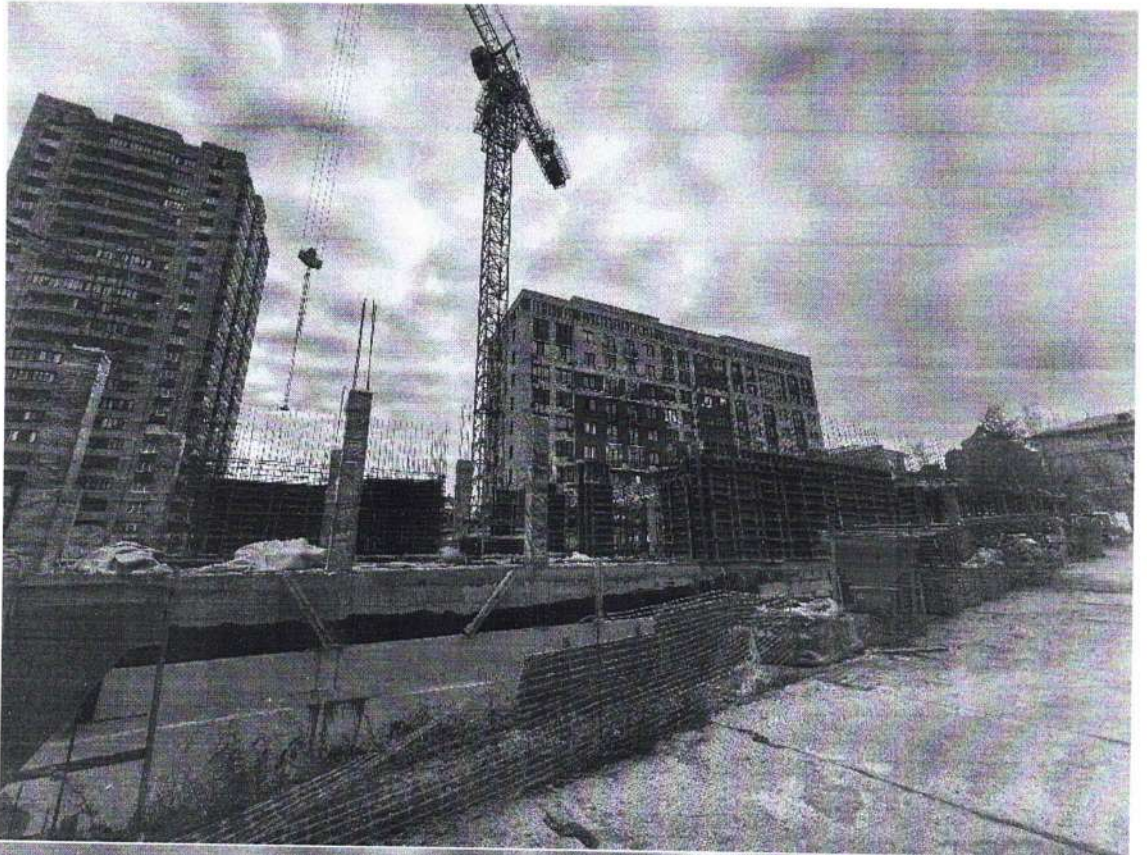

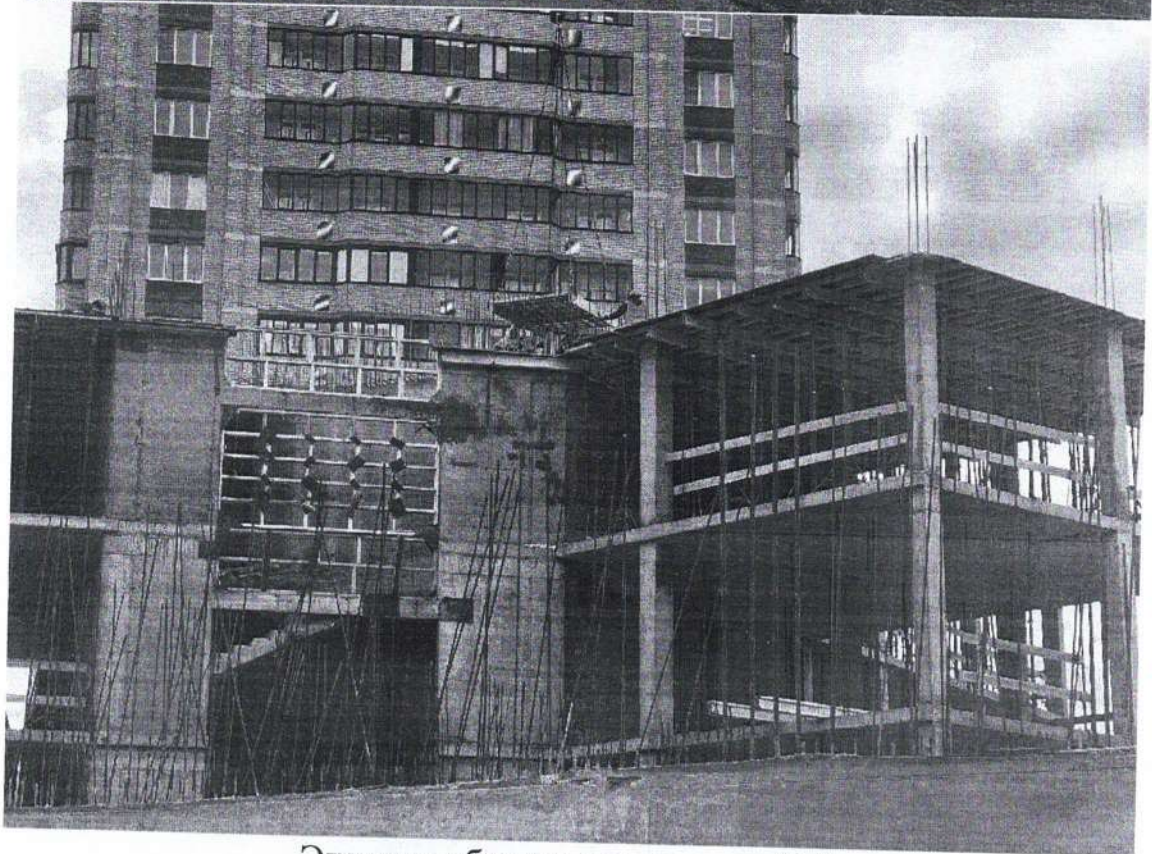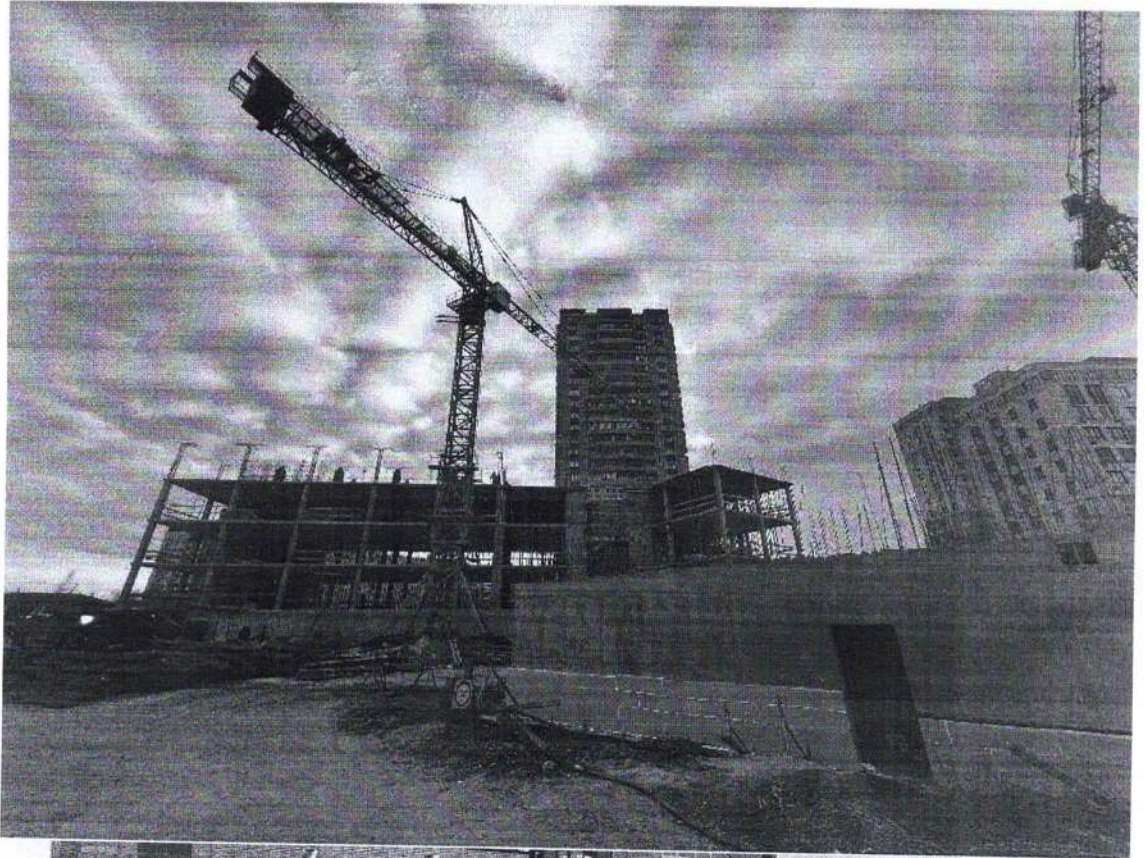

Элемент объекта соглашения № 7



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минздрав НСО)

Красный проспект, д.18,
г. Новосибирск, 630007
Тел.: (383) 238-63-68, факс: (383) 238-66-39
e-mail: Zdrav@nso.ru
<http://www.zdrav.nso.ru>

31. 10. 2024 01-09/26260/24

Генеральному директору
ООО «ВИС Социнфра» —
управляющей организации
ООО «Седьмая концессионная
компания»

А.В. Козаренко

121096, г. Москва,
ул. В. Кожинной, д. 1, к. 1

На № _____ от _____

О направлении акта
о результатах контроля

Уважаемый Александр Вячеславович!

Между Новосибирской областью в лице министерства здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» заключено соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019 (далее — соглашение), во исполнение которого сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 24 Правил осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490, направляем экземпляр акта о результатах за исполнением соглашения в 3 квартале 2024 года.

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

И.о. министра

Е.А. Аксенова

СПИСОК № 138 (Партия 94)
внутренних почтовых отправлений
от 01.11.2024
(дата)

Вид РПО: Бандероль
Разряд: Без разряда
Способ оплаты: - основной услуги марки безналичный расчет 300
- уведомления о вручении марки безналичный расчет
Способ пересылки: Наземный
Отправитель: МИНЗДРАВ НСО e-mail: Vku@nso.ru
ИНН/КПП: 5406635579 / 540601001 Договор №: 22/24-МР54

С услугой «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя РПО 9 1 3 9 0 0 3 2 3 8

«SMS-уведомление о вручении РПО» «SMS-уведомление о поступлении РПО в адресное ОПС»

Наименование и индекс места приема: ЦОЮЛ 630007

Всего отправлений: 1 Всего листов: 3 лист № 1

№ № п/п	Обозначение многоместного отправления	ШПИ (штриховой почтовый идентификатор)	Категория РПО	Фактическая масса, (кг.)	Доп. услуги:	Сумма объявленной ценности, (руб.)	Сумма наложенного платежа, (руб.)	Сумма платы за пересылку (без доп. услуг), без НДС (руб.)	Сумма платы за пересылку (без доп. услуг), с НДС, (руб.)	Сумма платы за доп. услуги, без НДС, (руб.)	Сумма платы за доп. услуги, с НДС, (руб.)	Примечание
	Адресат (Ф.И.О.)			Объемный вес, (кг.)	Тип уведомления							
	Почтовый адрес			Платный вес, (кг.)	Проверка соответствия вложения описи Ф.107							
	Номер почтомата, наименование населенного пункта, индекс ОПС, обслуживающий почтомат	Внутренний номер клиента		Линейные размеры (ДхШхВ), (см.)	Надбавка за отметку 'Осторожно'							
	Номер мобильного телефона адресата											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	- Генеральному директору ООО "ВИС Социнфра" - управляющей организации ООО "Седьмая концессионная компания" А.В. Козаренко 121096, ул Василисы Кожиной, д. 1 корп.1, г Москва	80080503615013 01-09/26860/ 24	Заказное	0.166		-	-	104.00	124.80	-	-	
Итого:						0.00	0.00	104.00	124.80	0.00	0.00	

Общее количество отправлений 1 (один)
(сумма цифрами и прописью)

Из них количество отправлений по категориям, а также сумма их платы за пересылку с учетом платы за объявленную ценность:

Заказное 1
(категория РПО) (количество РПО цифрами)

Сумма платы за пересылку с НДС 124.80 (Сто двадцать четыре рубля 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Сумма платы за пересылку без НДС 104.00 (Сто четыре рубля 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

СПИСОК № 138 (Партия 94) Дата 01.11.2024 Лист № 2

Отправитель: МИНЗДРАВ НСО

В т.ч. НДС 20.80 (Двадцать рублей 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Плата за пересылку:

Общая сумма платы за пересылку с НДС 124.80 (Сто двадцать четыре рубля 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку без НДС 104.00 (Сто четыре рубля 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 20.80 (Двадцать рублей 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма объявленной ценности всех РПО 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за объявленную ценность с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Итого за пересылку, с НДС 124.80 (Сто двадцать четыре рубля 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Итого за пересылку без НДС 104.00 (Сто четыре рубля 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 20.80 (Двадцать рублей 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Дополнительные услуги:

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя с НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя без НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги без НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список с НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список без НДС 0.00 (Ноль рублей 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 0.00 (ноль руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Всего к оплате:

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) с НДС 124.80 (Сто двадцать четыре рубля 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) без НДС 104.00 (Сто четыре рубля 00 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 20.80 (Двадцать рублей 80 копеек)
(сумма цифрами и прописью)

СПИСОК № _____ 138 (Партия 94) _____ Дата 01.11.2024 Лист № 3 _____


Отправитель: МИНЗДРАВ НСО _____

Сдал:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)




Принял:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



(оттиск КПШ ОПС
места приема)

Отрывной талон

К СПИСКУ № _____ 138 (Партия 94) _____ Дата 01.11.2024 _____

Отправитель: МИНЗДРАВ НСО _____

из _____ один _____ РПО, включенных в список, получено счетом в исправной упаковке _____
(кол-во цифрами и прописью) (кол-во цифрами и прописью)

Сдал:

(должность)

(подпись)


(Ф.И.О.)

Получил:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



(оттиск КПШ)
